COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	**QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE Q.I.D.**



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DÌ CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DÌ CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DÌ TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DÌ POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 19 / 02 / 2025 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.**
	Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19**
	CAP **80128** Località **Napoli**
	Partita IVA **06414831211**

Committente:	**SOCIT S.r.l.**
	Via Vito Di Jasi 83, Aversa 81031

Descrizione Quadro:	**Quadro Illuminazione Direzione**
Locazione del quadro:	**Amenophis S.r.l. – Uffici Casalnuovo di Napoli**
Quadro:	**QID**
Identificazione del quadro:	**030 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	250 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	15KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	22,5KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	43
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	52
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	850x2160x230 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	QDX 630L Gewiss S.p.A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Grigio RAL7035
Note	

Carateristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Gewiss S.p.A.** serie **QDX 630L** in materiale metallico spessore lamiera d'acciaio 15/10 e lamiera zincata 20/10; Montanti funzionali interni con foratura passo 25mm per il montaggio dei kit di installazione degli apparecchi;

Verniciatura delle lamiere con polvere epossidiche previa fosfatazione colore Grigio RAL7035 bucciato;

Grado di Protezione IP43

Grado di Robustezza IK09 con porta vetro

Specifiche Tecniche

I quadri elettrici di distribuzione componibili della serie QDX 630 L con grado protezione fino a IP43 sono disponibili sia nella versione da parete che da pavimento, per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Entrambe le soluzioni utilizzano lo stesso sistema di accessori e hanno la stessa modalità di montaggio, pensato per essere semplice e rapido. Il cablaggio può essere effettuato con la struttura completamente aperta, permettendo un lavoro più agevole, per poi completare il montaggio del quadro in un secondo momento.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA
CEI 17-113/1/2
(EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
GW93347	INT.MAGNET.ALTE PREST.4P C80 16KA 6M	1	GEWISS
GW93348	INT.MAGNET.ALTE PREST.4P C100 16KA 6M	1	GEWISS
GW94006	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M	14	GEWISS
GW94007	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M	35	GEWISS
GW94018	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C20 4,5KA AC/0,3 2M	2	GEWISS
GW96001	CONTATTO AUSILIARIO APERTO/CHIUSO	2	GEWISS
GW96012	SGANCIATORE LANCIO CORRENTE 110/415V	2	GEWISS
GW96135	INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 40A	1	GEWISS
GW96331	RELE DIFFERENZIALE DI TERRA	2	GEWISS
GW96332	TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM	2	GEWISS
GWD9328	MSXE 250 4P 250A	1	GEWISS
GW44698	MORSETTIERA TETRAPOLARE 8 MOD.EN 50022	1	GEWISS
GW45545	RIPARTITORE 4P 250A	1	GEWISS
GW45565	BARRA DI TERRA 20X5 H 160	1	GEWISS
GW47692	CVX630/1600 - GUIDA EN50035 (G32) L=2MT	1	GEWISS
GWD3175	CSX 630H PAVIN 600+300X2000	1	GEWISS
GWD3302	QDX PANNELLO FIN DIN 24M	8	GEWISS
GWD3311	QDX STAFFE DIN	8	GEWISS
GWD3318	QDX MASCHERINA COPRI MOD	1	GEWISS
GWD3323	QDX PANNELLO PIENO 600X200	1	GEWISS
GWD3375	SEGREGAZIONE ORIZ 600X250	1	GEWISS
GWD3443	GOLFARI	1	GEWISS
GWD3471	STAFFE MORSETTIERA	1	GEWISS
GWD3504	KIT MSXE 160 FISSO	1	GEWISS
GWD3663	QDX 630H PAVIM BASE	1	GEWISS
GWD3680	QDX 630H PAV PANN LAT 2000X250	1	GEWISS
GWD3689	QDX 630H PAV POST 600+300X2000	1	GEWISS
GWD3698	QDX 630H PAVIM PORTA VETRO 600X2000	1	GEWISS
GWD3814	PRT VANO CAVO 600+300X2000	1	GEWISS
GWD3821	UENSILE AGGANCIO GUIDA DIN	1	GEWISS
GW96220	PORTAFUS.SEZ. COMPATTO 1P+N 10,3X38 690V	2	GEWISS

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.r.l. — PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI — WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**30**
Date of document: *Data del documento:*	**19/02/2026**

Customer/*Cliente*:	**SOCIT S.r.l.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**QDX 630L / Gewiss S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**19/02/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**015 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**030/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**Q.I. Direzione**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	1890	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	250	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	15	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	22,5	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	030/25D
Single line dwg. *Schema unifilare*	030/26 QID
Schematic dwg. *Schema funzionale*	030/26 QID
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	030/26 QID

ROUTINE TESTS *PROVE INDIVIDUALI*	**STANDARD** *NORME*	**TEST RESULTS** *ESITO*	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** *STRUMENTI DI MISURA*
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit */Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit */Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit */Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function**
Prove di funzionamento elettrico — CEI EN 61439-2 par. 11.10 — Satisfactory *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove — COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE: — Resp. Tecnico Sig. non presente

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Technical Manager — COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

QUADRO ELETTRICO

DATI DI TARGA DEL QUADRO

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	250A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	36
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2 / EN60898
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	43
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	850x2160x230mm
MATRICOLA	030/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	


COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data 29/01/26
Disegn. A.Z.
Proget.
Visto

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :


Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE DATI DI TARGA

Matricola 030/26
Cliente AMENOPHIS S.R.L.
Nome File : QID.DWG
Percorso File : QID.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

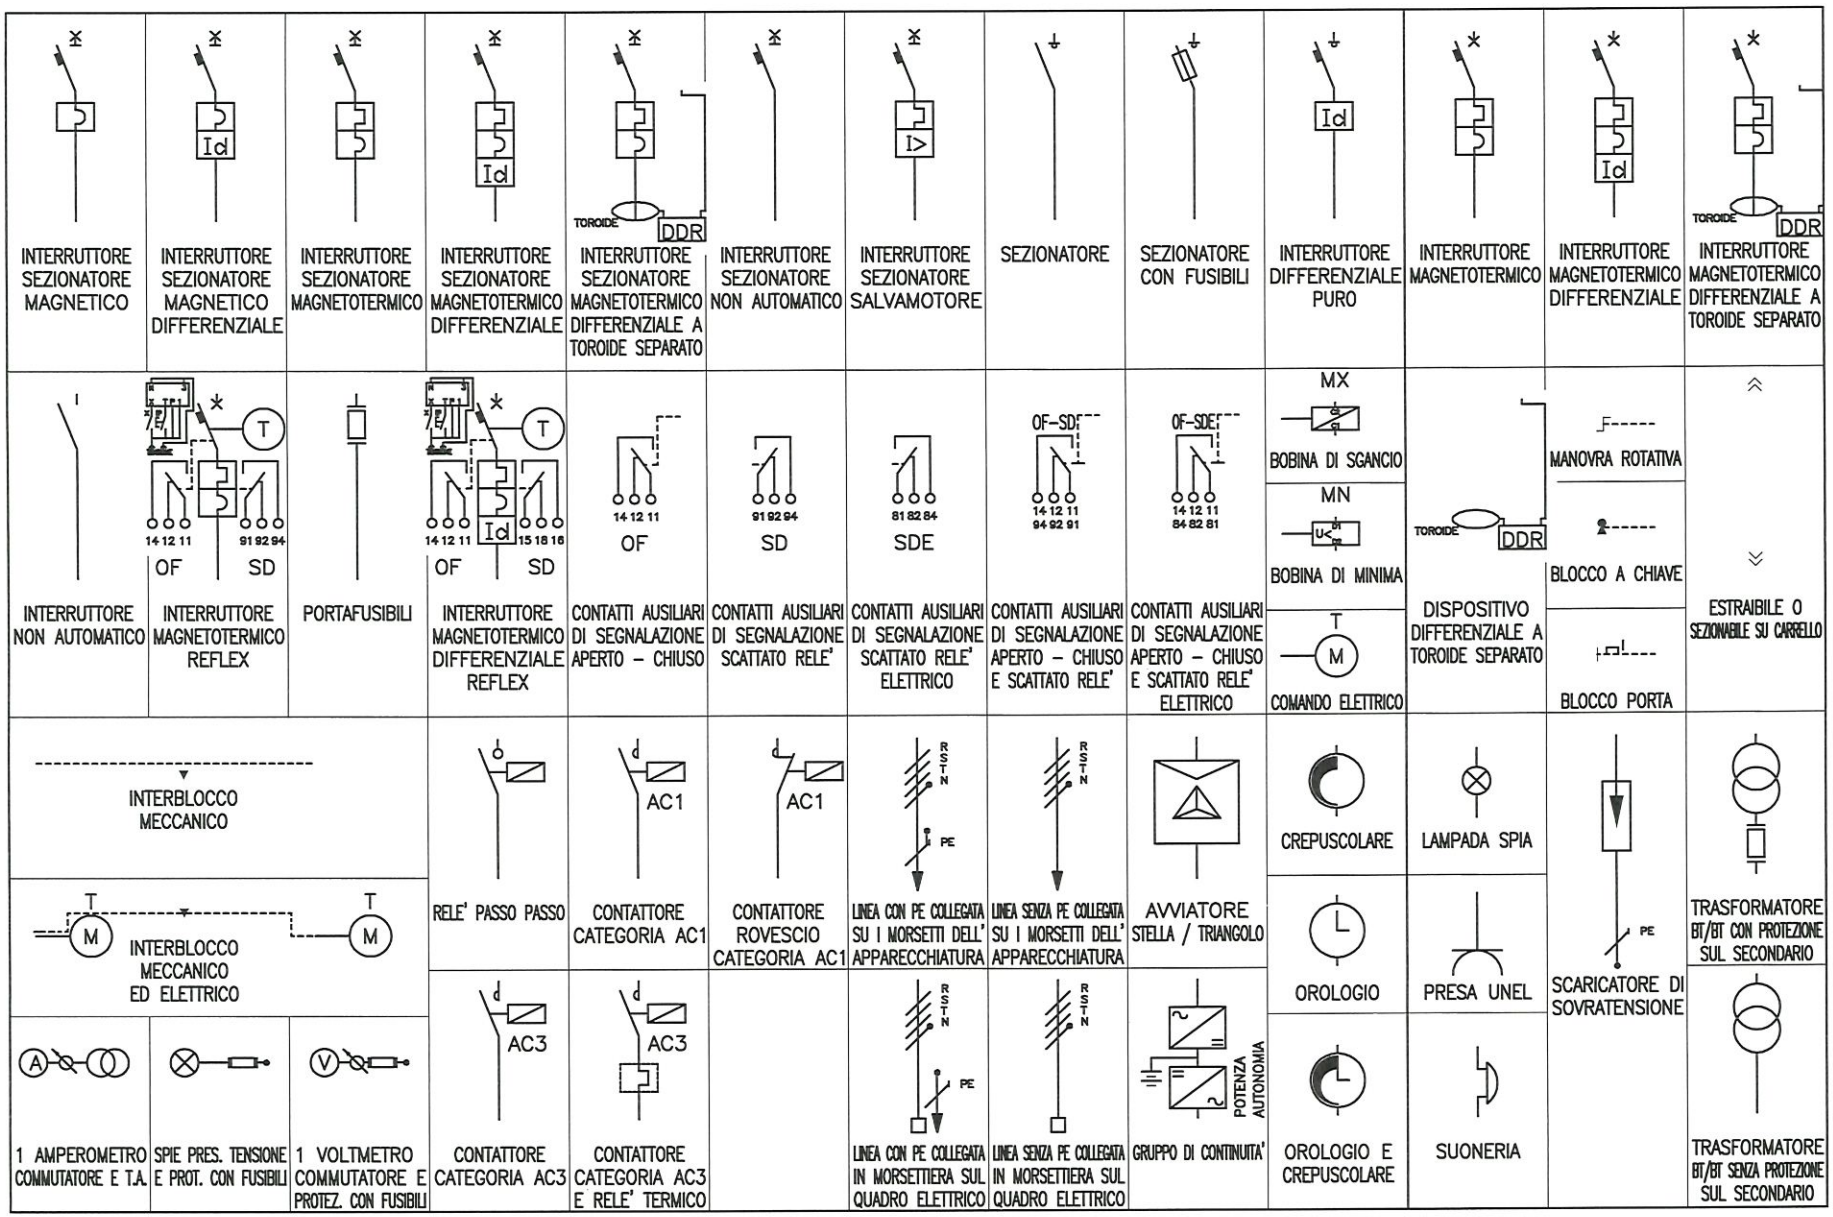

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :	
Descrizione:	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
	LEGENDA QUADRO
Matricola	030/26
Cliente	AMENOPHIS S.R.L.
Nome File :	QID.DWG
Percorso File :	QID.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

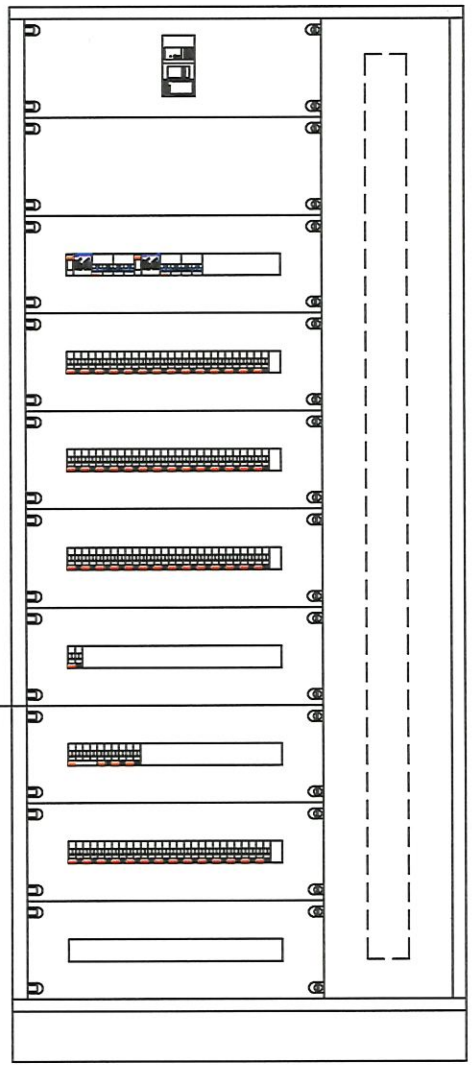

SEGREGAZIONE

ARRIVO
DALL'ALTO

STRUTTURA QUADRO	GEWSISS
MODELLO	QDX 630L
GRADO IP	43
DIMENSIONE (BxHxP)	850x2160x230mm

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data 29/01/26
Disegn. A.Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :

Descrizione:
QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
FRONTE
QUADRO

Matricola 030/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.

Nome File : QID.DWG


Percorso File : QID.DWG

Nr. Foglio 1

Nr. Fogli 1

Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		Q1	F–RD1	Q2	F–RD2	Q3	Q4	Q5	Q6
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

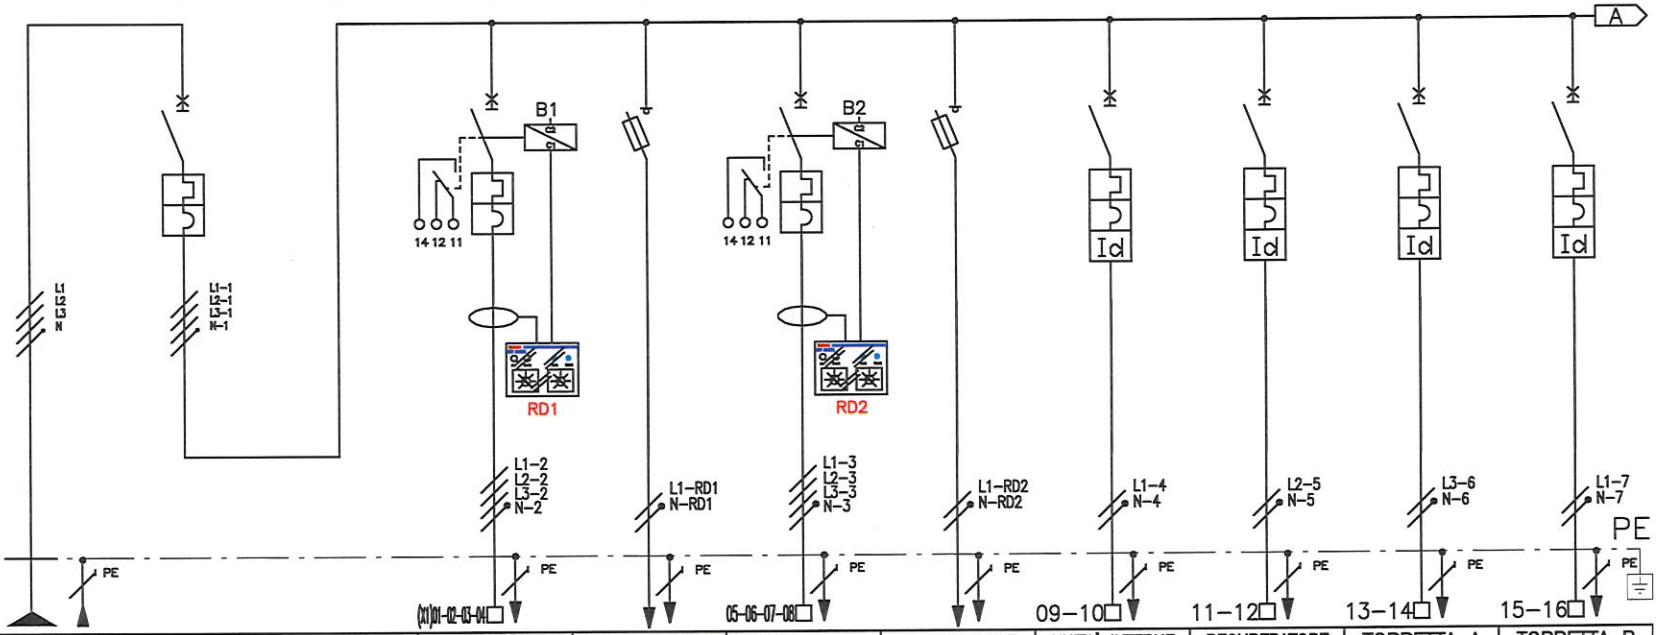

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE QID
IP 43 GEWISS AS	
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc= 15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE NORMALE	INTERRUTTORE GENERALE		VERSO SOTTOQUADRO LATO CED	PROTEZIONE RELE' DIFFERENZIALE RD1	MACCHINA ESTERNA CDZ LATO DIREZIONE	PROTEZIONE RELE' DIFFERENZIALE RD2	UNITA' INTERNE CDZ LATO DIREZIONE	RECUPERATORE DI CALORE LATO DIREZIONE	TORRETTA A UFFICIO 1	TORRETTA B UFFICIO 1
INTERRUTTORE	TIPO		GWD9328		GW93347	GW96220	GW93347	GW96220	GW94007	GW94018	GW94007	GW94007
	P.D.I. (kA)		36		16		16		4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)		4x250		4x100		4x80		1x16+N	1x20+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.		LSI		C		C		C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)		0,7–1Irth		100		80		16	20	16	16
	SOGLIA Irm (A)		7–10Irth		10Irth		10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)								0,03	0,3	0,03	0,03
	RITARDO (ms)								ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE								AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)					1x32+N		1x32+N				
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400			400	230	400	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI					BOBINA A LANCIO CONTATTO AUSILIARE DI STATO		BOBINA A LANCIO CONTATTO AUSILIARE DI STATO					
NOTE AUX												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Palatella n. 19 – 081.5511774 – www.comecsrl.it – email@comecsrl.it

CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*


IMPIANTO : *ELETTRICO – UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 1 DI 5 | Ed. 0

Disegnatore : A.Z. | File: QID.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
NOME PROGETTO: UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

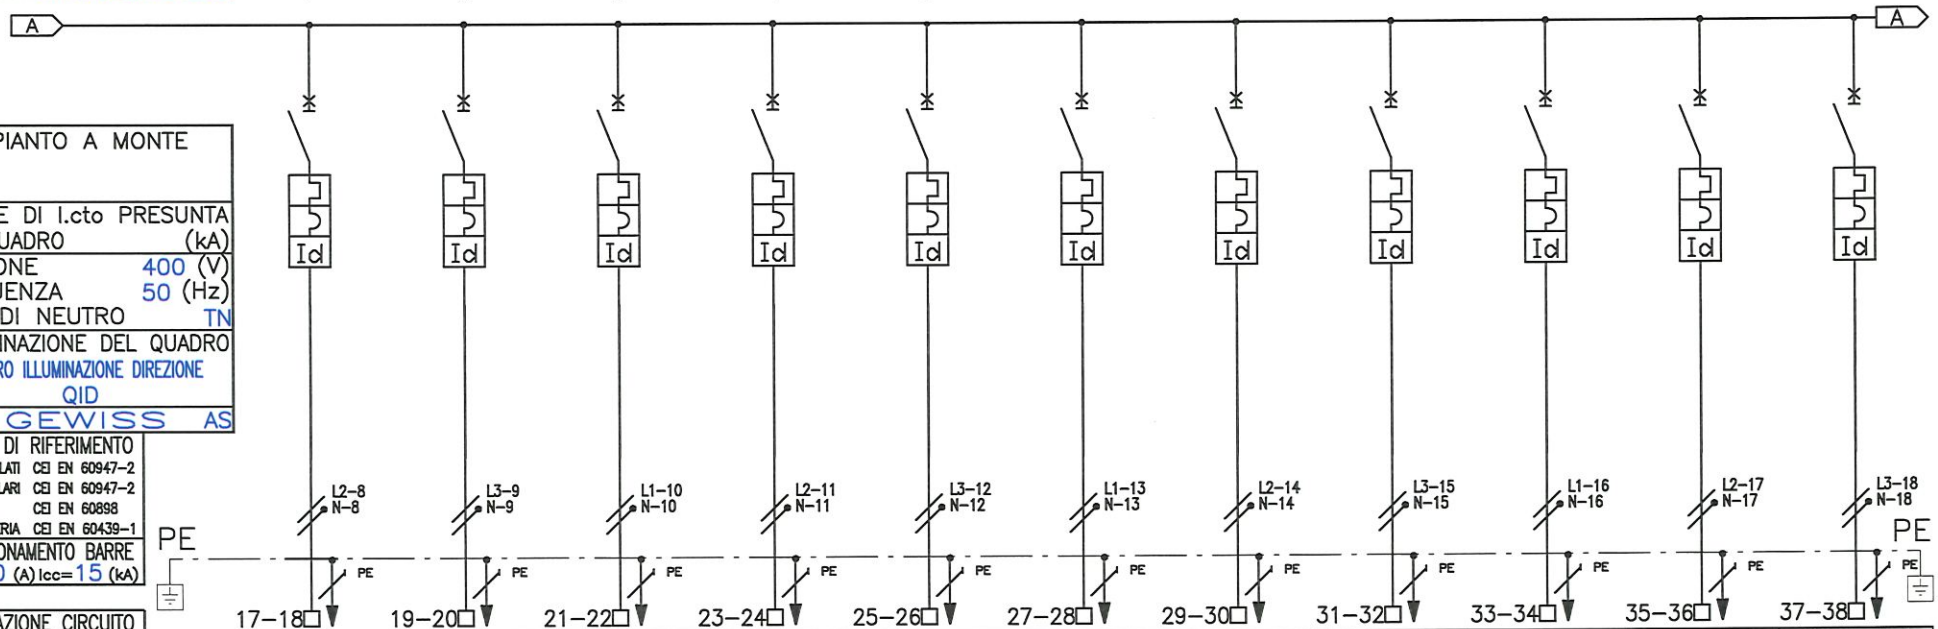

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE QID
IP 43 GEWISS AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		TORRETTA A UFFICIO 2	TORRETTA B UFFICIO 2	LUCI ESTERNE LATO UFFICIO DIREZIONE	TORRETTA UFFICIO 4	TORRETTA UFFICIO 5	ASCIUGAMANI BAGNO 1	ASCIUGAMANI BAGNO 2	PRESA BOILER BAGNO 2	PRESE UFFICIO 6 + 7	TORRETTA A UFFICIO 7	TORRETTA B UFFICIO 7
INTERRUTTORE	TIPO	GW94007	GW94007	GW94006	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)	1x16+N	1x16+N	1x10+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	10	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081/5511774 - www.comeccabit - email@comeccabit


CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26	PAG. 2 DI 5	Ed. 0
Disegnatore : A.Z.	File: QID.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

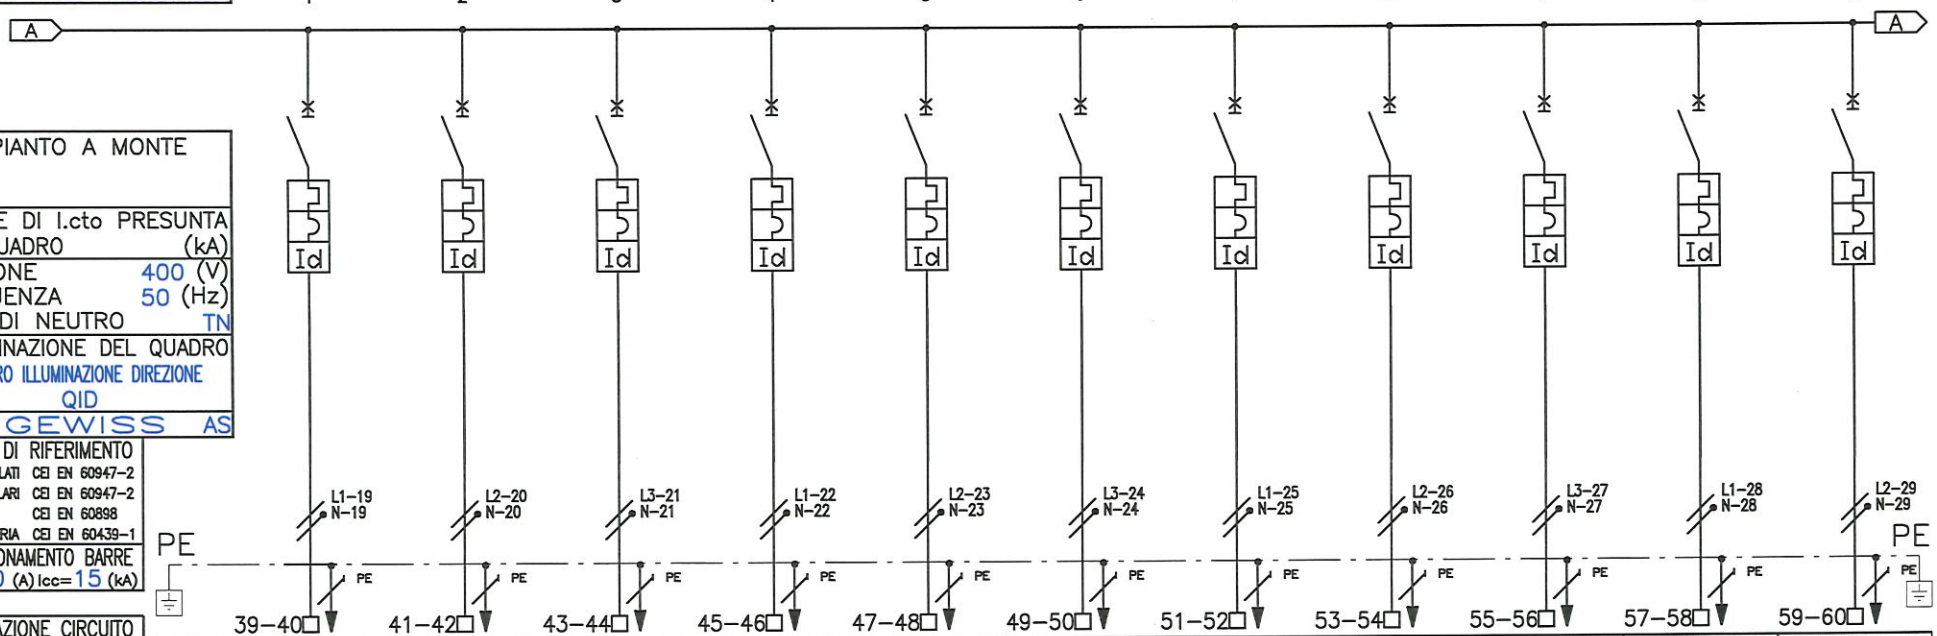

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE QID
IP 43 GEWISS AS	

NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		TORRETTA A UFFICIO 10	TORRETTA B UFFICIO 10	TORRETTA C UFFICIO 10	TORRETTA D UFFICIO 10	TORRETTA E UFFICIO 10	TORRETTA F UFFICIO 10	TORRETTA G UFFICIO 10	PRESE UFFICIO 10 + 12	TORRETTA A UFFICIO 11 SALA CONFER.	TORRETTA B UFFICIO 11 SALA CONFER.	TORRETTA C UFFICIO 11 SALA CONFER.
INTERRUTTORE	TIPO	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 0815231774 - www.comeccab.it - email@comeccab.it


CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 3 DI 5 | Ed. 0
Disegnatore : A.Z. | File: QID.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

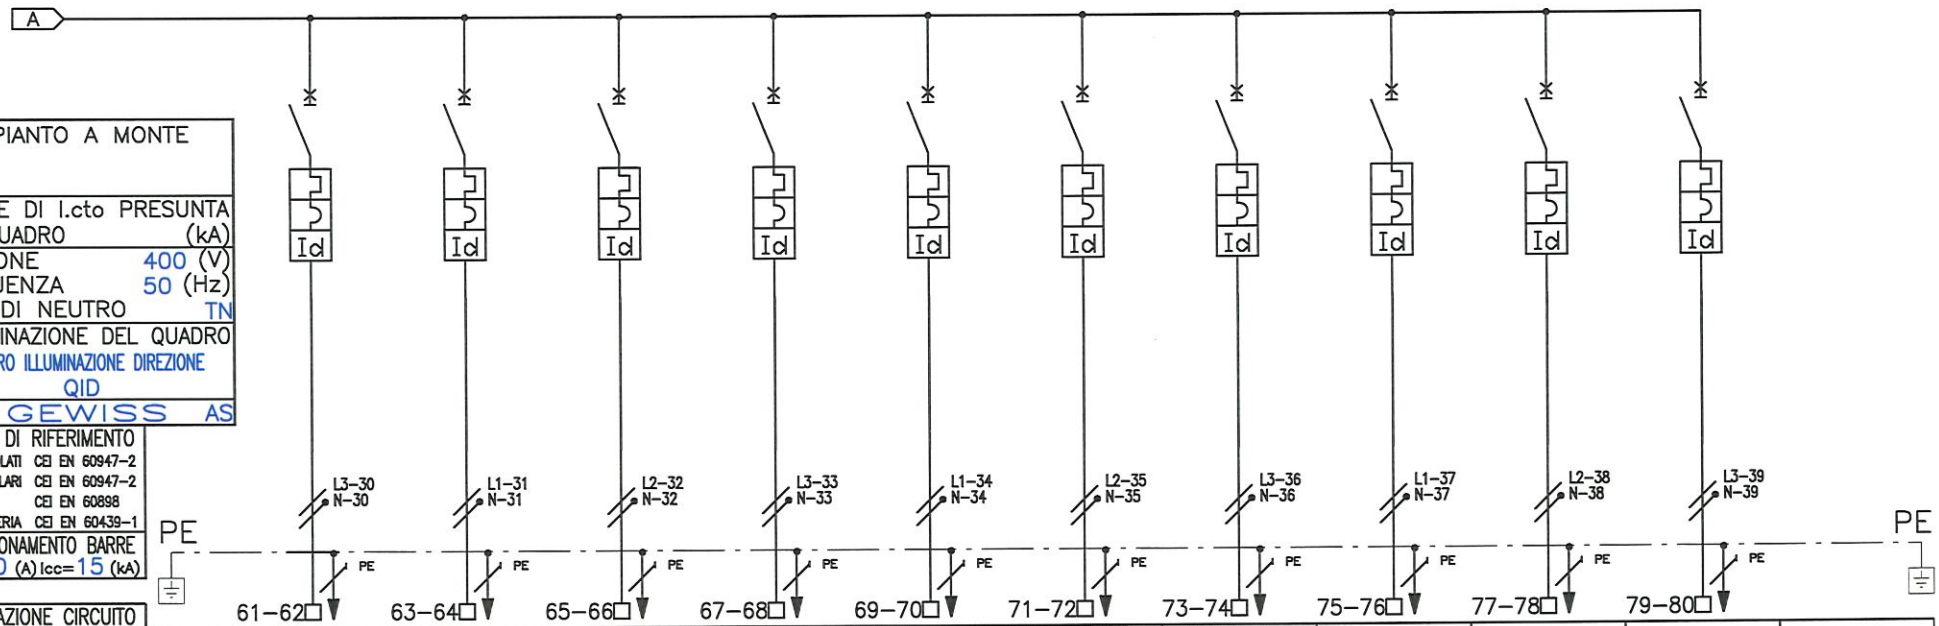

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE QID
IP 43 GEWISS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		61-62	63-64	65-66	67-68	69-70	71-72	73-74	75-76	77-78	79-80	
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PRESE SERVIZIO SALA CONFERENZA	LUCI ESTERNE UFFICIO 11 SALA CONFER.	TORRETTA AREA BREAK	FORNO AREA BREAK	MACCH. CAFFE' + FRIGO AREA BREAK	LUCI ESTERNE AREA BREAK	QUADRO PRESE SEGRETERIA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	
INTERRUTTORE	TIPO	GW94007	GW94006	GW94007	GW94007	GW94007	GW94006	GW94018	GW94007	GW94007	GW94007	
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	N. POLI x In (A)	1x16+N	1x10+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x10+N	1x20+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	SOGLIA Irth (A)	16	10	16	16	16	10	20	16	16	16	
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,3	0,03	0,03	0,03	
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081/5711774 - www.comecsrl.it - e-mail:info@comecsrl.it


CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 4 DI 5 | Ed. 0
Disegnatore : A.Z. | File: QID.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL–2	Q37		Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

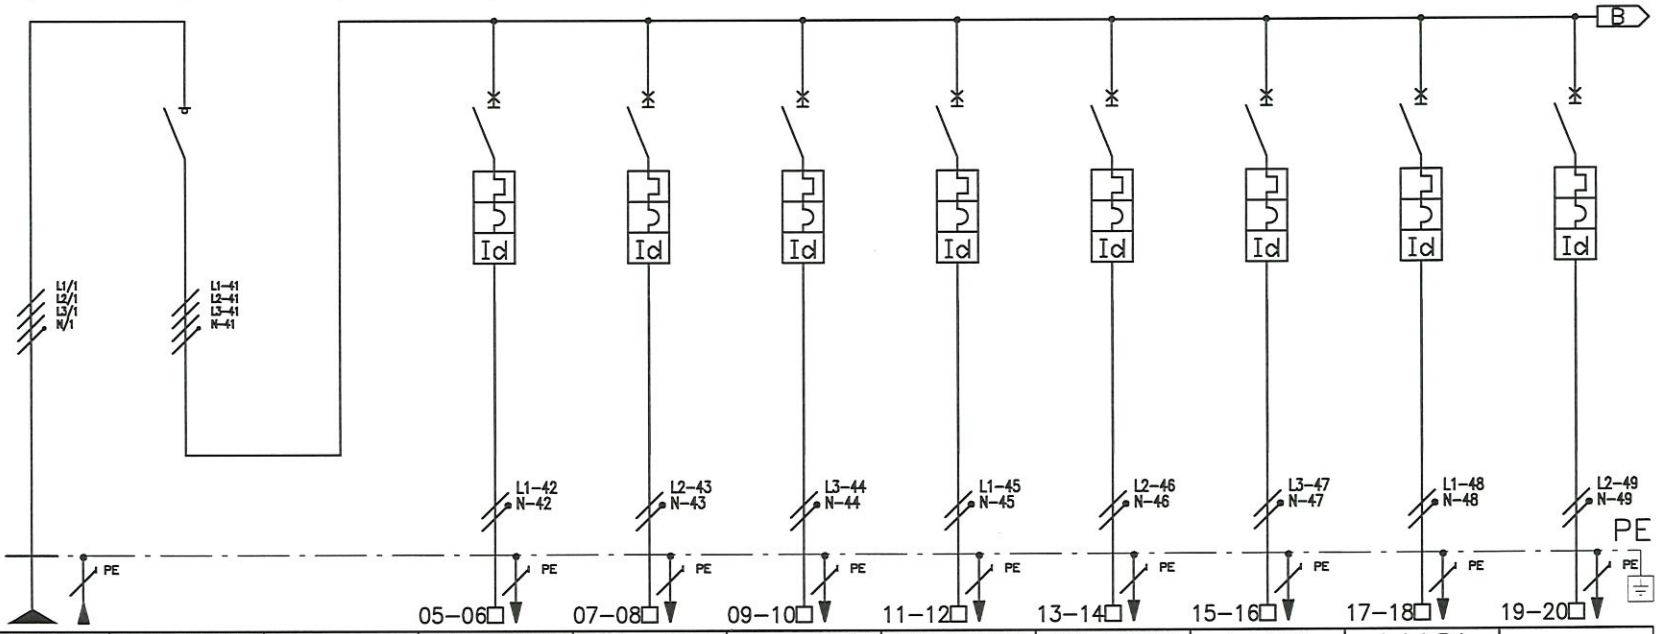

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
QID
IP 43 GEWISS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO ILL. LATO DIREZIONE	INTERRUTTORE QUADRO ILLUMINAZIONE LATO DIREZIONE		LUCI + PRESE SERVIZ. UFFICIO 1	LUCI + PRESE SERVIZ. UFFICIO 2	LUCI + PRESE SERVIZ. UFFICIO 4 E 5	LUCI + PRESE SERVIZ. BAGNO 1	LUCI + PRESE SERVIZ. BAGNO 2	LUCI UFFICIO 6	LUCI UFFICIO 7	LUCI HALL
INTERRUTTORE	TIPO		GW96135		GW94007	GW94007	GW94007	GW94006	GW94006	GW94006	GW94006	GW94006
	P.D.I. (kA)				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)		4x40		1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N
	CURVA / SGANCIAT.				C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)				16	16	16	10	10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)				10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)				0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)				ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE				AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400			230	230	230	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 – 081.5511774 – www.comecsrl.it – email@comecsrl.it

CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*


IMPIANTO : *ELETTRICO – UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 5 DI 5 | Ed. 0

Disegnatore : A.Z. | File: QID.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52				
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

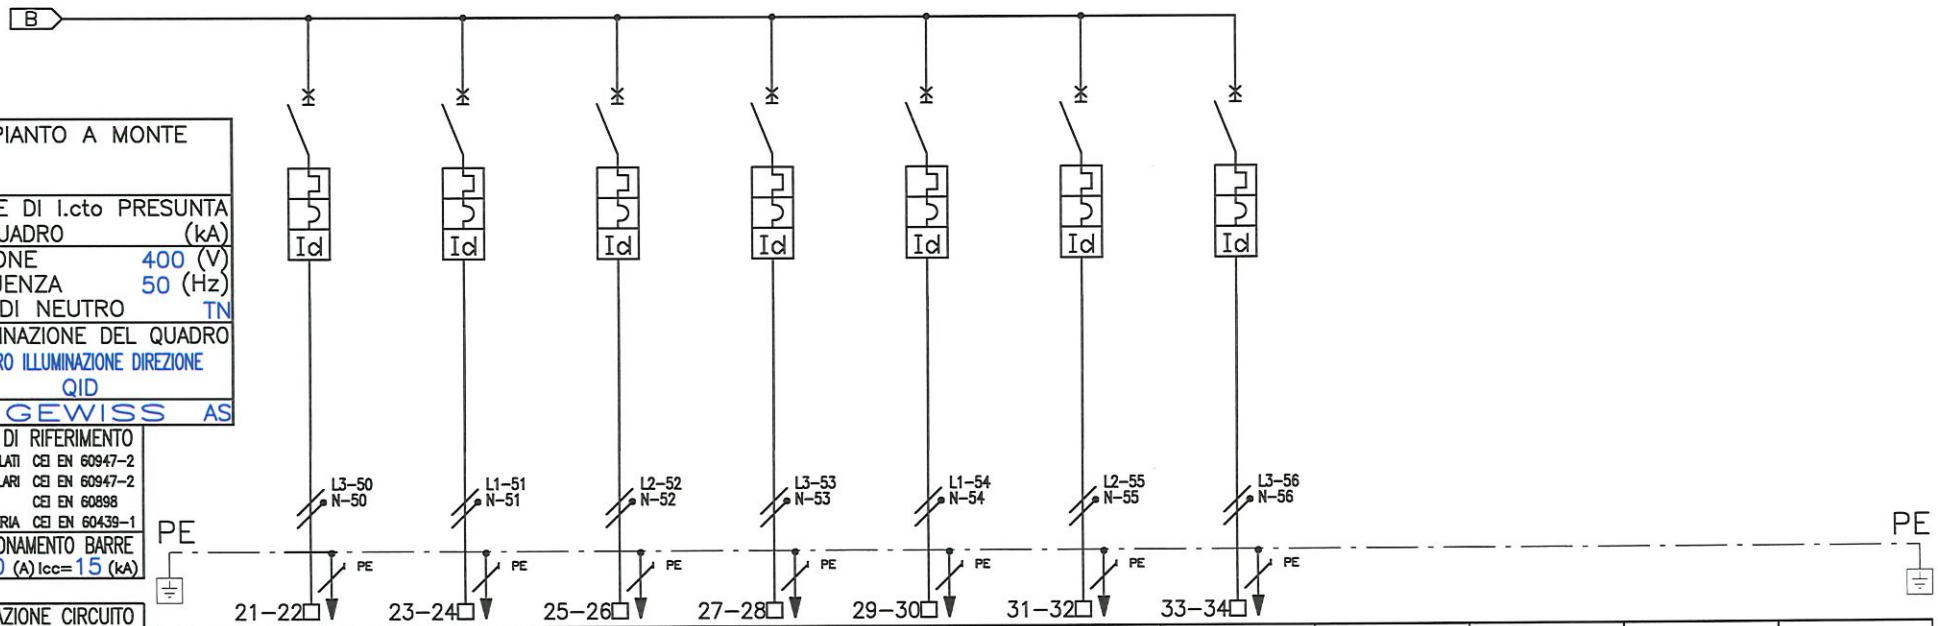

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE QID
IP 43 GEWISS AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE	
In= 250 (A) Icc=15 (kA)	

NUMERAZIONE CIRCUITO		21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34				
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI UFFICIO 10	LUCI SALA CONFERENZE	LUCI AREA BREAK	LUCI CORRIDOIO LATO DIREZIONE	LUCI SEGRETERIA	RISERVA	RISERVA				
INTERRUTTORE	TIPO	GW94006	GW94006	GW94006	GW94006	GW94006	GW94006	GW94007				
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
	N. POLI x In (A)	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x16+N				
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C				
	SOGLIA Irth (A)	10	10	10	10	10	10	16				
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth				
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03				
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO				
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC				
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230	230	230				
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Palatucci n. 19 - 0815511774 - www.comecsrl.it - e-mail@comecsrl.it

CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 4 DI 5 | Ed. 0

Disegnatore : A.Z. | File: QID.DWG

TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	RONZATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
Visto	

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :


Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 030/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.


Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QID.DWG	QID.DWG	1	4	0

RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE Q1

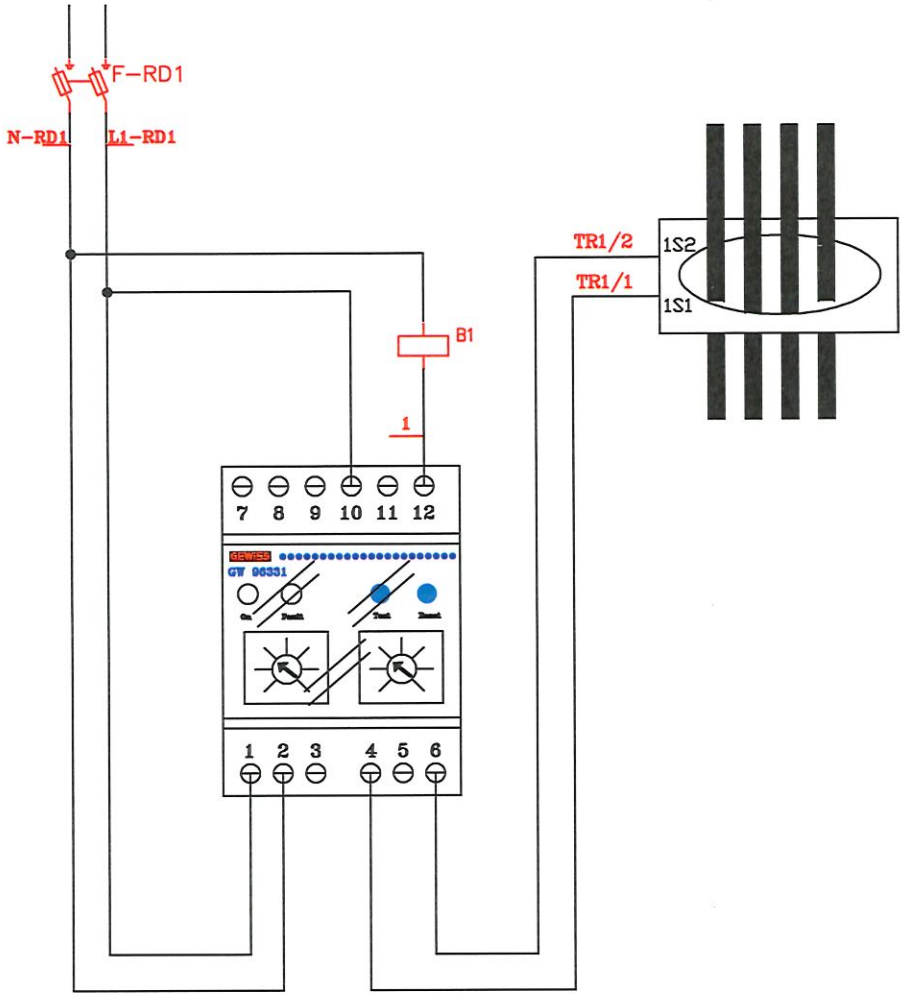

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE SCHEMA AUSILIARE	Matricola 030/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : QID.DWG Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 4	Rev. 0


RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE Q2

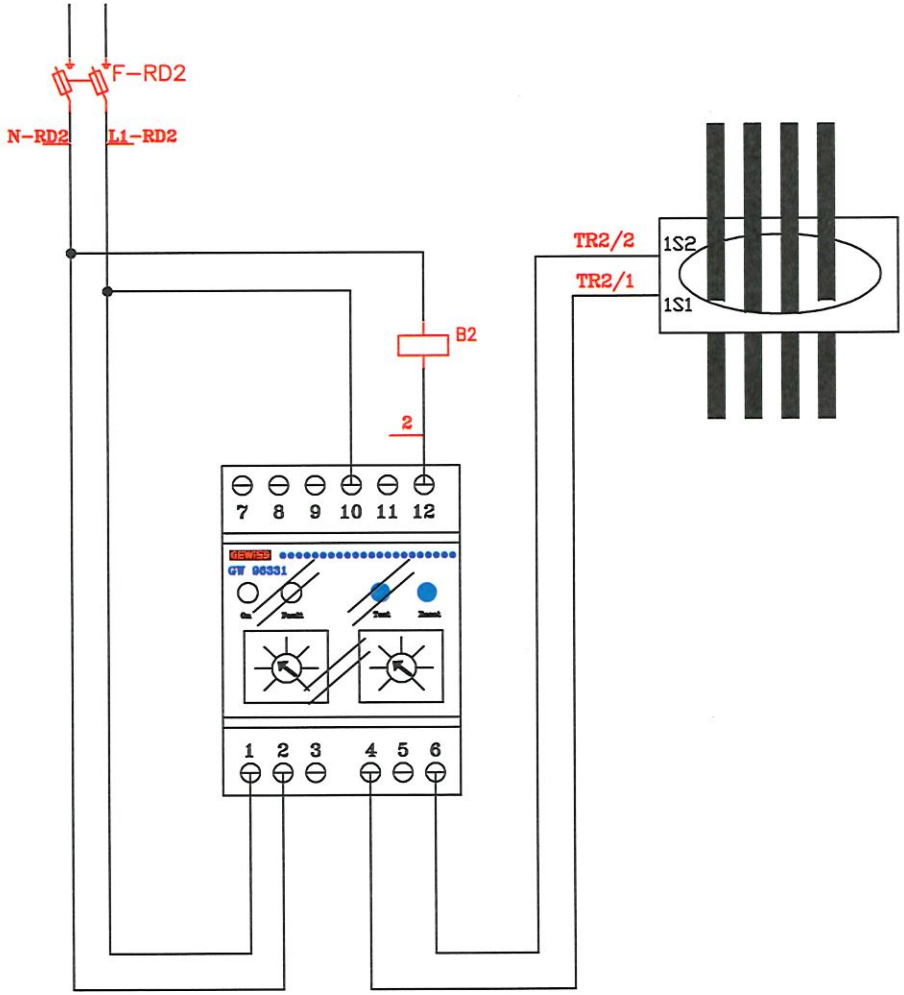

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE SCHEMA AUSILIARE	Matricola 030/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : QID.DWG Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 4	Rev. 0

CONTATTI AUSILIARI INTERRUTTORI

MORSETTIERA X3

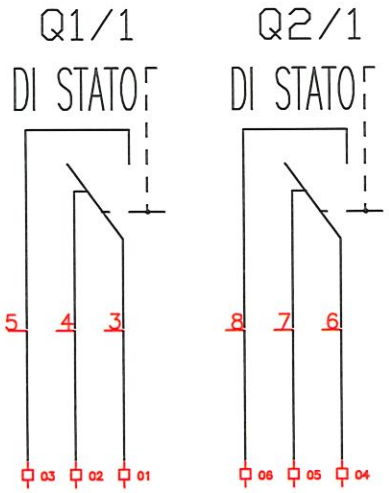

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE SCHEMA AUSILIARE	Matricola 030/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : QID.DWG Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 4	Rev. 0

LEGENDA MORSETTIERA

X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
X2	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE ILL. LATO DIREZIONE
X3	MORSETTIERA PER CONTATTI AUSILIARI

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774


Data 29/01/26
Disegn. A.Z.
Proget.
Visto

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :

Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 030/26
Cliente AMENOPHIS S.R.L.
Nome File : QID.DWG
Percorso File : QID.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 8
Rev. 0

MORSETTIERA X1

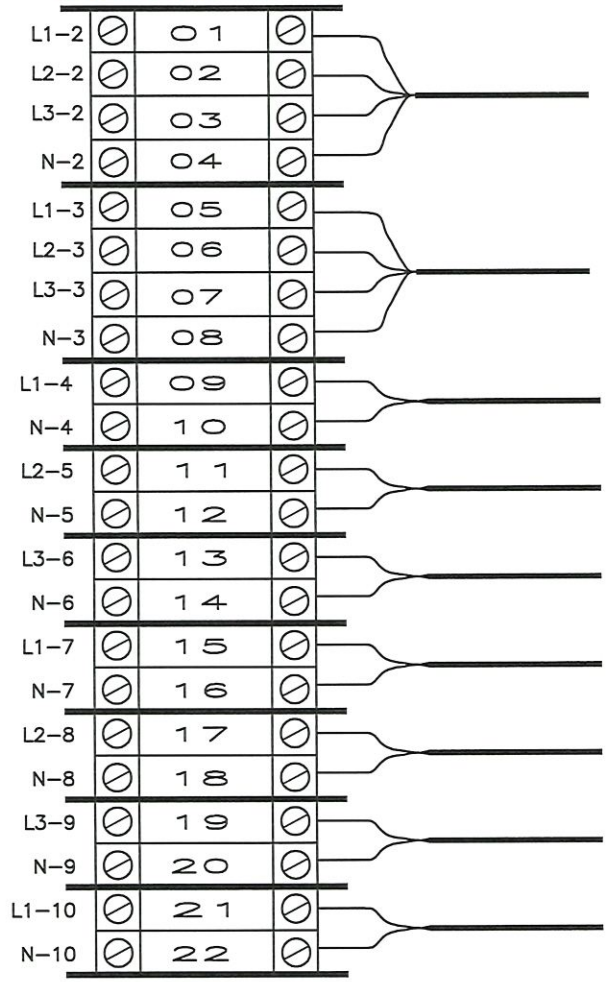

Sigla: VERSO SOTTOQUADRO LATO CED

Sigla: MACCHINA ESTERNA CDZ LATO DIREZIONE

Sigla: UNITA' INTERNE CDZ LATO DIREZIONE

Sigla: RECUPERATORE DI CALORE LATO DIREZIONE

Sigla: TORRETTA A UFFICIO 1

Sigla: TORRETTA B UFFICIO 1

Sigla: TORRETTA A UFFICIO 2

Sigla: TORRETTA B UFFICIO 2


Sigla: LUCI ESTERNE LATO UFFICIO DIREZIONE

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 030/26				
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE	Cliente AMENOPHIS S.R.L.				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QID.DWG	Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 8	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1

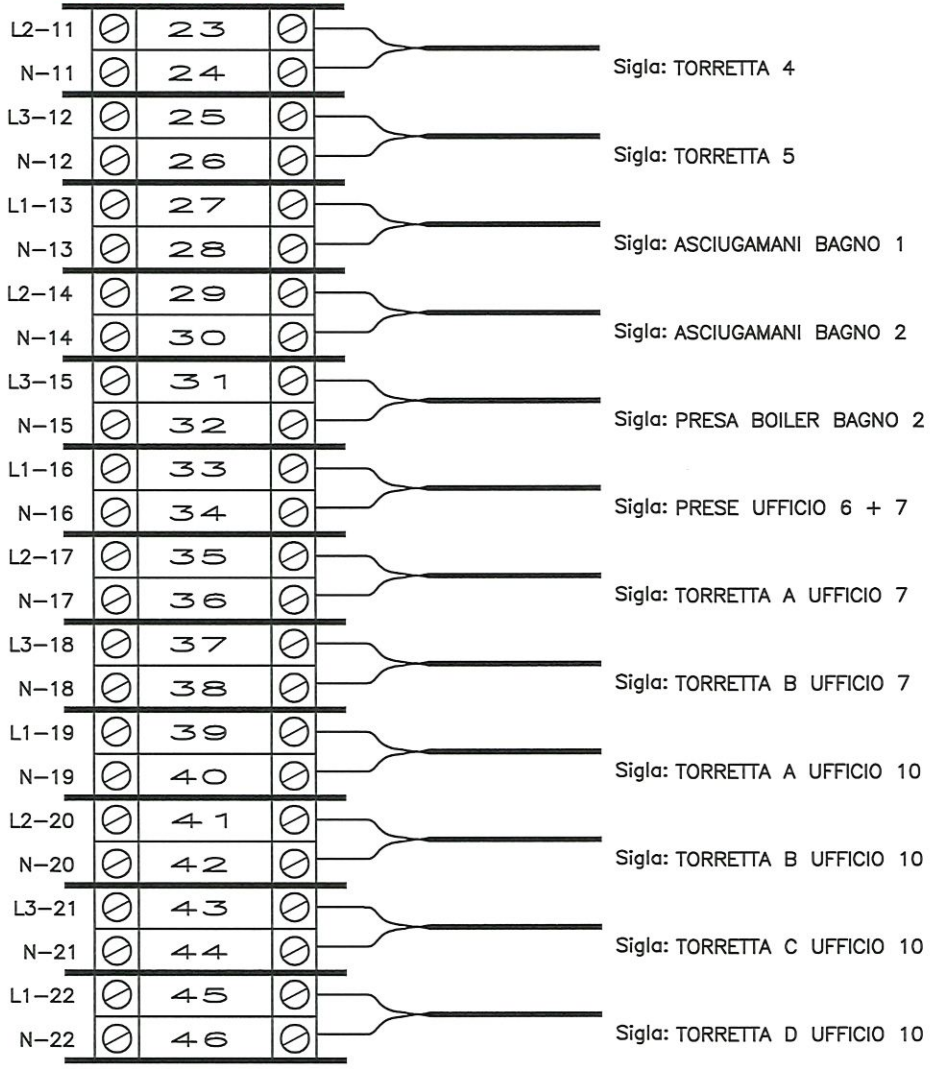


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 030/26
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE	Cliente AMENOPHIS S.R.L.
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QID.DWG / Percorso File : QID.DWG / Nr. Foglio 3 / Nr. Fogli 8 / Rev. 0
visto			

MORSETTIERA X1

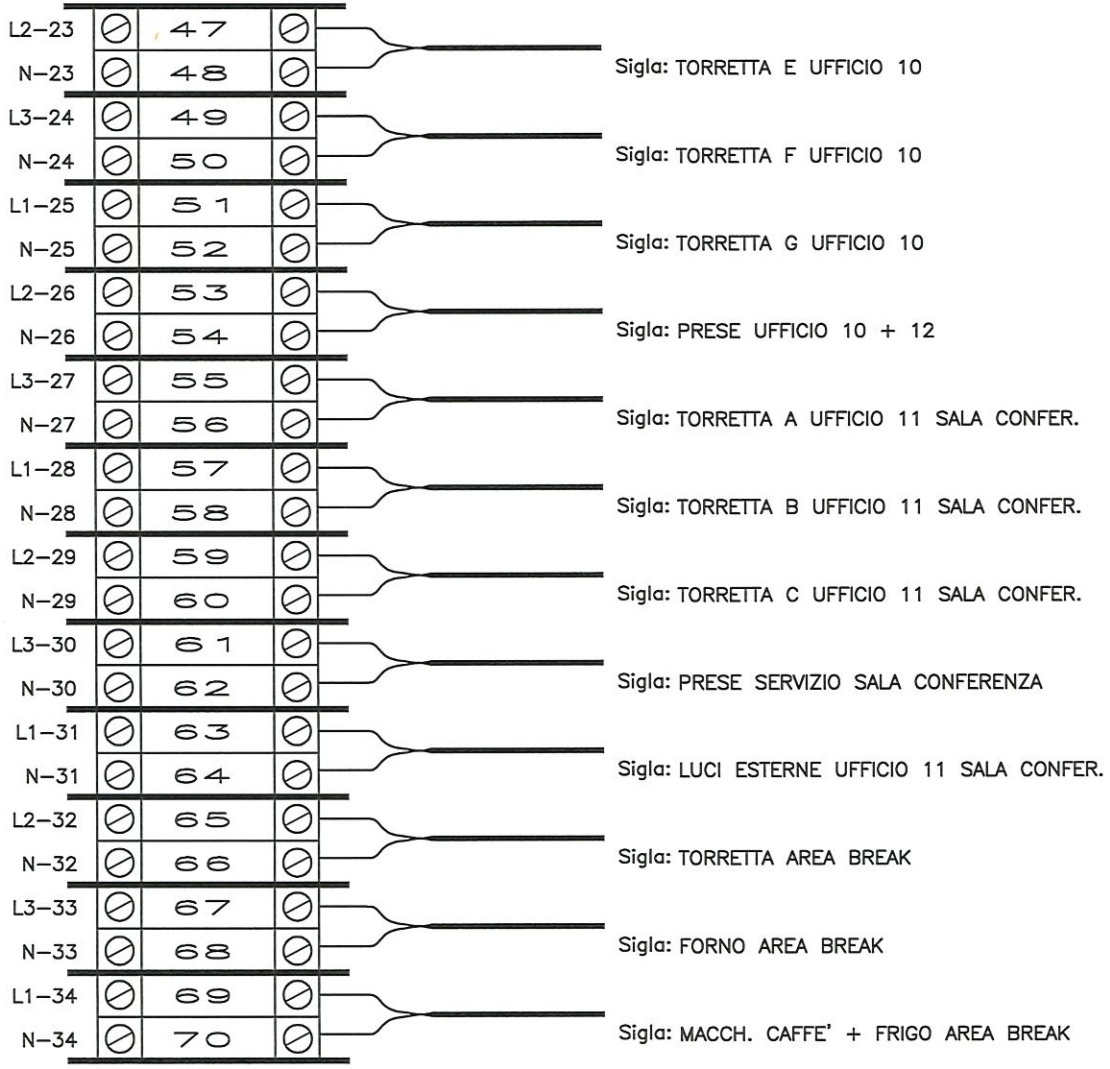

Sigla: TORRETTA E UFFICIO 10

Sigla: TORRETTA F UFFICIO 10

Sigla: TORRETTA G UFFICIO 10

Sigla: PRESE UFFICIO 10 + 12

Sigla: TORRETTA A UFFICIO 11 SALA CONFER.

Sigla: TORRETTA B UFFICIO 11 SALA CONFER.

Sigla: TORRETTA C UFFICIO 11 SALA CONFER.

Sigla: PRESE SERVIZIO SALA CONFERENZA

Sigla: LUCI ESTERNE UFFICIO 11 SALA CONFER.

Sigla: TORRETTA AREA BREAK

Sigla: FORNO AREA BREAK

Sigla: MACCH. CAFFE' + FRIGO AREA BREAK

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :


Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 030/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QID.DWG	QID.DWG	4	8	0

MORSETTIERA X1

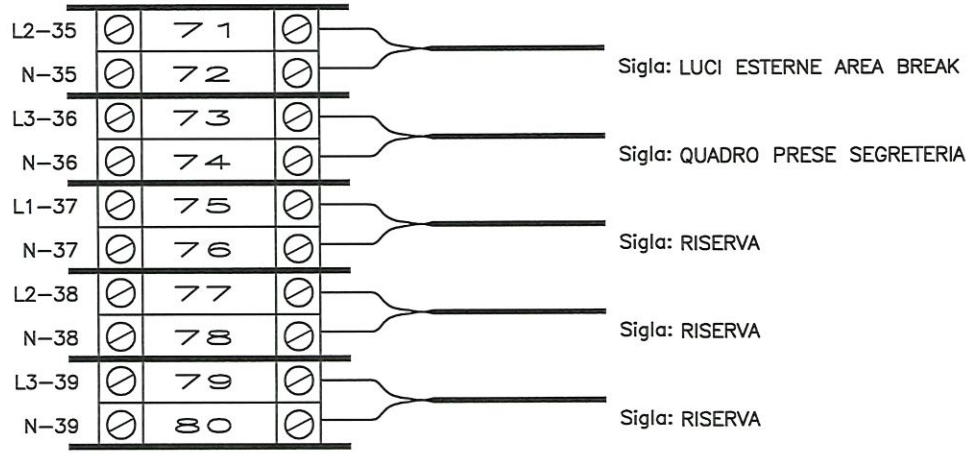


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 030/26		
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE	Cliente AMENOPHIS S.R.L.		
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QID.DWG	Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 1 / Nr. Fogli 8 / Rev. 0
visto					

MORSETTIERA X2

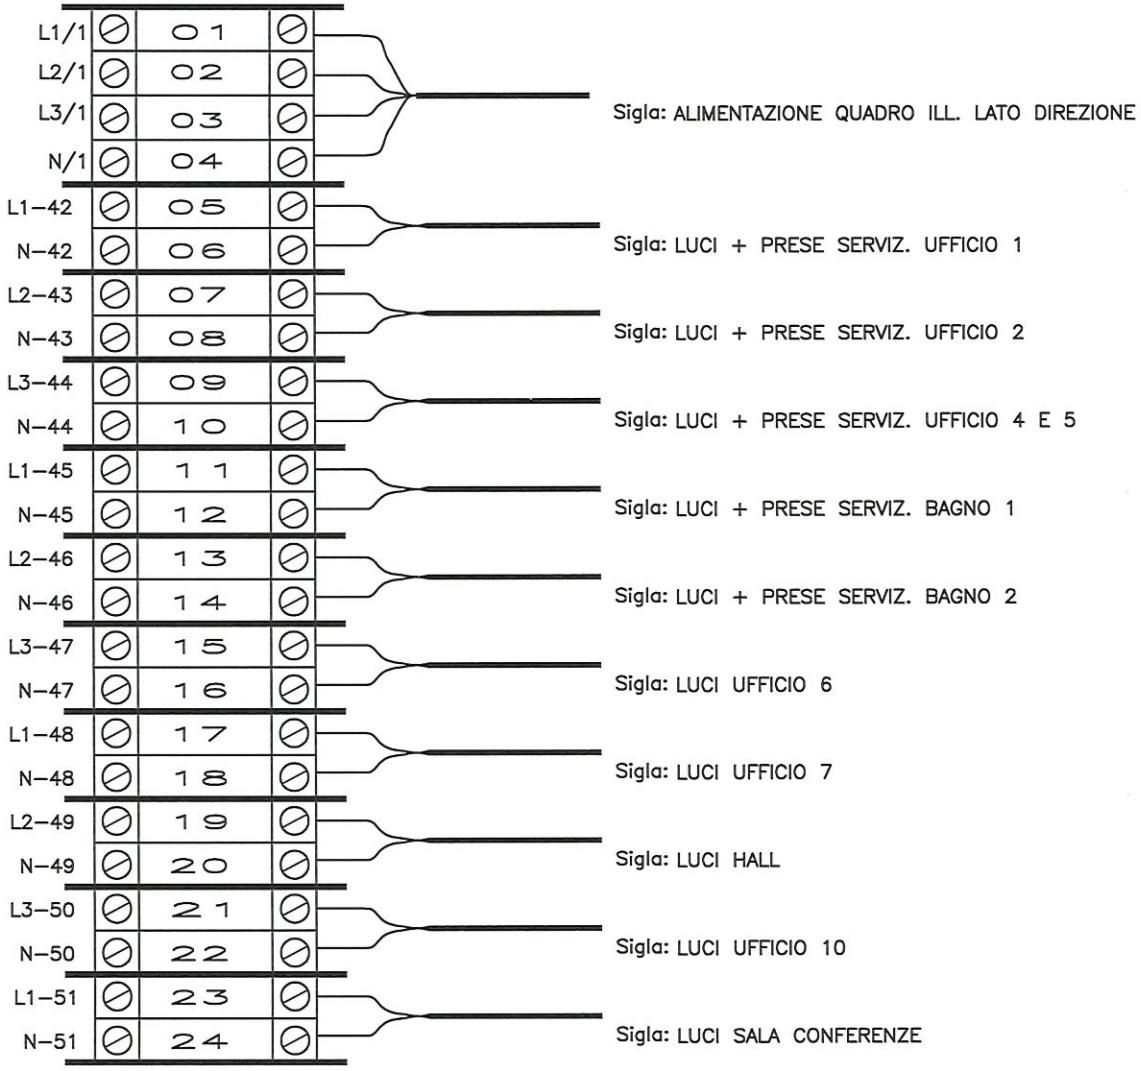


MORSETTIERA X2

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 030/26				
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE	Cliente AMENOPHIS S.R.L.				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QID.DWG	Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 8	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X2

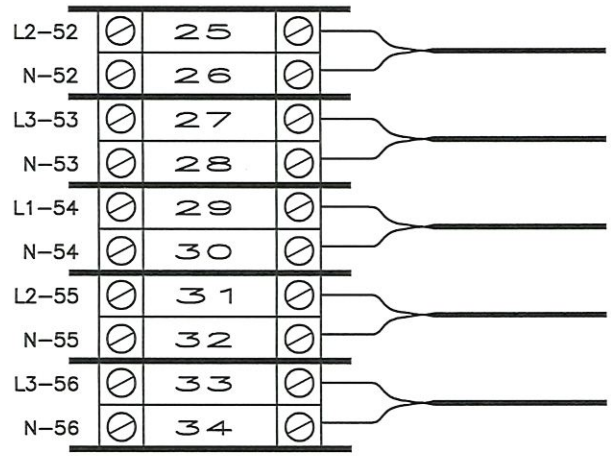

Sigla: LUCI AREA BREAK

Sigla: LUCI CORRIDOIO LATO DIREZIONE

Sigla: LUCI SEGRETERIA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

MORSETTIERA X2

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :


Descrizione: QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 030/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.

Nome File : QID.DWG	Percorso File : QID.DWG	Nr. Foglio 7	Nr. Fogli 8	Rev. 0

MORSETTIERA X3

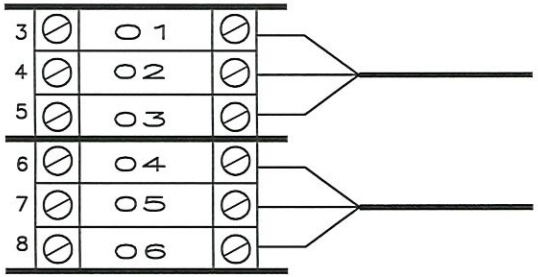

Sigla: CONTATTO AUSILIARE DI STATO – INTERRUTTORE Q1

Sigla: CONTATTO AUSILIARE DI STATO – INTERRUTTORE Q2

MORSETTIERA X3

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :	
Descrizione:	QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZIONE SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	030/26
Cliente	AMENOPHIS S.R.L.
Nome File :	QID.DWG
Percorso File :	QID.DWG
Nr. Foglio	8
Nr. Fogli	8
Rev.	0
