COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	SOTTOQUADRO LATO CED SQ LC



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DÌ CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DÌ CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DÌ TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DÌ POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 19 / 02 / 2025 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**SOCIT S.r.l.** **Via Vito Di Jasi 83, Aversa 81031**

Descrizione Quadro:	**Sottoquadro Lato CED**
Locazione del quadro:	**Amenophis S.r.l. – Uffici Casalnuovo di Napoli**
Quadro:	**SQ LC**
Identificazione del quadro:	**031 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	125 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	43
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	37
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	850x1760x230 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	QDX 630L Gewiss S.p.A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Grigio RAL7035
Note	

Carateristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Gewiss S.p.A.** serie **QDX 630L** in materiale metallico spessore lamiera d'acciaio 15/10 e lamiera zincata 20/10; Montanti funzionali interni con foratura passo 25mm per il montaggio dei kit di installazione degli apparecchi;

Verniciatura delle lamiere con polvere epossidiche previa fosfatazione colore Grigio RAL7035 bucciato;

Grado di Protezione IP43

Grado di Robustezza IK09 con porta vetro

Specifiche Tecniche

I quadri elettrici di distribuzione componibili della serie QDX 630 L con grado protezione fino a IP43 sono disponibili sia nella versione da parete che da pavimento, per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Entrambe le soluzioni utilizzano lo stesso sistema di accessori e hanno la stessa modalità di montaggio, pensato per essere semplice e rapido. Il cablaggio può essere effettuato con la struttura completamente aperta, permettendo un lavoro più agevole, per poi completare il montaggio del quadro in un secondo momento.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO SALA CED			
Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
GW92093	INT.MAGNETOTERMICO 4P C63 6KA 4M	1	GEWISS
GW93347	INT.MAGNET.ALTE PREST.4P C80 16KA 6M	2	GEWISS
GW94006	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M	10	GEWISS
GW94007	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M	19	GEWISS
GW64008	MOLTIPL.ST.2U 2P+T 16A 110V 4H	1	GEWISS
GW94018	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C20 4,5KA AC/0,3 2M	1	GEWISS
GW94179	INT.MAGN.DIF.C.4P C25 6KA AC/0,3 4M	2	GEWISS
GW94180	INT.MAGN.DIF.C.4P C32 6KA AC/0,3 4M	1	GEWISS
GW96001	CONTATTO AUSILIARIO APERTO/CHIUSO	2	GEWISS
GW96012	SGANCIATORE LANCIO CORRENTE 110/415V	2	GEWISS
GW96135	INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 40A	1	GEWISS
GW96179	INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 125A	1	GEWISS
GW96331	RELE DIFFERENZIALE DI TERRA	2	GEWISS
GW96332	TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM	2	GEWISS
GW44696	MORSETTIERA TETRAPOLARE 4 MOD.EN 50022	2	GEWISS
GW44698	MORSETTIERA TETRAPOLARE 8 MOD.EN 50022	1	GEWISS
GW45565	BARRA DI TERRA 20X5	1	GEWISS
GW47692	CVX630/1600 - GUIDA EN50035 (G32) L=2MT	1	GEWISS
GWD3047	PAVIM MOT H1600	1	GEWISS
GWD3053	PANNELLI H 1600X200	1	GEWISS
GWD3062	TELAIO POST 850X1600	1	GEWISS
GWD3083	PAV VANO INTERNO 1600X200	1	GEWISS
GWD3302	PANNELLI FIN E GUIDA DIN	8	GEWISS
GWD3311	STAFFE DIN	8	GEWISS
GWD3318	MOSTRINE	1	GEWISS
GWD3361	SEGREGAZIONE	2	GEWISS
GWD3441	GOLFARI	1	GEWISS
GWD3471	STAFFE MORSETTIERA	1	GEWISS
GWD3617	BASE TESTATA 850X200	1	GEWISS
GWD3630	PAVIM PORTA VETRO 850X1600	1	GEWISS
GWD3821	UTENSILE AGGANCIO	1	GEWISS
GW94007	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M	3	GEWISS
GW94008	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C20 4,5KA AC/0,03 2M	1	GEWISS
GW94018	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C20 4,5KA AC/0,3 2M	2	GEWISS
GW94019	INT.MAGN.DIF.C.1P+N C25 4,5KA AC/0,3 2M	2	GEWISS
GW96135	INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 40A	1	GEWISS
GW40049	CENTRALINO PAR.ARR.36M.(18X2) IP40	1	GEWISS
GW96220	PORTAFUS.SEZ. COMPATTO 1P+N 10,3X38 690V	2	GEWISS

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**31**
Date of document: *Data del documento:*	**19/02/2026**

Customer/*Cliente*:	**SOCIT S.r.l.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**QDX 630L / Gewiss S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**19/02/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**015 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**031/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**SQ Lato CED**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	1890	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	125	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	10	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	15	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	031/25D
Single line dwg. *Schema unifilare*	031/26 SQ LC
Schematic dwg. *Schema funzionale*	031/26 SQ LC
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	031/26 SQ LC

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function** *Prove di funzionamento elettrico*	CEI EN 61439-2 par. 11.10	Satisfactory *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE: Resp. Tecnico Sig. non presente

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI NAPOLI
Via G. Paladino, 19 - 80[illegible] C.F. 06[illegible]
www.comeccab.it - P.IVA

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

DATI DI TARGA DEL QUADRO

DENOMINAZIONE		SOTTOQUADRO LATO CED
NATURA DELLA CORRENTE		3F+N+PE
PORTATA NOMINALE	In(A)	125A
TENSIONE NOMINALE	V(V)	400V
FREQUENZA	F(Hz)	50Hz
TIPO	AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE		1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN.	PI(KA)	16
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI		CEI EN 60947-2 / EN60898
GRADO DI PROT. DELLA STR.	IP	43
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)		850x1760x230mm
MATRICOLA		031/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113		


COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data 29/01/26
Disegn. A.Z.
Proget.
Visto

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :


Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED DATI DI TARGA

Matricola 031/26
Cliente AMENOPHIS S.R.L.
Nome File : SLC.DWG
Percorso File : SLC.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

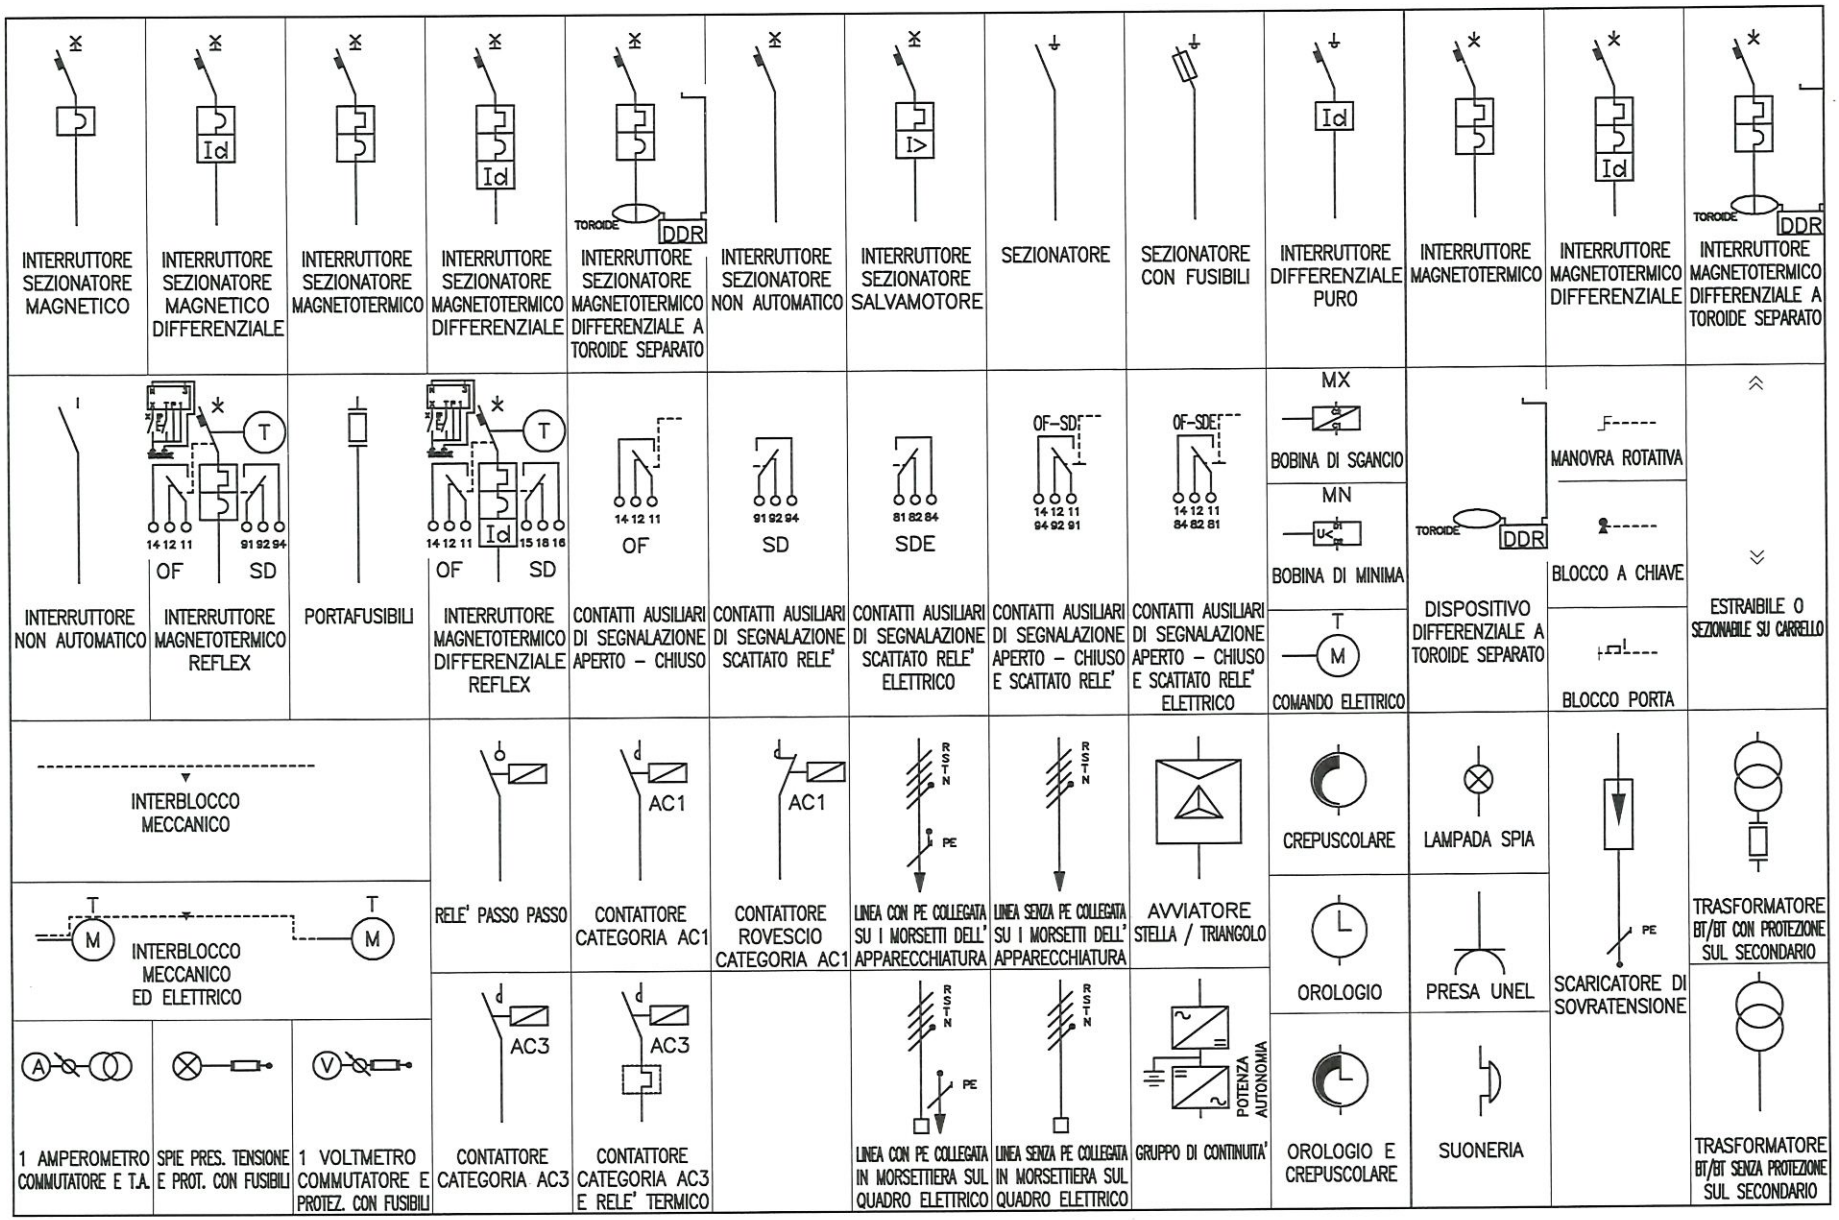

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
Visto	
Progetto Esecutivo :	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :	
Descrizione:	SOTTOQUADRO LATO CED LEGENDA QUADRO
Matricola	031/26
Cliente	AMENOPHIS S.R.L.
Nome File :	SLC.DWG
Percorso File :	SLC.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

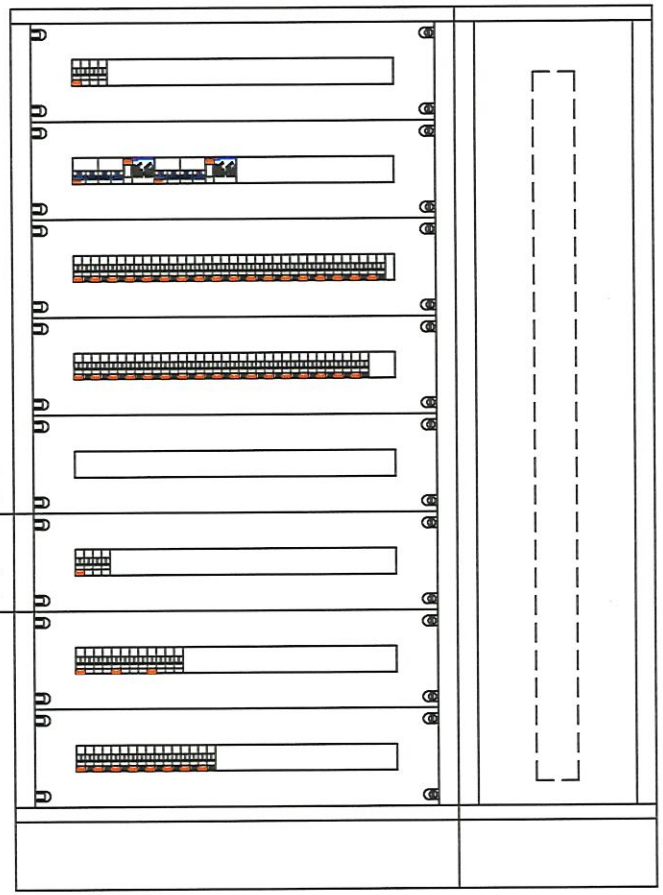

ARRIVO
DALL'ALTO

STRUTTURA QUADRO	GEWSISS
MODELLO	QDX 630L
GRADO IP	43
DIMENSIONE (BxHxP)	850x1760x230mm

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data 29/01/26
Disegn. A.Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :

Descrizione:
SOTTOQUADRO LATO CED
FRONTE
QUADRO

Matricola 031/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.

Nome File : SLC.DWG


Percorso File : SLC.DWG

Nr. Foglio 1

Nr. Fogli 1

Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		Q1	F-RD1	Q2	F-RD2	Q3	Q4	Q5	Q6
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

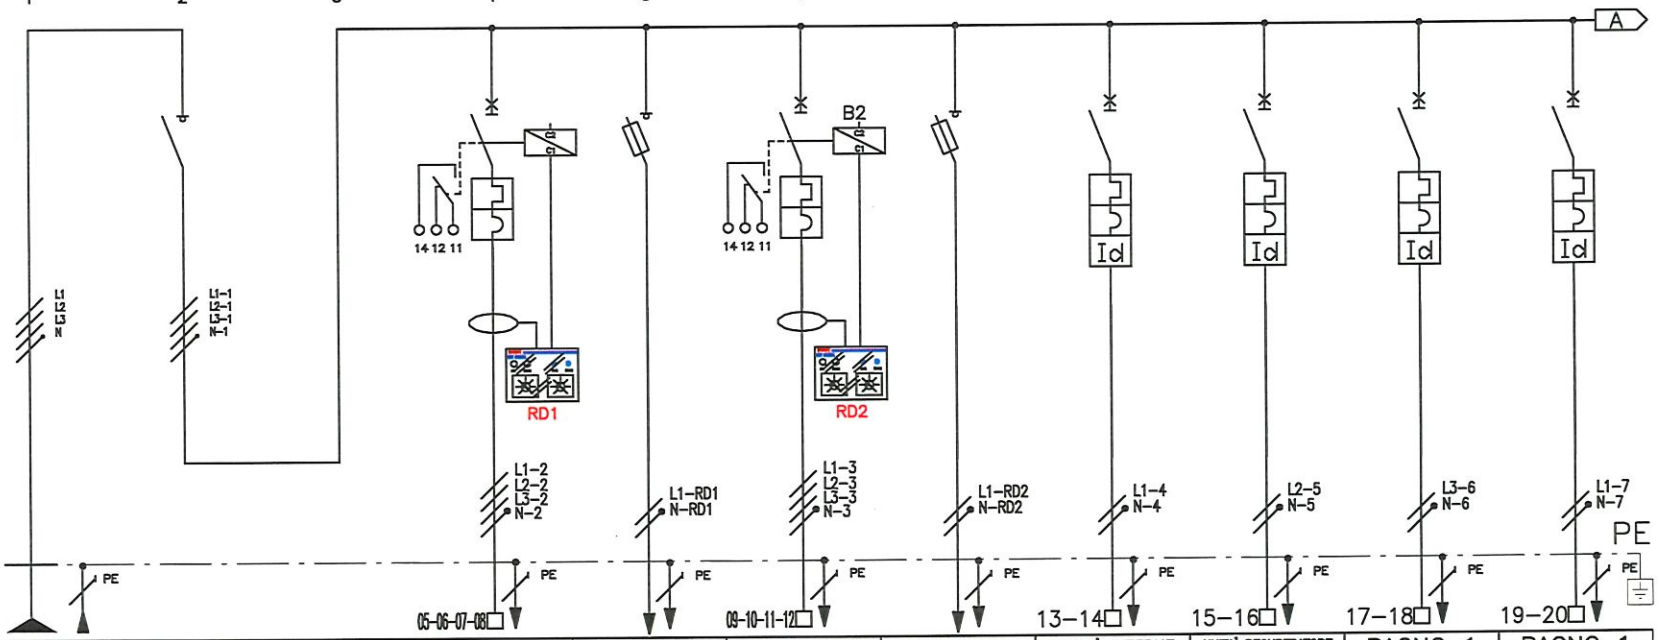

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	SOTTOQUADRO LATO CED QG
IP 43 GEWISS AS	
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE NORMALE	INTERRUTTORE GENERALE		LINEA VERSO G.E.	PROTEZIONE RELE' DIFFERENZIALE RD1	MACCHINA ESTERNA CDZ LATO CED	PROTEZIONE RELE' DIFFERENZIALE RD2	UNITA' INTERNE CDZ LATO CED	UNITA' RECUPERATORE DI CALORE LATO CED	BAGNO 1 PRESA ASCIUGAMANI ELETTRICO	BAGNO 1 PRESA BOILER ELETTRICO
INTERRUTTORE	TIPO		GW96179		GW93347	GW96220	GW93347	GW96220	GW94007	GW94018	GW94007	GW94007
	P.D.I. (kA)				16		16		4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)		4x125		4x80		4x80		1x16+N	1x20+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.				C		C		C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)				80		80		16	20	16	16
	SOGLIA Irm (A)				10Irth		10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)								0,03	0,3	0,03	0,03
	RITARDO (ms)								ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE								AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)					1x32+N		1x32+N				
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400			400	230	400	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI					BOBINA A LANCIO CONTATTO AUSILIARE DI STATO		BOBINA A LANCIO CONTATTO AUSILIARE DI STATO					
NOTE AUX												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5711774 - www.comeccasa.it - emaildicomeccasa.it


CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26	PAG. 1 DI 5	Ed. 0
Disegnatore : A.Z.	File: SLC.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
NOME PROGETTO: UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

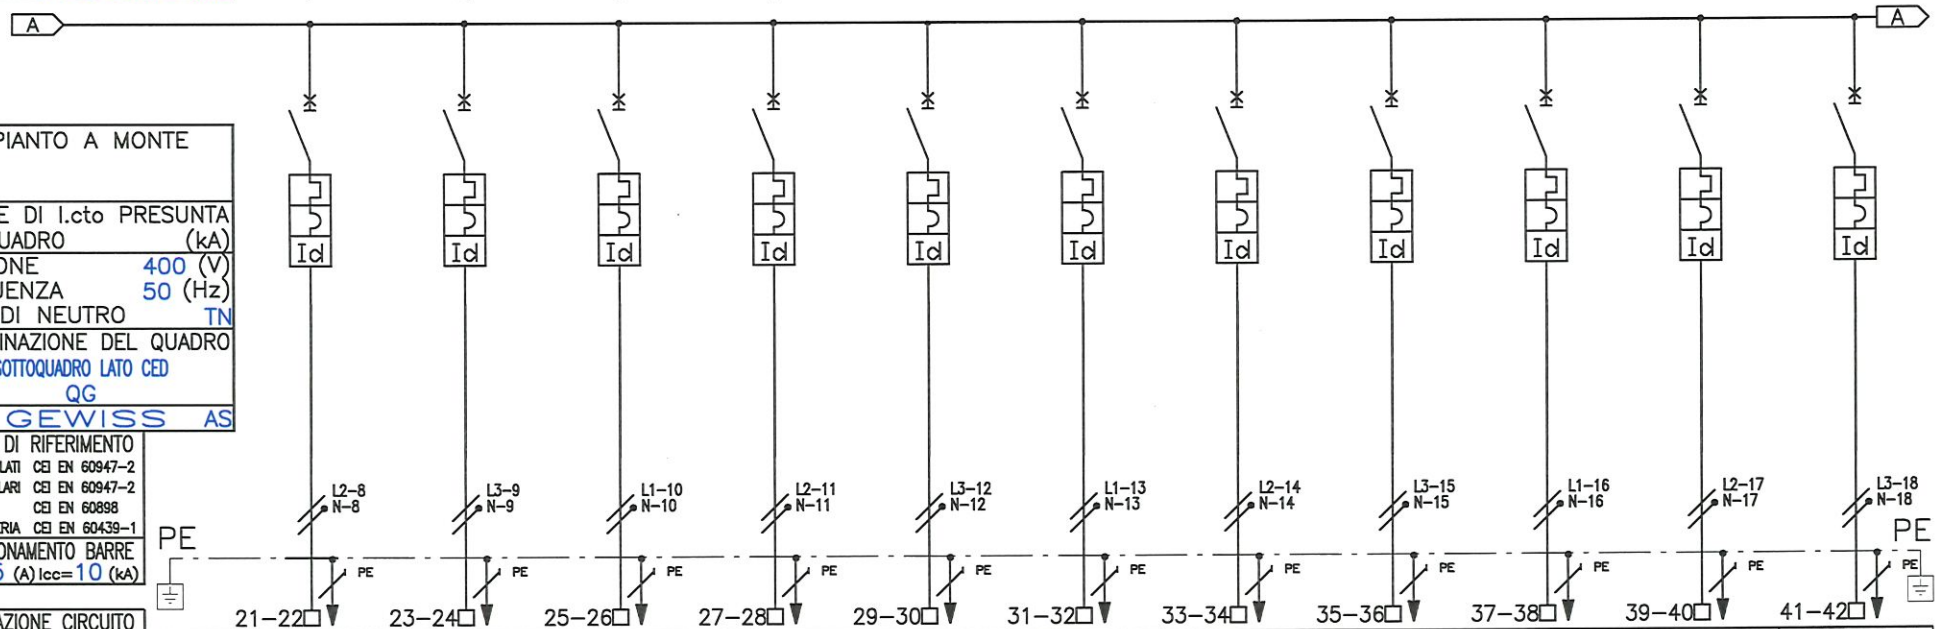

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	SOTTOQUADRO LATO CED QG
IP 43 GEWISS AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		BAGNO 2 PRESA ASCIUGAMANI ELETTRICO	BAGNO 2 PRESA BOILER ELETTRICO	TORRETTA A UFFICIO 16	TORRETTA B UFFICIO 16	PRESE SERVIZIO UFFICIO 16 + 17	POSTAZ. A PARETE UFFICIO 17	TORRETTA A UFFICIO 18	TORRETTA B UFFICIO 18	TORRETTA C UFFICIO 18	TORRETTA D UFFICIO 18	TORRETTA E UFFICIO 18
INTERRUTTORE	TIPO	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007	GW94007
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 0815511774 - www.comeccasa.it - emailinfo@comeccasa.it

CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*


IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 2 DI 5 | Ed. 0

Disegnatore : A.Z. | File: SLC.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25			
NOME PROGETTO: UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

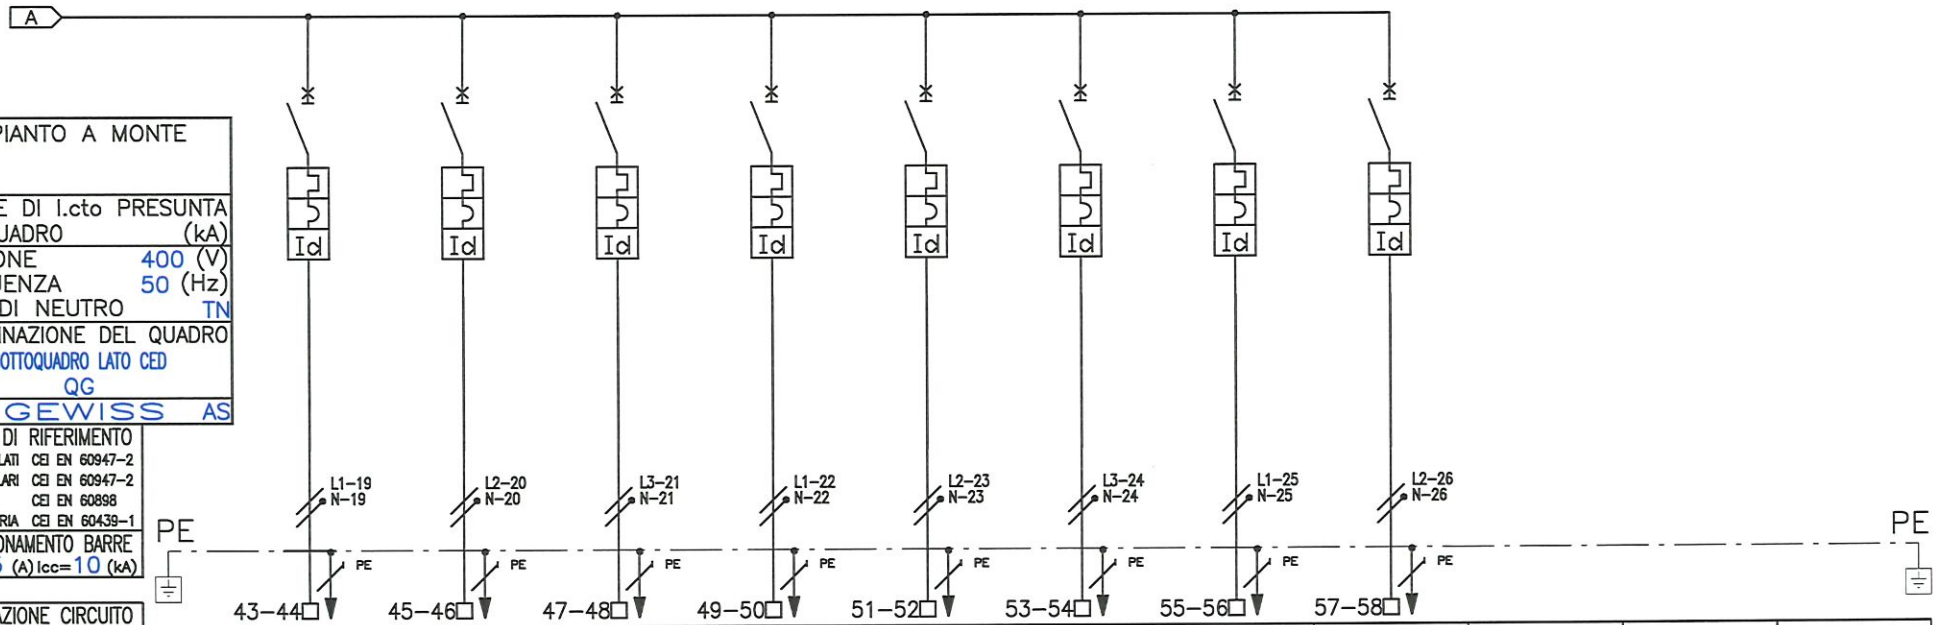

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	SOTTOQUADRO LATO CED QG
IP 43 GEWISS AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58			
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		TORRETTA F UFFICIO 18	TORRETTA G UFFICIO 18	PRESE SERVIZIO UFFICIO 18 + SALA RIUNIONI	LUCI ESTERNE LATO G.E	RIPOST. + PRESE CORRIDOIO	RISERVA	RISERVA	RISERVA			
INTERRUTTORE	TIPO	GW94007	GW94007	GW94007	GW94006	GW94006	GW94018	GW94007	GW94007			
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
	N. POLI x In (A)	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x10+N	1x10+N	1x20+N	1x16+N	1x16+N			
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C			
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	10	10	20	16	16			
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth			
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO			
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC			
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230	230	230	230			
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comeccabit - email@comeccabit

CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*


IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26 | PAG. 3 DI 5 | Ed. 0

Disegnatore : A.Z. | File: SLC.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL–2	Q26		Q27	Q28	Q29		Q30	Q31	Q32	Q33
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

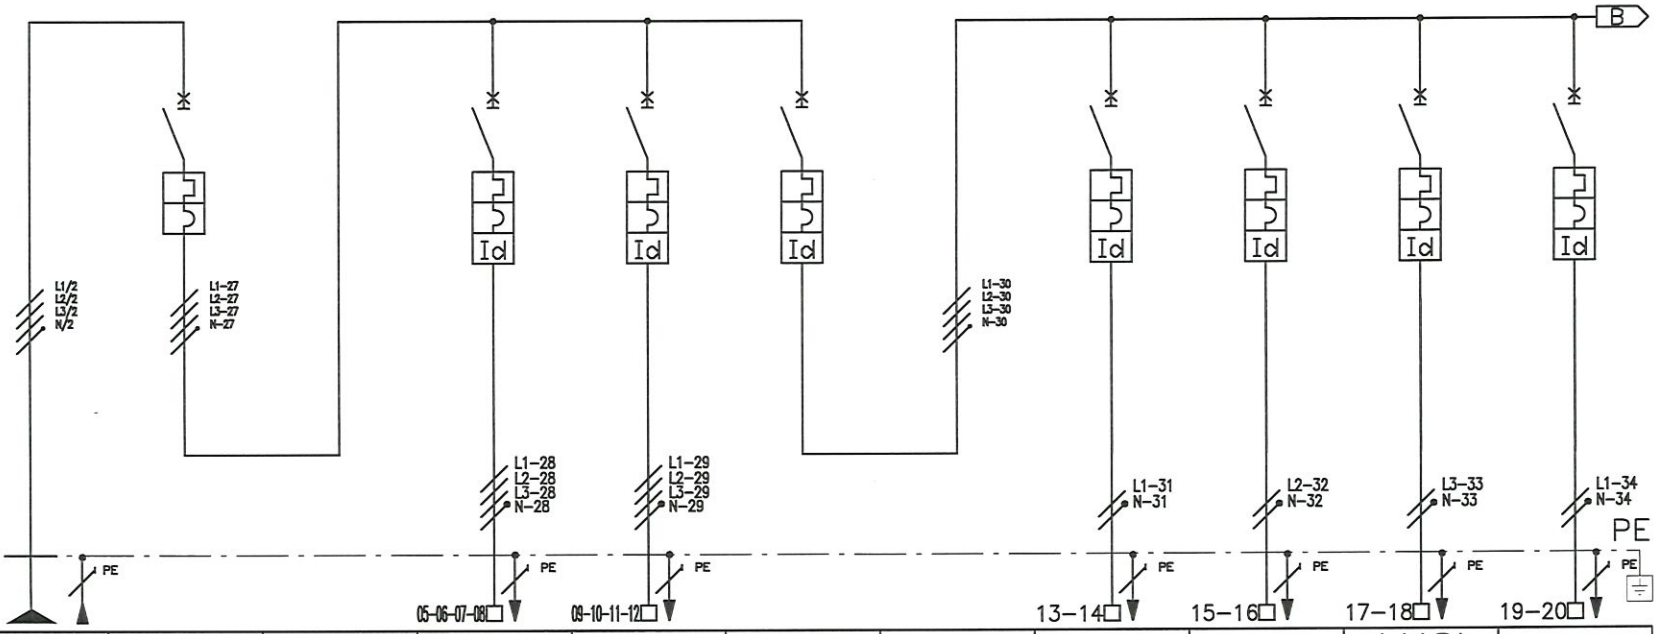

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	SOTTOQUADRO LATO CED QG
IP 43 GEWISS AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO LINEE PRIVILEGIATE	GEN. QUADRO LINEE PRIVILEGIATE		LINEA VERSO Q.E. SALA CED	LINEA VERSO Q.E. ILLUMINAZ. LATO DIREZIONE	LINEA VERSO Q.E. ILLUMINAZ. LATO CED		LUCI BAGNO 1	LUCI BAGNO 2	LUCI SALA RIUNIONE	LUCI UFFICIO 16
INTERRUTTORE	TIPO		GW92093		GW94180	GW94179	GW94179		GW94006	GW94006	GW94006	GW94006
	P.D.I. (kA)		6		6	6	6		4,5	4,5	4,5	4,5
	N. POLI x In (A)		4x63		4x32	4x25	4x25		1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N
	CURVA / SGANCIAT.		C		C	C	C		C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)		63		32	25	25		10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)		10Irth		10Irth	10Irth	10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)				0,3	0,3	0,3		0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)				ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO		ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE				AC	AC	AC		AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400			400	400			230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI			BOBINA A LANCIO CONTATTO AUSILIARE DI STATO									
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 – 081.5511774 – www.comecsrl.it – email:info@comecsrl.it


CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO – UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*

DATA 26/01/26	PAG. 4 DI 5	Ed. 0
Disegnatore : A.Z.	File: SLC.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q34	Q35	Q36	Q37							
NOME PROGETTO UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

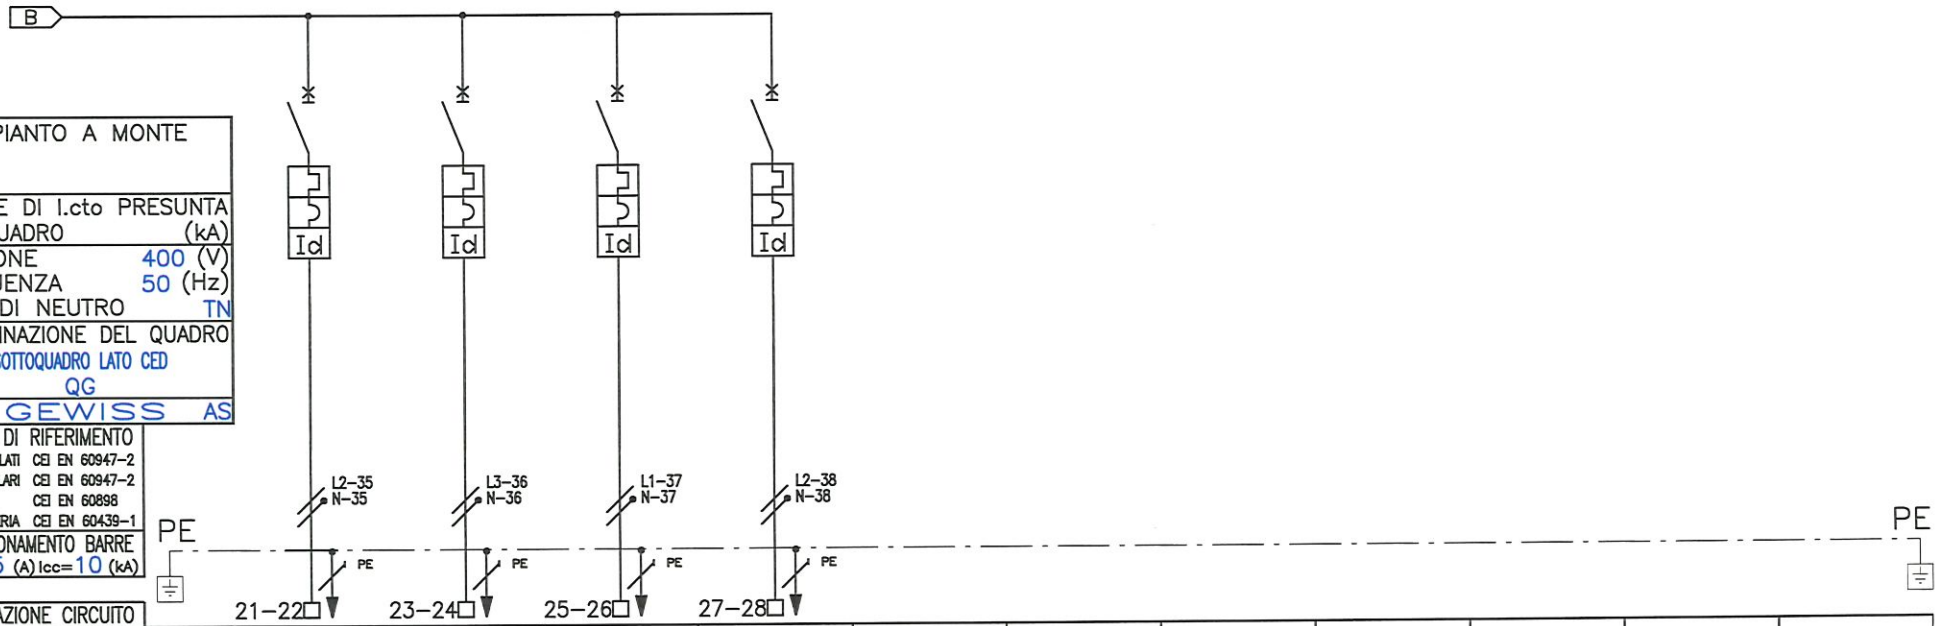

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN
DENOMINAZIONE DEL QUADRO SOTTOQUADRO LATO CED QG
IP 43 GEWISS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI UFFICIO 18	LUCI UFFICIO 17 + SALA CED	RISERVA	RISERVA							
INTERRUTTORE	TIPO	GW94006	GW94006	GW94006	GW94006							
	P.D.I. (kA)	4,5	4,5	4,5	4,5							
	N. POLI x In (A)	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N							
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C							
	SOGLIA Irth (A)	10	10	10	10							
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth							
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03							
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO							
	CLASSE	AC	AC	AC	AC							
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230							
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comecnaples.it - ewalin@comecnaples.it

CLIENTE : *AMENOPHIS S.R.L.*

IMPIANTO : *ELETTRICO - UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI*




DATA 26/01/26	PAG. 5 DI 5	Ed. 0
Disegnatore : A.Z.	File: SLC.DWG	



TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	BUONGIORNO
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :


Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 031/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.


Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
SLC.DWG	SLC.DWG	1	4	0

RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE Q1

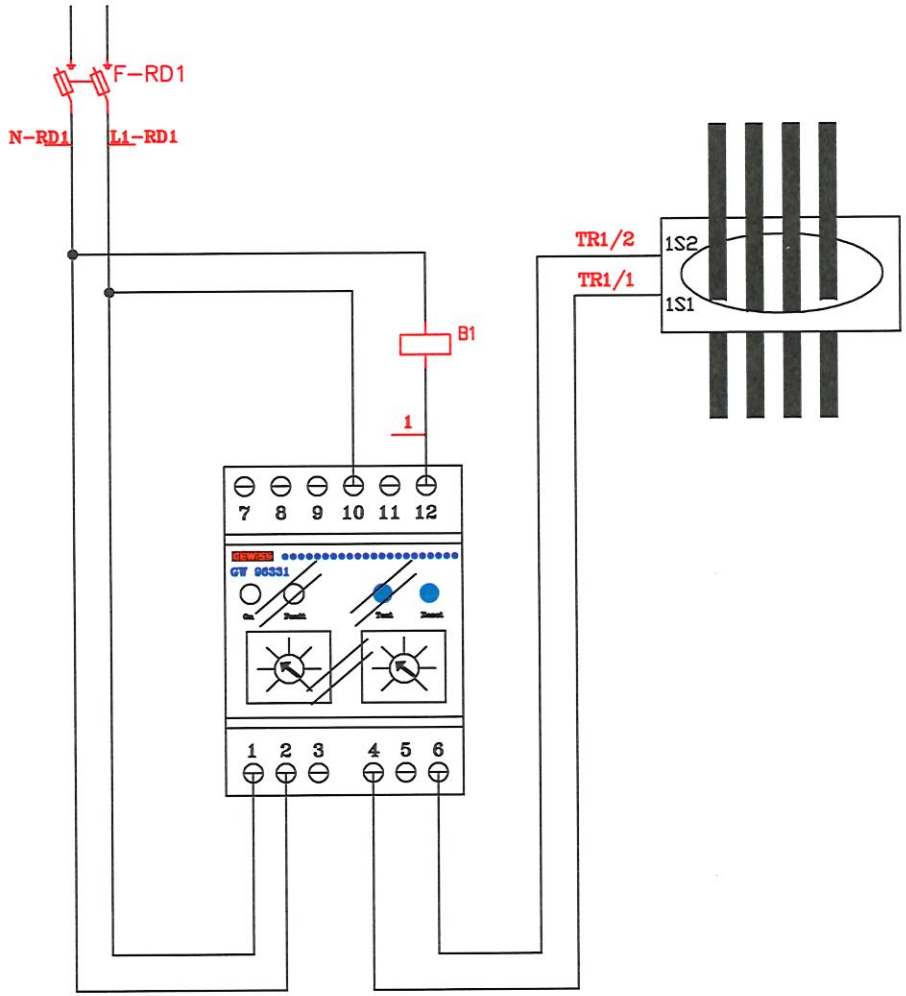

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. Visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED SCHEMA AUSILIARE	Matricola 031/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : SLC.DWG Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 4	Rev. 0


RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE Q2

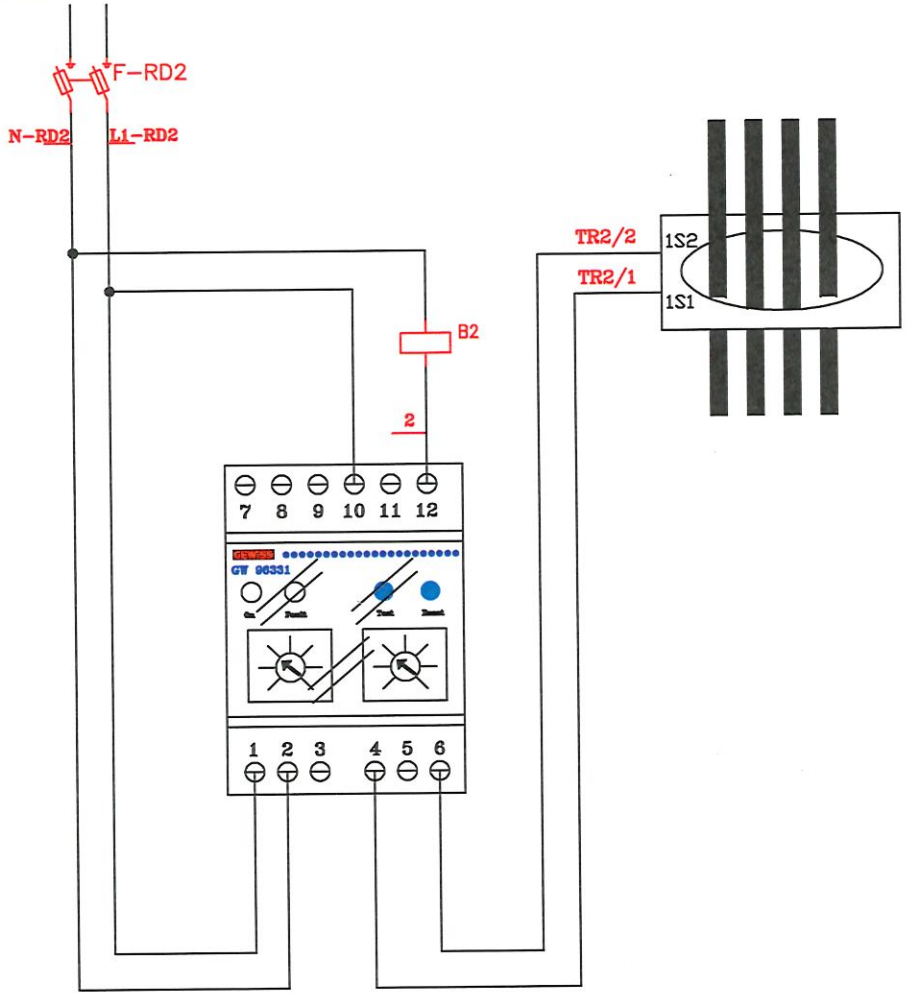

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED SCHEMA AUSILIARE	Matricola 031/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : SLC.DWG Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 3 Nr. Fogli 4	Rev. 0

CONTATTI AUSILIARI INTERRUTTORI

MORSETTIERA XA

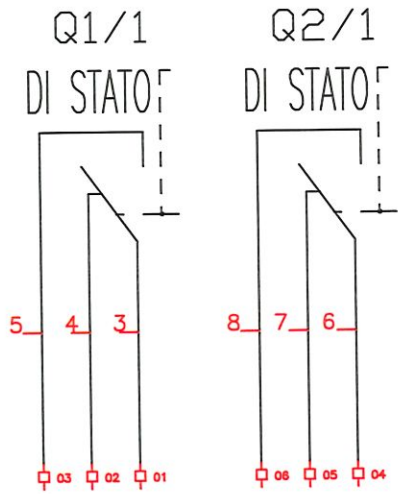

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED SCHEMA AUSILIARE	Matricola 031/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : SLC.DWG Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 4	Rev. 0

LEGENDA MORSETTIERA

X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
X2	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE LINEE PRIVILEGIATE
XA	MORSETTIERA PER CONTATTI AUSILIARI

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data 29/01/26
Disegn. A.Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :

Descrizione:
SOTTOQUADRO LATO CED
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 031/26
Cliente AMENOPHIS S.R.L.
Nome File : SLC.DWG
Percorso File : SLC.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 7
Rev. 0

MORSETTIERA X1

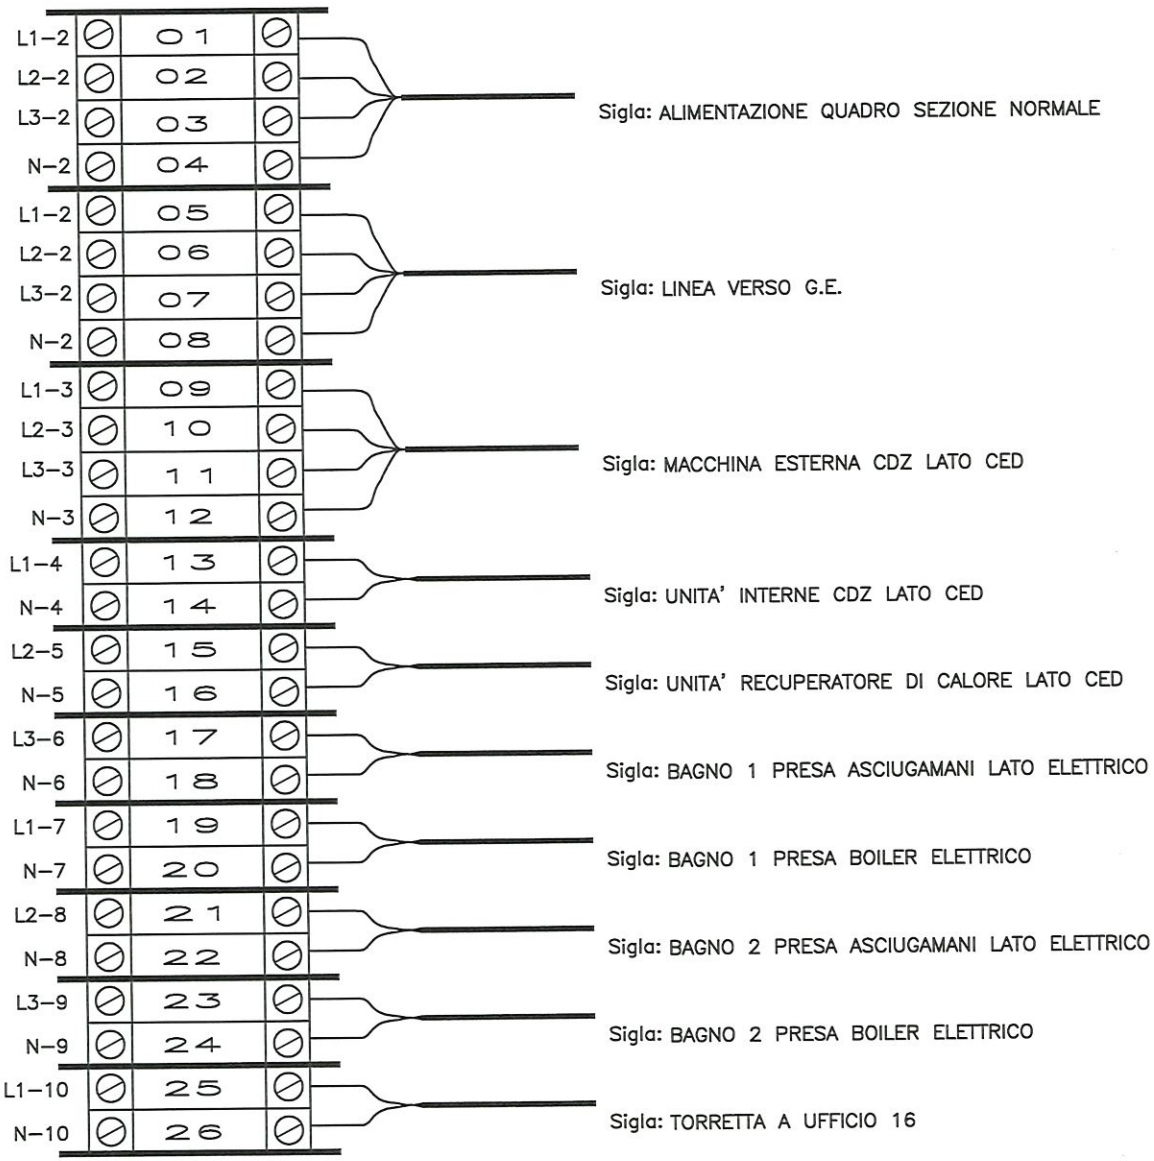

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE NORMALE

Sigla: LINEA VERSO G.E.

Sigla: MACCHINA ESTERNA CDZ LATO CED

Sigla: UNITA' INTERNE CDZ LATO CED

Sigla: UNITA' RECUPERATORE DI CALORE LATO CED

Sigla: BAGNO 1 PRESA ASCIUGAMANI LATO ELETTRICO

Sigla: BAGNO 1 PRESA BOILER ELETTRICO

Sigla: BAGNO 2 PRESA ASCIUGAMANI LATO ELETTRICO

Sigla: BAGNO 2 PRESA BOILER ELETTRICO


Sigla: TORRETTA A UFFICIO 16

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 031/26				
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	SOTTOQUADRO LATO CED	Cliente AMENOPHIS S.R.L.				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : SLC.DWG	Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 7	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1

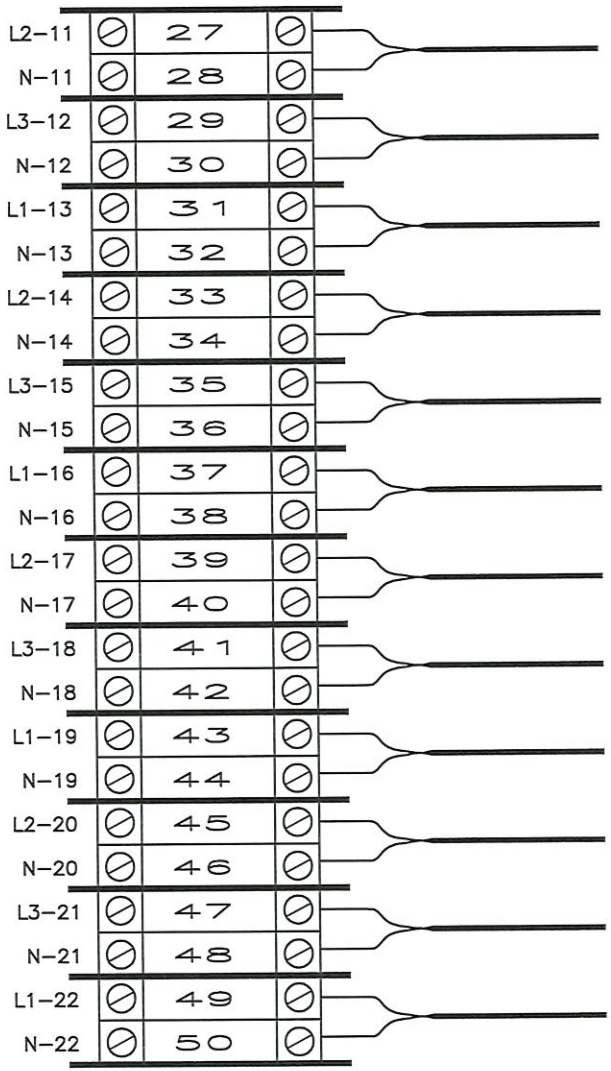

Sigla: TORRETTA B UFFICIO 16

Sigla: PRESE SERVIZIO UFFICIO 16 + 17

Sigla: POSTAZ. A PARETE UFFICIO 17

Sigla: TORRETTA A UFFICIO 18

Sigla: TORRETTA B UFFICIO 18

Sigla: TORRETTA C UFFICIO 18

Sigla: TORRETTA D UFFICIO 18

Sigla: TORRETTA E UFFICIO 18

Sigla: TORRETTA F UFFICIO 18

Sigla: TORRETTA G UFFICIO 18

Sigla: PRESE SERVIZIO UFFICIO 18 + SALA RIUNIONI


Sigla: LUCI ESTERNE LATO G.E

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	031/26			
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	SOTTOQUADRO LATO CED	Cliente	AMENOPHIS S.R.L.			
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : SLC.DWG	Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 7	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1

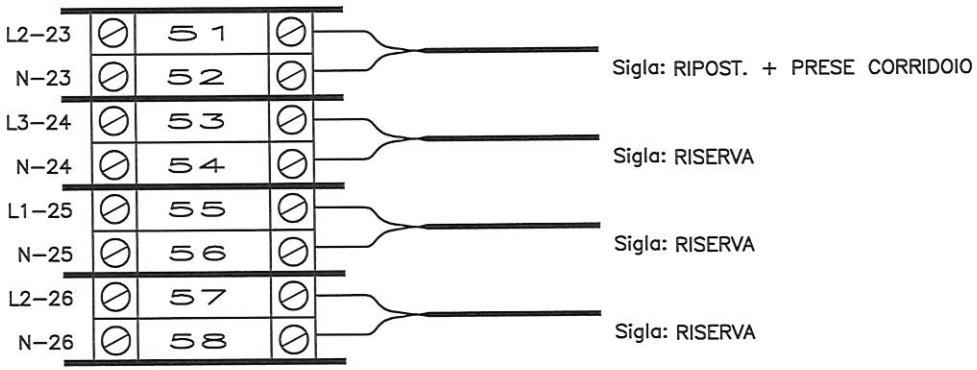

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI

Note :

Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 031/26

Cliente AMENOPHIS S.R.L.

Nome File : SLC.DWG


Percorso File : SLC.DWG

Nr. Foglio 4

Nr. Fogli 7

Rev. 0

MORSETTIERA X2

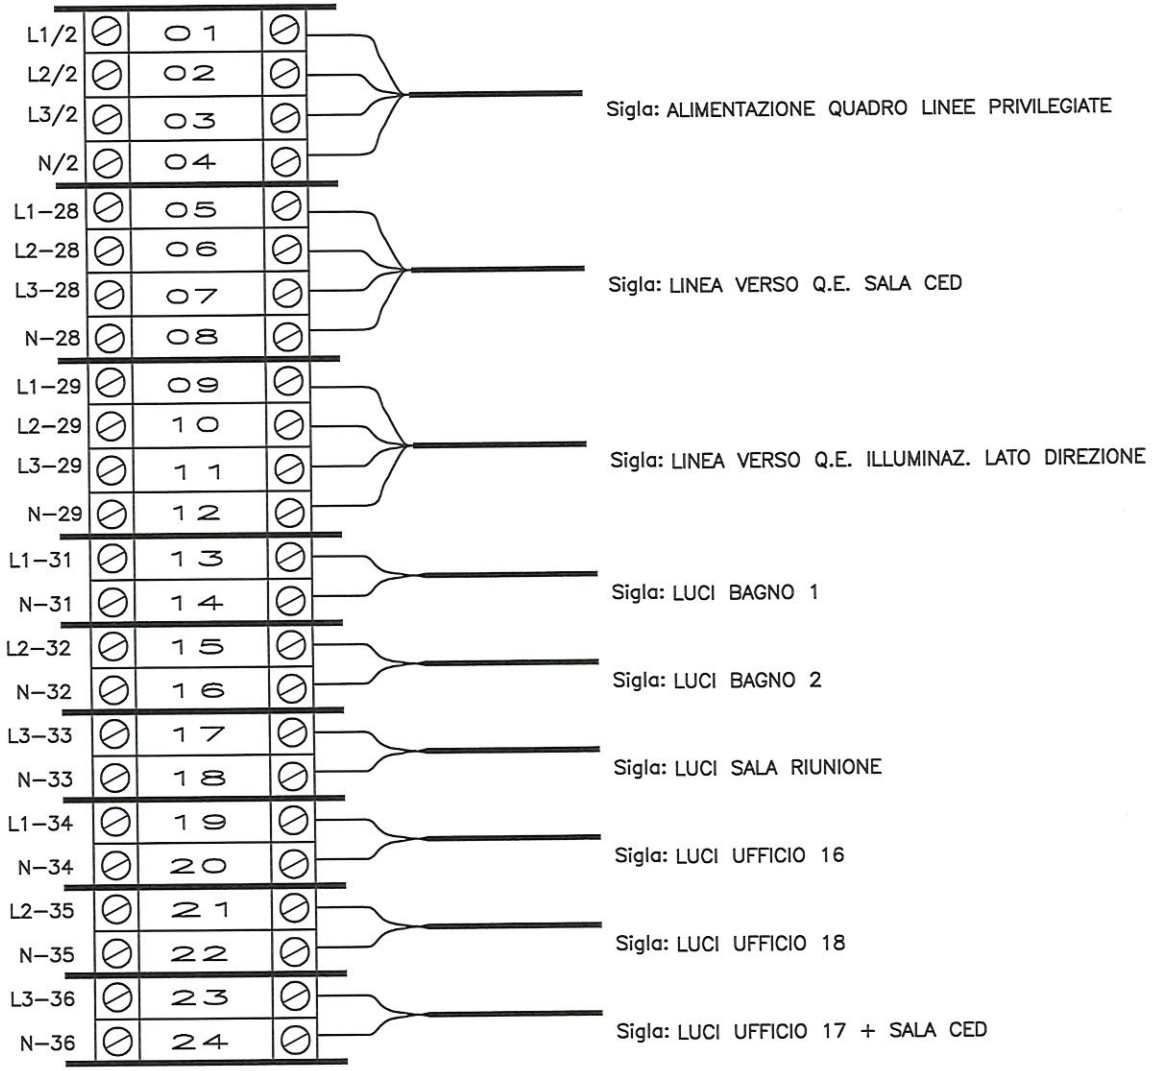


MORSETTIERA X2

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data 29/01/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 031/26				
Disegn. A.Z.	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI	SOTTOQUADRO LATO CED	Cliente AMENOPHIS S.R.L.				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : SLC.DWG	Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 7	Rev. 0
visto							


MORSETTIERA X2



MORSETTIERA X2

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 081.8511774	Data 29/01/26 Disegn. A.Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI Note :	Descrizione: SOTTOQUADRO LATO CED SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 031/26 Cliente AMENOPHIS S.R.L. Nome File : SLC.DWG Percorso File : SLC.DWG	Nr. Foglio 6 Nr. Fogli 7 Rev. 0

MORSETTIERA XA

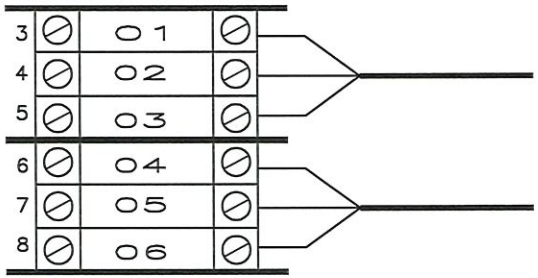

Sigla: CONTATTO AUSILIARE DI STATO – INTERRUTTORE Q1

Sigla: CONTATTO AUSILIARE DI STATO – INTERRUTTORE Q2

MORSETTIERA XA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 081.8511774

Data	29/01/26
Disegn.	A.Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	UFFICI CASALNUOVO DI NAPOLI
Note :	
Descrizione:	SOTTOQUADRO LATO CED SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	031/26
Cliente	AMENOPHIS S.R.L.
Nome File :	SLC.DWG
Percorso File :	SLC.DWG
Nr. Foglio	7
Nr. Fogli	7
Rev.	0
