COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO CDZ PT_ZONA SUD QE08



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DI TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DI POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 20 / 07 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**Megawatt S.p.A.** **Via Circumvallazione Esterna,42 – 80025 Casoria (na)**

Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico CDZ PT Zona Sud**

Locazione del quadro:	**Interporto Campano S.p.A.** **Modulo Nr. 6-7-8-9 Lotto C** **GMM Farma** **Comune di Nola (Na)**

Quadro:	**QE08**

Identificazione del quadro:	**200 / 26**

Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	250 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	15KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	22.5KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	7.8KA

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	31
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	28
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	1156x2100x655 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	PrismaSet P Schneider-electric S.p:A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9001
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Schneider-electric S.p.A.** serie **PrismaSet P** in lamiera di acciaio trattamento di cataforesi + polvere epossi-poliestere polimerizzata a caldo;

- Trattamento elettroforesi + polveri epossidiche poliestere polimerizzata
- Colore bianco RAL9001
- Tenuta meccanica IK10
- Corrente di tenuta nominale di picco Ipk=220KA

Green Premium

Questa offerta Green Premium vi aiuterà a ridurre i costi e le emissioni di gas serra grazie a un imballaggio più sostenibile realizzato interamente in cartone e senza l'uso di plastica. Eseguire la scansione del codice QR per accedere a tutti i fogli di istruzioni.

Prevenzione degli incendi elettrici

Per prevenire gli incendi di natura elettrica è necessario utilizzare prodotti in grado di comunicare tempestivamente, infatti è proprio la comunicazione la chiave per una prevenzione efficace. Scopri i prodotti Schneider Electric dedicati alla prevenzione verso gli incendi di natura elettrica.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

PROCEDURA DI COLLAUDO

SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA
CEI 17-113/1/2
(EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc** Tensione di prova c.a. (valore efficace)
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO ELETTRICO CDZ PT_ZONA SUD - QE08

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
LVS08760	2 pannelli lat. IP30 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08721	2 chiusure later zoccol P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	SCHNEIDER
LVS03220	Otturatore M9 L1000	2	SCHNEIDER
LVS04512	Barra preforata PE 25X5	1	SCHNEIDER
LVS04657	3 Supporti PE Verticale	1	SCHNEIDER
LVS03402	Guida app. modul regolabile PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS04226	2 Guide modulari L1600mm	1	SCHNEIDER
LVS08603	Struttura L300 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08640	Green Bar L300mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08633	Tetto IP30 L300 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08513	Porta piena IP30 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08733	Pannello fondo IP30 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08723	Zoccolo H100 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08608	Struttura L800 P600	1	SCHNEIDER
LEEB3636N	Kit 36 moduli PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08921	20 viti+Dadi/Struttura	1	SCHNEIDER
LVS08643	Green Bar L800mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08638	Tetto IP30 L800 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08538	Porta trasp. IP30 L800 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08738	Pannello fondo IP30 L800 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08728	Zoccolo H100 L800 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08700	4 anelli di sollevamento PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08711	Kit guarnizioni IP31 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	5	SCHNEIDER
LVS03216	Piastra frontale modulare 3M L850	1	SCHNEIDER
LVS03030	Piastra di fondo NS-INS250 H fisso/dir	1	SCHNEIDER
LVS03294	Piastra front. NSX160/250 fix dir L900	1	SCHNEIDER
LVS03856	Piastra frontale piena 6M L850	1	SCHNEIDER
LVS03007	Guida app. modulare regolabile L850	1	SCHNEIDER
LVS03218	Piastra frontale modulare 5M L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	4	SCHNEIDER
LVS03851	Piastra frontale piena 1M L850	2	SCHNEIDER
LGY4230	Piast supporto connet Rj45 Femmina	1	SCHNEIDER
LVS04053	Morsettiera di distribuzione 250A 4P	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	2	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
A9L20600	iPRD20 3P+N 5kA estr. T2	1	SCHNEIDER
A9F79425	iC60N 4P C 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	4	SCHNEIDER
A9XMFA04	Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink	3	SCHNEIDER
A9F79216	iC60N 2P C 16A 6000A	10	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	30	SCHNEIDER

A9F89416	iC60H 4P C 16A 10000A	5	SCHNEIDER
A9F89420	iC60H 4P C 20A 10000A	3	SCHNEIDER
A9F64210	iC60a 2P C 10A 4500A	6	SCHNEIDER
A9Q51225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo A	8	SCHNEIDER
A9F89316	iC60H 3P C 16A 10000A	4	SCHNEIDER
A9F89425	iC60H 4P C 25A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9Q51425	QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9F79210	iC60N 2P C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A15303	iPC 2P+T 16A 250Vca italiana	1	SCHNEIDER
A9XC2412	Conf. 12 connettori Ti24 a 5 pin	5	SCHNEIDER
A9MEM3255	iEM3255 3P+N ins.TA, modbus MID	1	SCHNEIDER
METSECT5MB025	TA 250/5 D.26 - sbar 12x40 15x32mm	3	SCHNEIDER
PAS600L	EPS Universal B-Pas 24VDC 2DI	1	SCHNEIDER
A9XMSB11	Smartlink SI B - Modbus Slave RS485	4	SCHNEIDER
A9MEM1580	PowerTag wirel. F160A 3P 3PN	1	SCHNEIDER
A9MEM1560	PowerTag wirel. F63A 1PN monte valle	9	SCHNEIDER
A9MEM1570	PowerTag wirel. F63A 3PN monte valle	7	SCHNEIDER
A9MEM1540	Sens. wirel. PowerTag M63A 3P monte	4	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	1	SCHNEIDER
C254250S	NSX250NA 4P_T	1	SCHNEIDER
LV429518	1 coprimorsetti lungo 4P NSX100/250	2	SCHNEIDER
C11E34V100L	NSXm 16kA Vigi 100A 3P EverLink_T	1	SCHNEIDER
LV426950	Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP-B	2	SCHNEIDER
ACTPC6ASFLS30WE	PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 3m Bia.	1	SCHNEIDER
VW3A8306DRC	TERMINALE RC MODBUS CON VITI	1	SCHNEIDER

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**200**
Date of document: *Data del documento:*	**20/07/2026**

Customer/*Cliente*:	**Megawatt S.p.A.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**PrismaSet P / Schneider-electric S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**20/07/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**063 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**200/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**QE08**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	250	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	10	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	15	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	200/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	200/26 QE08
Schematic dwg. *Schema funzionale*	200/26 QE08
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	200/26 QE08

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function**
Prove di funzionamento elettrico — CEI EN 61439-2 par. 11.10 — Satisfactory / *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE:

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

DATI DI TARGA DEL QUADRO

DENOMINAZIONE	QUADRO ELETTRICO CDZ PT_ZONA SUD
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	250A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	16
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	31
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	1156x2100x665
MATRICOLA	200/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	


COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD DATI DI TARGA

Matricola 200/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE08.DWG
Percorso File : QE08.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

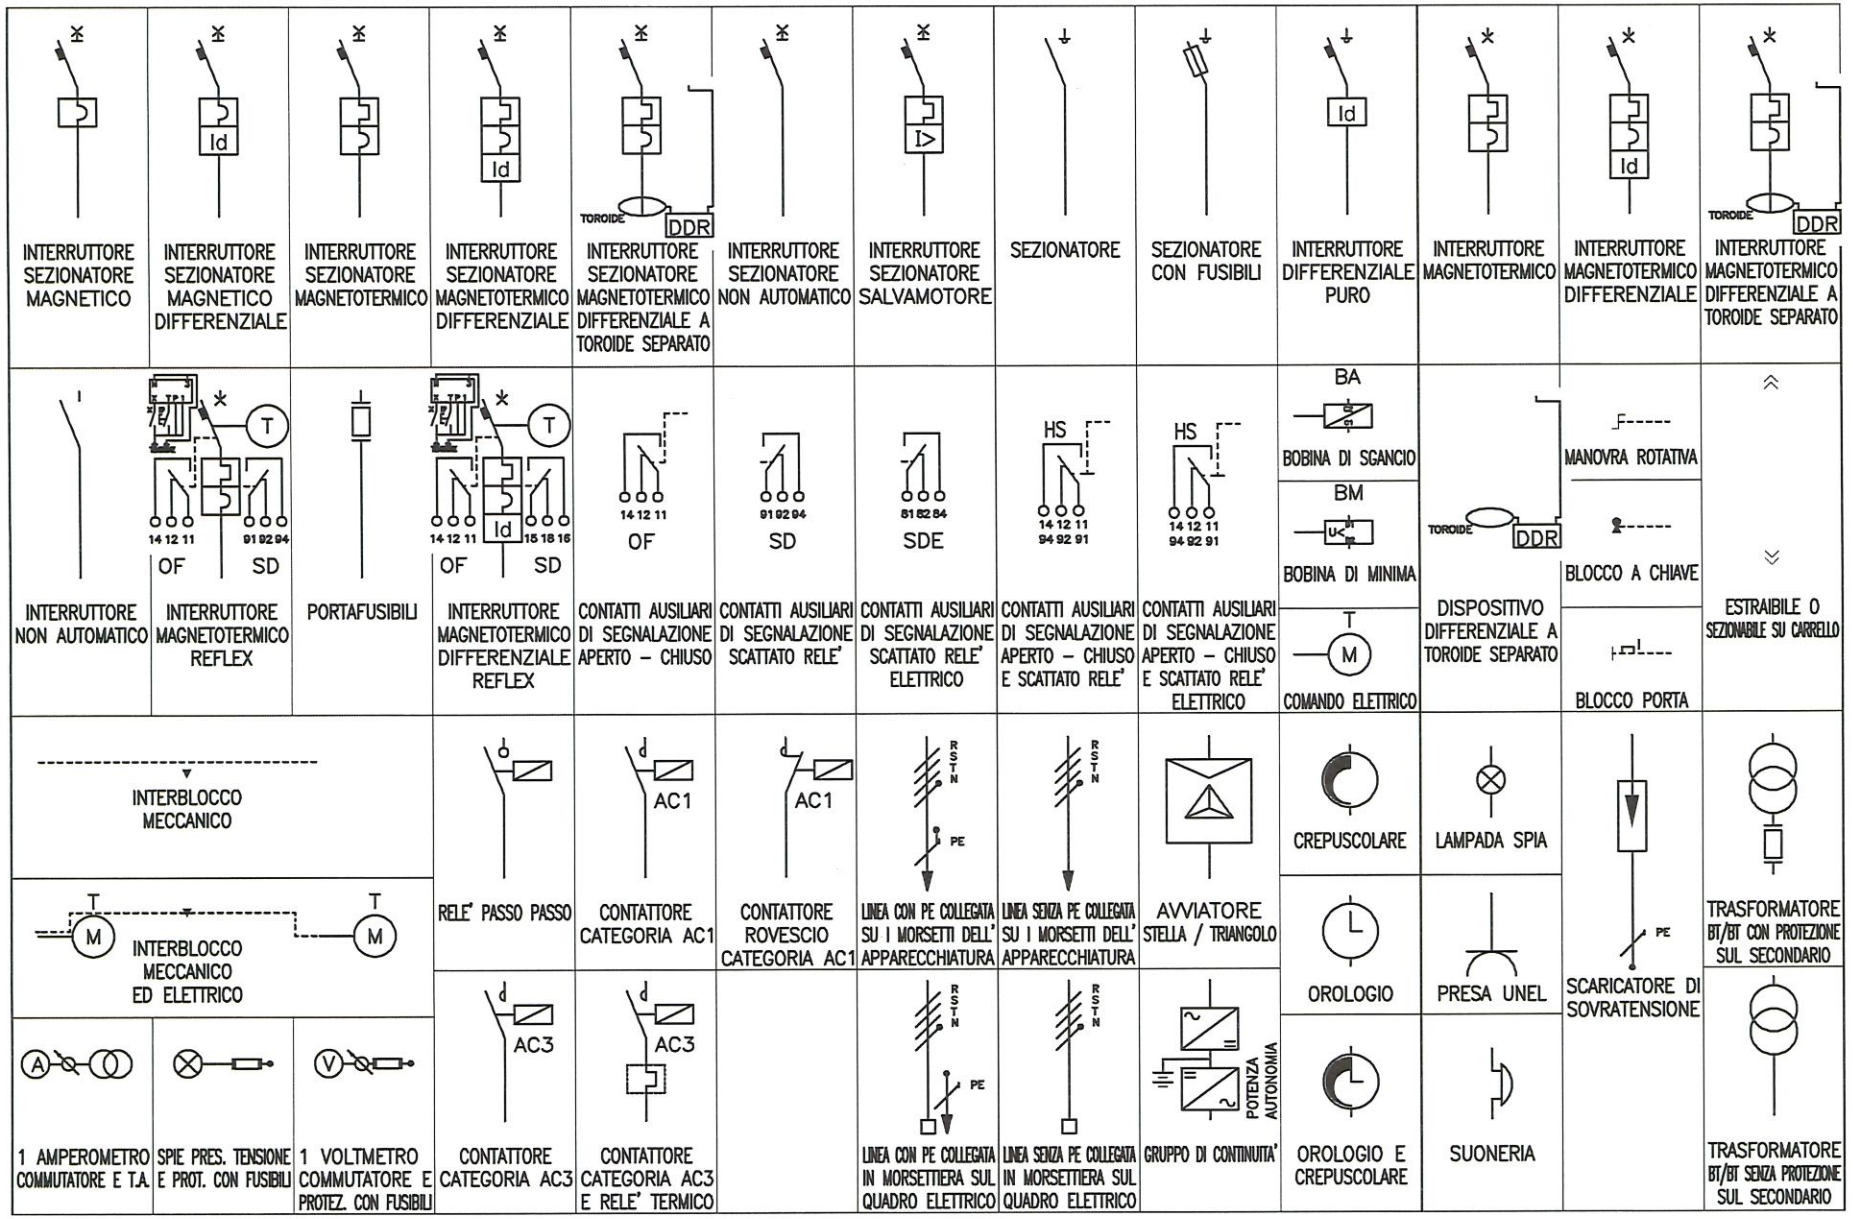

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione:
Q.E. CDZ PT_ZONA SUD
LEGENDA
QUADRO

Matricola 200/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File : QE08.DWG
Percorso File : QE08.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

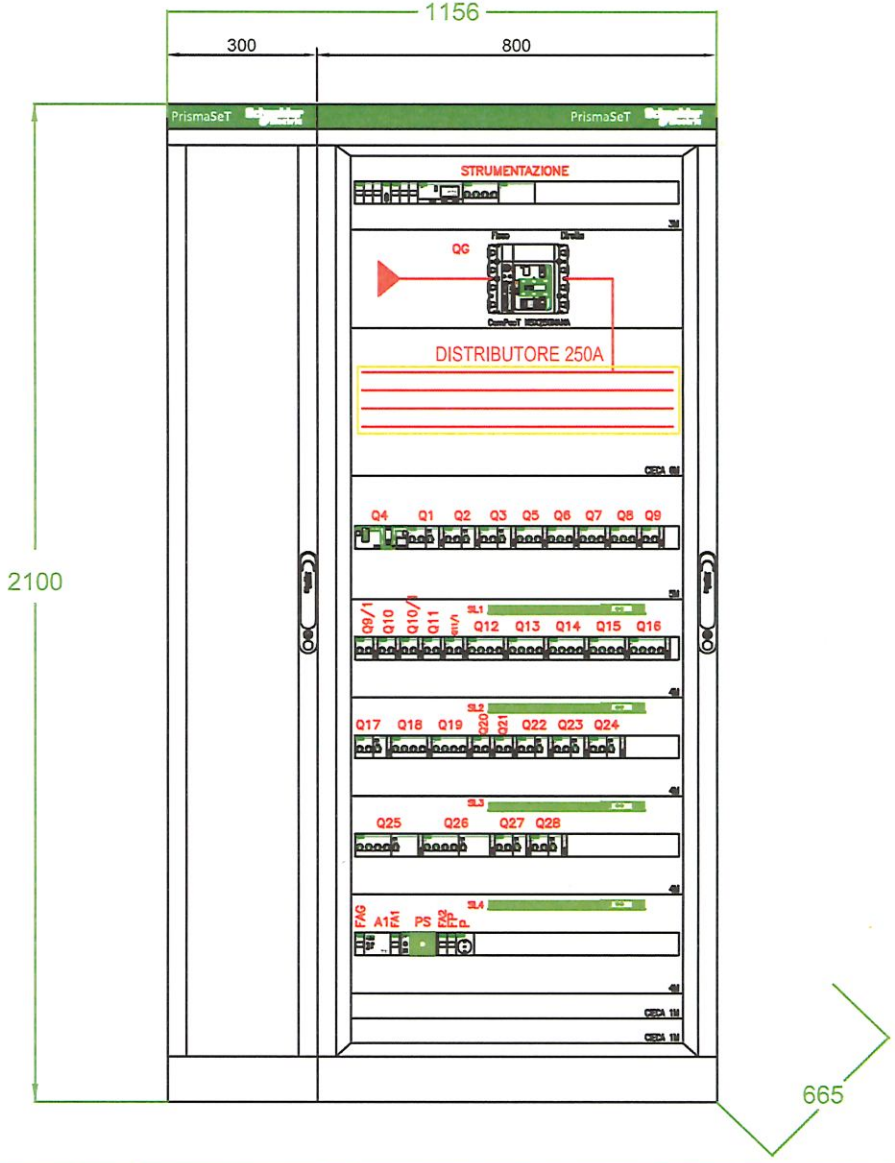

QUADRO ELETTRICO CDZ PT_ZONA SUD

BRAND	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.
TIPO	PRISMA SET P
GRADO DI PROTEZIONE	IP31
DIMENSIONE BxHxP (mm)	1156x2100x665mm

COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.


Note :

Descrizione:
Q.E. CDZ PT_ZONA SUD
FRONTE QUADRO

Matricola 200/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File : QE08.DWG
Percorso File : QE08.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		FP	FM	QS	Q1		Q2	Q3	Q4
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

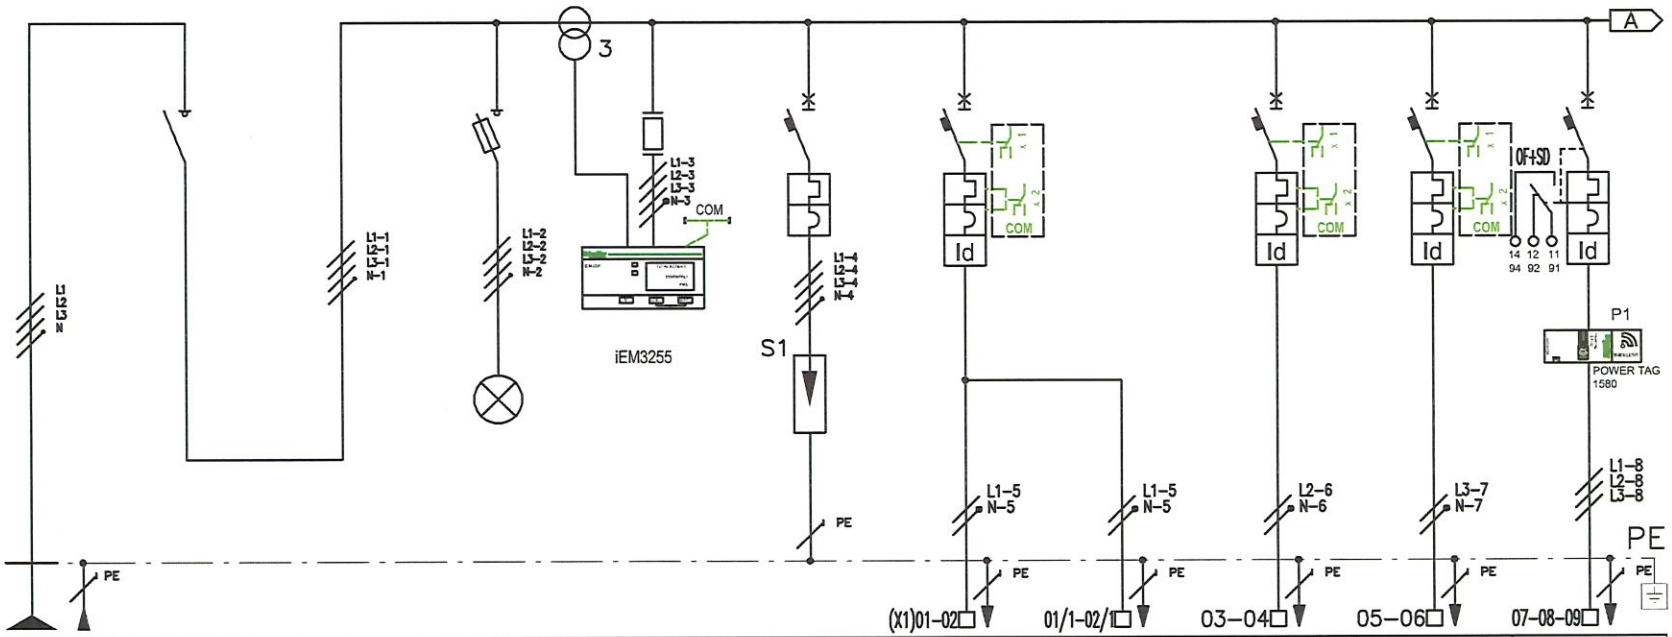

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 7.8 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO CDZ ZONA SUD – QE08
IP 31 SCHNEIDER–ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947–2
INT. MODULARI CEI EN 60947–2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 250 (A) Icc=15 (kA)


NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	ALIMENTAZIONE QUADRO	INTERRUTTORE GENERALE		PROTEZIONE PRESENZA RETE	PROTEZIONE STRUMENTO DI MISURA	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	QE.08.L1 LUCE LOCALE TECNICO	ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE TECNICO	RISERVA	QE.08.F1 LUCE LOCALE TECNICO	QE.08.01 "UVO1"
INTERRUTTORE	TIPO		NSX250NA		STI_10,3x38		iC60N	iC60a+Vigi		iC60a+Vigi	iC60a+Vigi	NSXmE+Vigi
	P.D.I. (kA)						10	10		10	10	16
	N. POLI x In (A)		4x250				4x25	2x10		2x10	2x10	3x100
	CURVA / SGANCIAT.						C	C		C	C	Mlogic4.1 Vigi
	SOGLIA Irth (A)						25	10		10	10	0,4–1Irth
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth		10Irth	10Irth	1,5–10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)							0.03		0.03	0.03	0,03–5
	RITARDO (ms)							ISTANTANEO		ISTANTANEO	ISTANTANEO	0–1000ms
	CLASSE							A		A	A	A / AC
CONTATTORE O RELE' PASSO–PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				3x2+N	3x1 + N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iEM3255	iQuick PRD20r 3P+N 5kA T2					
CONDUTTORE	TIPO	FG16M16–0,6/1KV				FS17		FG16OM16–0,6/1kV	FG16OM16	FG16OM16–0,6/1kV	FG16OM16–0,6/1kV	FG16OM16–0,6/1kV
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x120+PE				4x2,5		2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x4+PE	3x25+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	140						20	100	20	20	15
	Ib (A) Iz (A)	120						1	0.2	0,2	4,8	64
	Un (V) Pn (kW)	400	75					230 0,2	230 0.05	230 0,05	230 1	400 40
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI								CONTATTO COM		CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO DI STATO OF CONTATTO SD
NOTE						T.A. – 250/5A						POWER TAG

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Palasciano n. 19 - 081.5511774 - www.comecosrl.it - email:info@comecosrl.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)
IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 1 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE08.DWG

TAVOLA

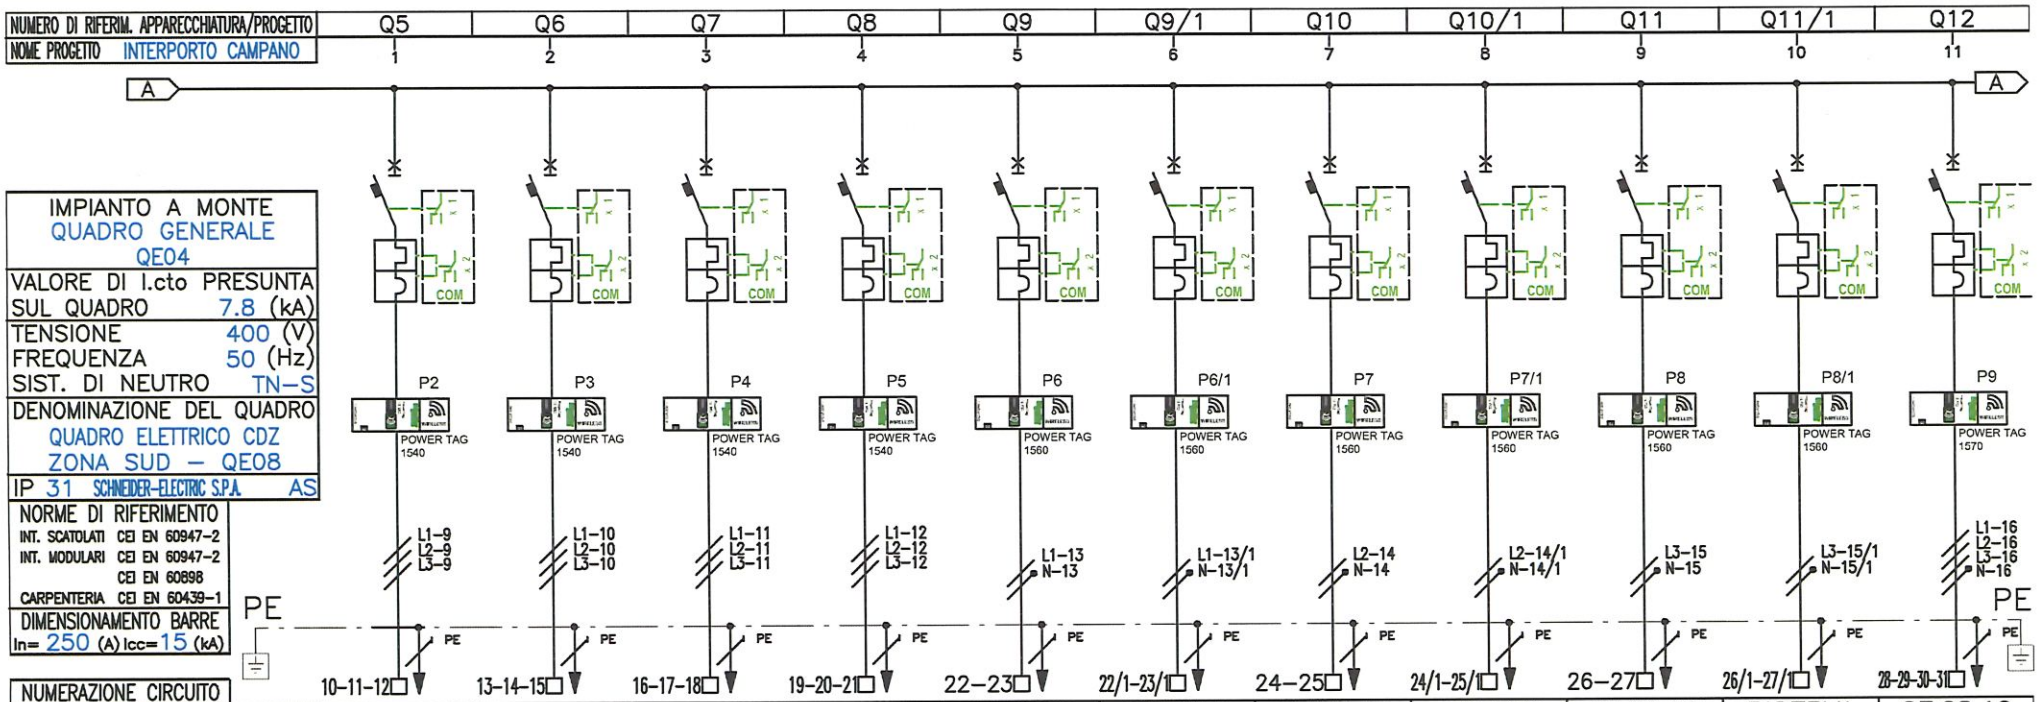


NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		QE.08.02 UTA"PRODUZIONE" VENTILATORE 1	QE.08.03 UTA"PRODUZIONE" VENTILATORE 1	QE.08.04 UTA"PRODUZIONE" VENTILATORE 2	QE.08.05 UTA"PRODUZIONE" VENTILATORE 2	QE.08.06 "RC2" VENTILATORE 1	RISERVA	QE.08.08 "RC3" VENTILATORE 1	RISERVA	QE.08.10 "RC1" VENTILATORE 1	RISERVA	QE.08.12 TE.02 TERMOVENTILANTE
INTERRUTTORE	TIPO	IC60H	IC60H	IC60H	IC60H	IC60N	IC60N	IC60N	IC60N	IC60N	IC60N	IC60H
	P.D.I. (kA)	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	15
	N. POLI x In (A)	3x16	3x16	3x16	3x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	4x16
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV	FG16OM16-0,6/1kV
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	3x4+PE	3x4+PE	3x4+PE	3x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	4x6+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	80
	Ib (A) Iz (A)	3	3	3	3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,6
	Un (V) Pn (kW)	400 1,9	400 1,9	400 1,9	400 1,9	230 0,4	230 0,4	230 0,4	230 0,4	230 0,4	230 0,4	400 1,6
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Palisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - email:info@comecsrl.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)
IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 2 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE08.DWG

TAVOLA

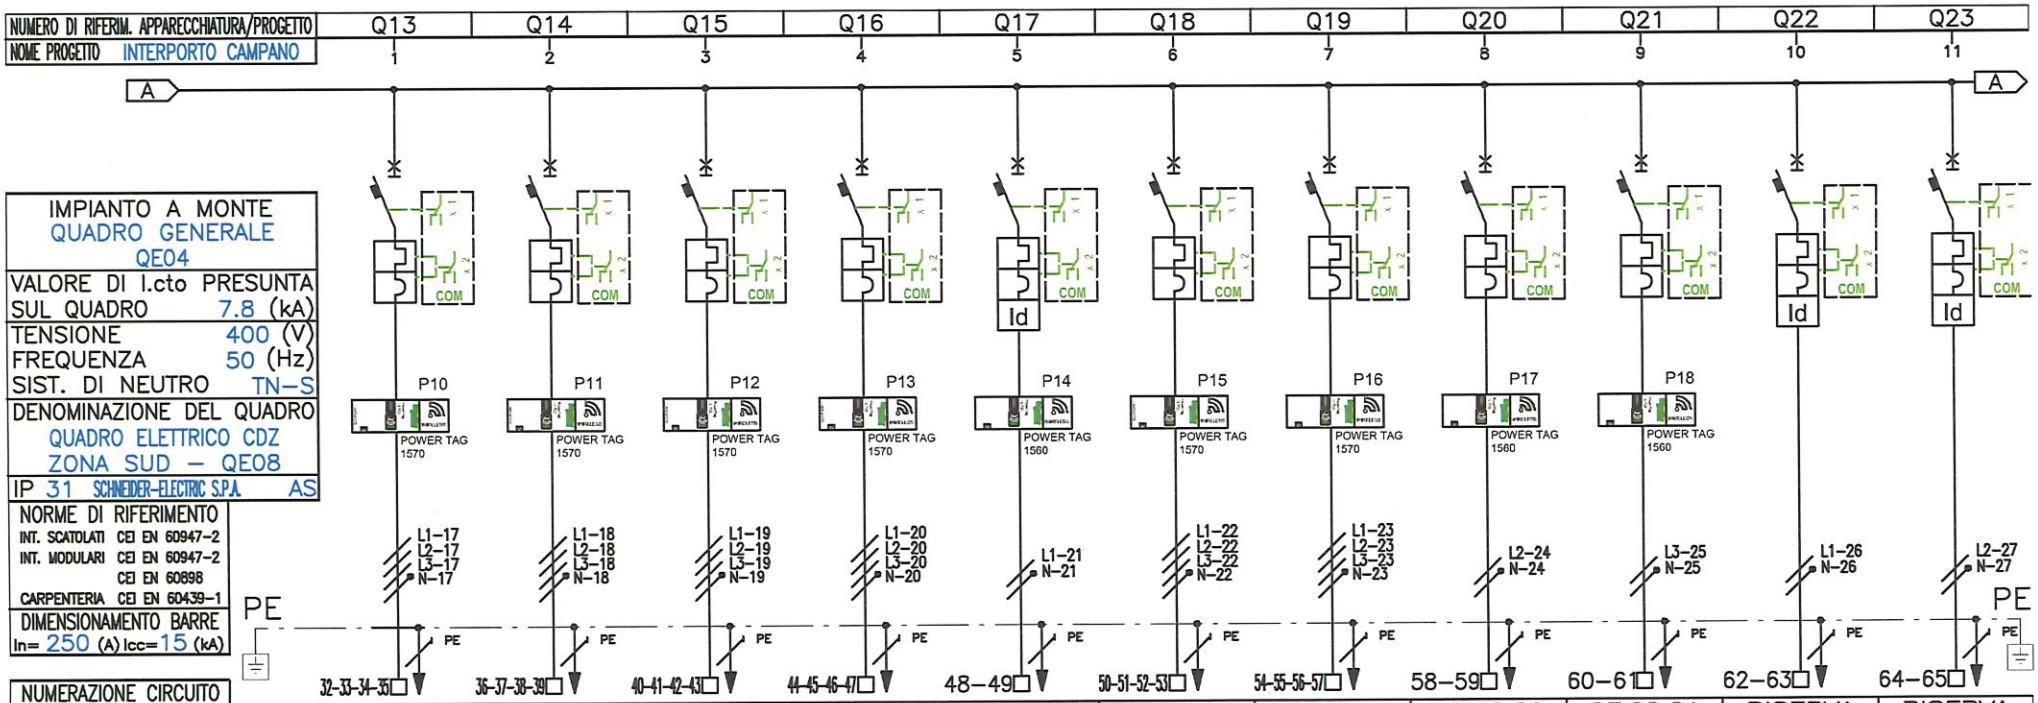

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		QE.08.13 TE.02 TERMOVENTILANTE	QE.08.14 TE.02 TERMOVENTILANTE	QE.08.15 TE.02 TERMOVENTILANTE	QE.08.16 TE.02 TERMOVENTILANTE	QE.08.17 "SC1"	QE.08.18 "UE.01" UNITÀ ESTERNA	QE.08.19 "UE.02" UNITÀ ESTERNA	QE.08.20 "UI" 7,9,10 PT ALIM. DA U.E.02	QE.08.21 "UI" 1-6,9,11 PT ALIM. DA U.E.01	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO	IC60H	IC60H	IC60H	IC60H	iC60N+Vigi	IC60H10	IC60H10	IC60N	IC60N	iC60a+Vigi	iC60a+Vigi
	P.D.I. (kA)	15	15	15	15	20	15	15	20	20	10	10
	N. POLI x In (A)	4x16	4x16	4x16	4x16	2x16	4x20	4x20	2x16	2x16	2x10	2x10
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	20	20	16	16	10	10
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)					0,03					0.03	0.03
	RITARDO (ms)					ISTANTANEO					ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE					A					A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV	FG160M16-0,6/1kV		
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x6+PE	4x6+PE	4x6+PE	4x6+PE	2x4+PE	4x16+PE	4x16+PE	2x4+PE	2x4+PE		
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	70	60	20	20	20	60	60	20	20		
	Ib (A) Iz (A)	2,6	2,6	2,6	2,6	1,9	11,5	7,2	1,9	1,9		
	Un (V) Pn (kW)	400 1,6	400 1,6	400 1,6	400 1,6	230 0,4	400 7,2	400 4,5	230 0,4	230 0,4	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Palisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccasrl.it - email:info@comeccasrl.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 3 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE08.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28						
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

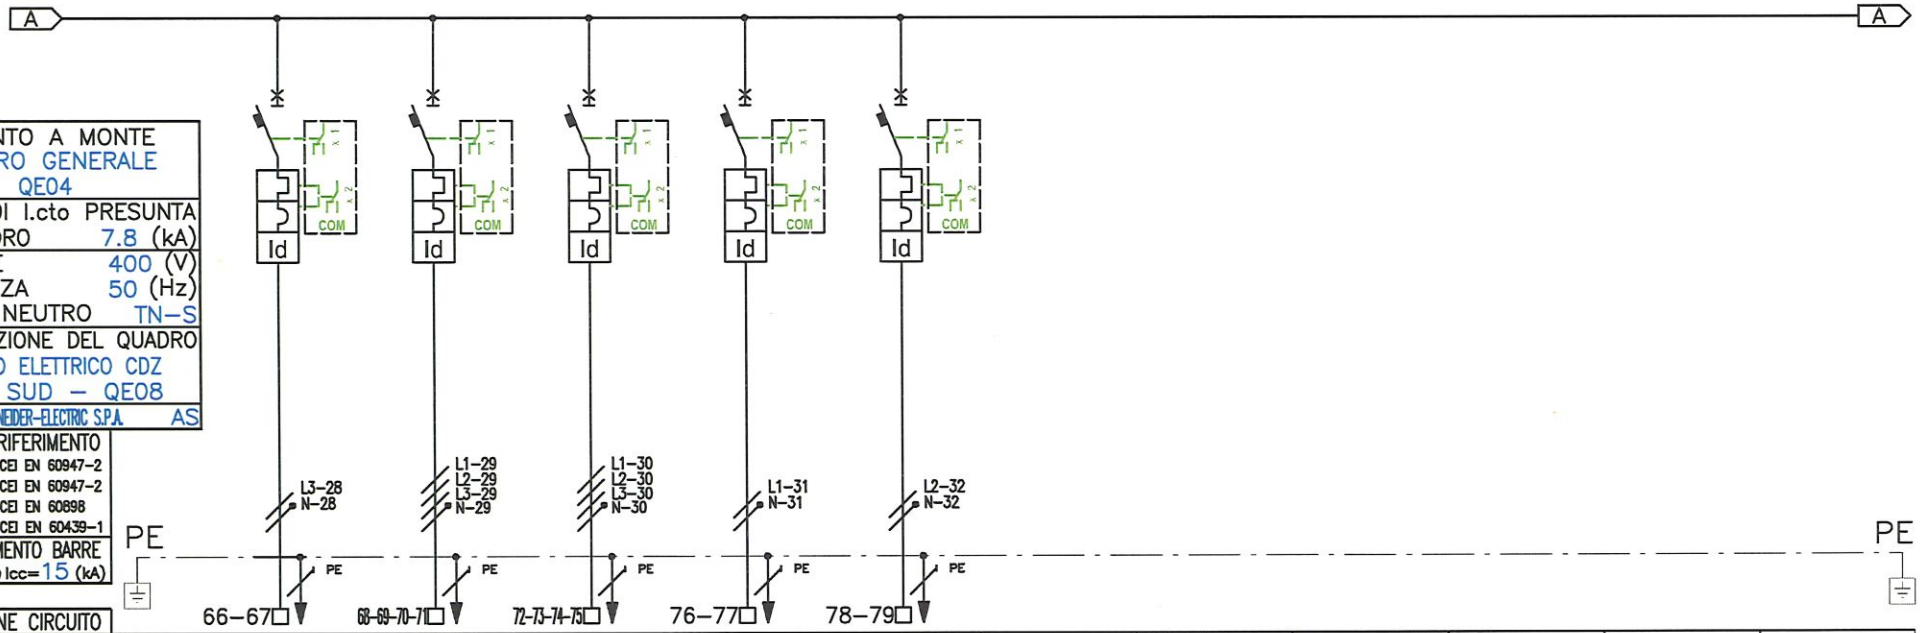


IMPIANTO A MONTE	QUADRO GENERALE QE04										
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	7.8 (kA)										
TENSIONE	400 (V)										
FREQUENZA	50 (Hz)										
SIST. DI NEUTRO	TN–S										
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO CDZ ZONA SUD – QE08										
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS										
NORME DI RIFERIMENTO	INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2										
	INT. MODULARI CEI EN 60947-2 CEI EN 60898										
	CARPENTERIA CEI EN 60439-1										
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)										
NUMERAZIONE CIRCUITO		66–67	68–69–70–71	72–73–74–75	76–77	78–79					
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		31 SISTEMA BMS	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA					
INTERRUTTORE	TIPO	iC60a+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi					
	P.D.I. (kA)	10	15	15	20	20					
	N. POLI x In (A)	2x10	4x25	4x20	2x16	2x10					
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C					
	SOGLIA Irth (A)	10	25	20	10	10					
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth					
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0.03	0.3	0.03	0.03	0.03					
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO					
	CLASSE	A	A	A	A	A					
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)										
	N. POLI x In (A)										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)										
FUSIBILE	N. POLI x In (A)										
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO										
CONDUTTORE	TIPO										
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)										
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA										
	Ib (A) Iz (A)										
	Un (V) Pn (kW)	230	400	400	230	230					
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%										
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM					
NOTE											

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via C. Palasciano n. 19 - 081.8511774 - www.comecsrl.it - email.info@comecsrl.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)
IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 4 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE08.DWG
TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FAG	A1	FA1	FA2				FAP			
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

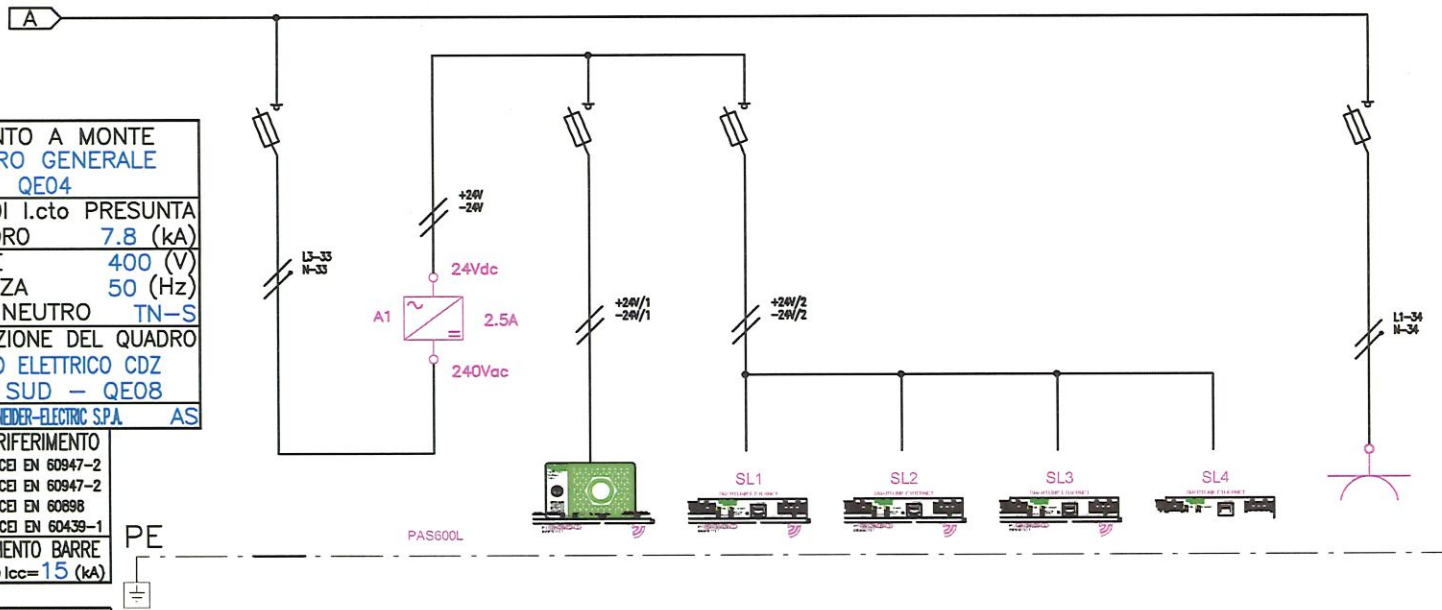

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 7.8 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO CDZ ZONA SUD – QE08
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE ALIMENTATORE 24Vdc MODBUS	ALIMENTATORE 230/24Vdc MODBUS	PROTEZIONE PANEL SERVER	PROTEZIONE SMARTLINK				PRESA DI SERVIZIO			
INTERRUTTORE	TIPO	STI 2P		STI 1P+N	STI 1P+N				STI 1P+N			
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x4		1x2+N	1x2+N				1x2+N			
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)											
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Palisello n. 19 - 081.611774 - www.comecsrl.it - email:info@comecsrl.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 5 DI 5 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE08.DWG

TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	BIONDMESSORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETTRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :

Descrizione:
Q.E. CDZ PT_ZONA SUD
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 200/26

Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File : QE08.DWG

Percorso File : QE08.DWG

Nr. Foglio 1


Nr. Fogli 10

Rev. 0

DISTRIBUZIONE MOD BUS

CONTATORE DI ENERGIA


PANEL SERVER

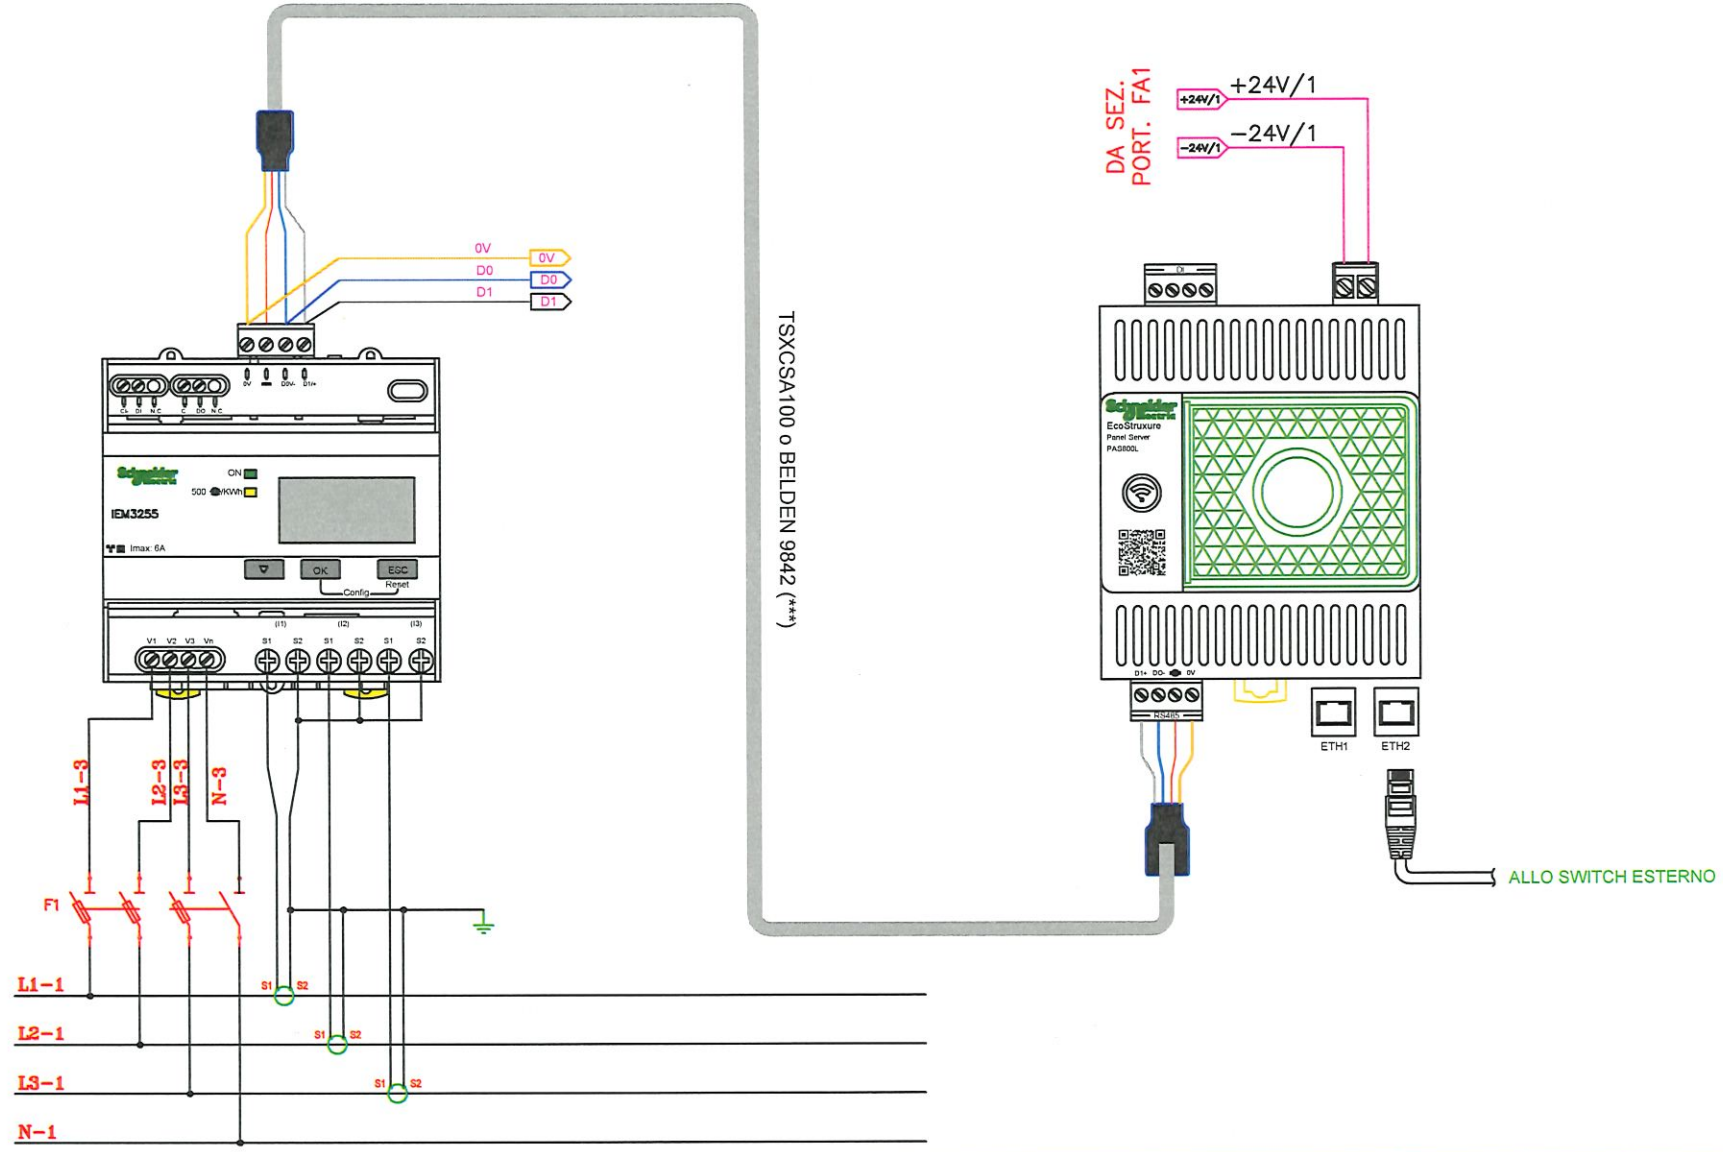

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE08.DWG Percorso File : QE08.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 10	Rev. 0

ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK

COLONNA 1

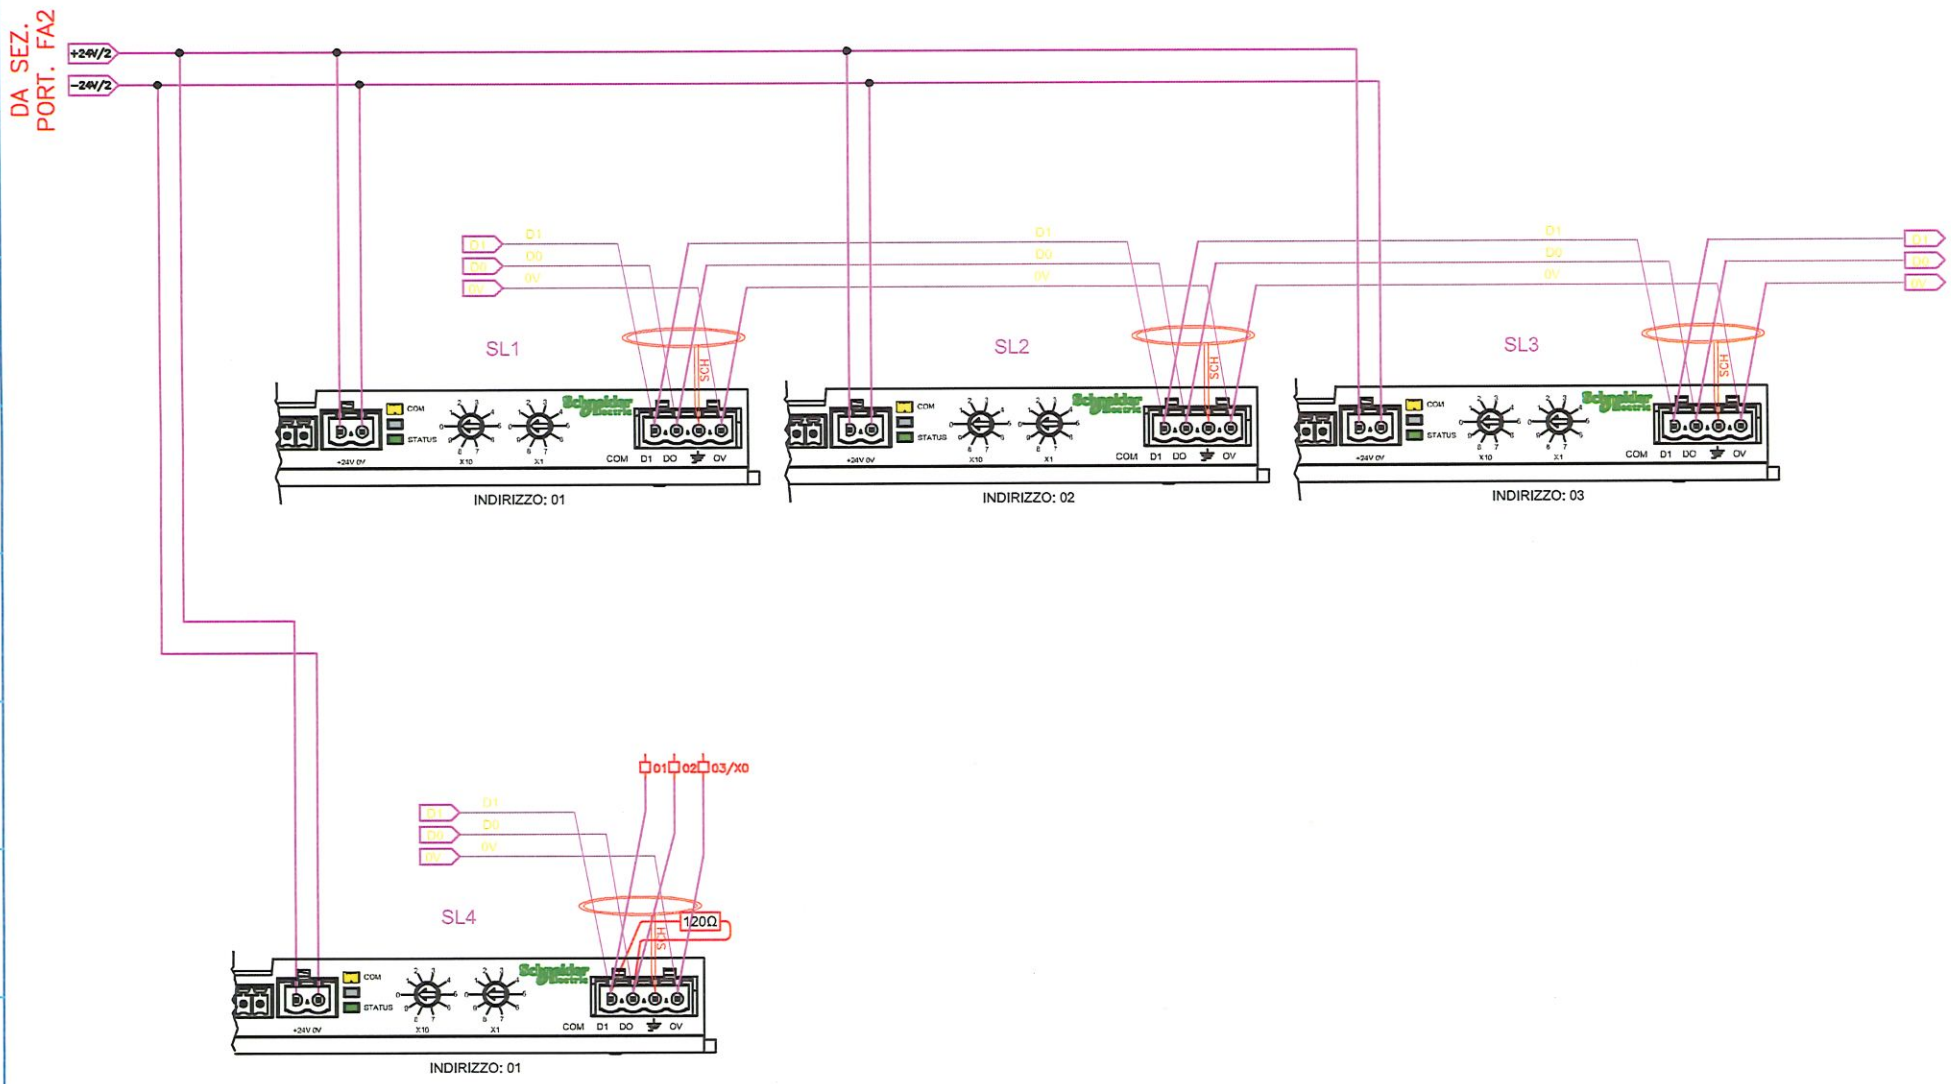


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE08.DWG Percorso File : QE08.DWG		Nr. Foglio 3 Nr. Fogli 10	Rev. 0

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL1

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1


SL1-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2

SL1-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3


SL1-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI OF/SD INTERRUTTORE Q4

SL1-PORTA 4




STATO "CHIUSO"

STATO "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5


SL1-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6


SL1-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q7


SL1-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q8

SL1-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 10









-DISPONIBILE-




SL1-PORTA 11



COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200/26			
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C			
	Proget.	Note :		Nome File : QE08.DWG	Percorso File : QE08.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 10	Rev. 0
	visto						

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL2

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q9	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q9/1	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q10	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q10/1	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q11	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q11/1
SL2-PORTA 1	SL2-PORTA 2	SL2-PORTA 3	SL2-PORTA 4	SL2-PORTA 5	SL2-PORTA 6
					
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q12	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q13	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q14	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q15	-DISPONIBILE-
SL2-PORTA 7	SL2-PORTA 8	SL2-PORTA 9	SL2-PORTA 10	SL2-PORTA 11
				
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	


COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE
Matricola	200/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File :	QE08.DWG
Percorso File :	QE08.DWG
Nr. Foglio	5
Nr. Fogli	10
Rev.	0

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL3

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q16


SL3-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q17


SL3-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q18


SL3-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q19


SL3-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q20

SL3-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q21


SL3-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q22

SL3-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q23

SL3-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 10





-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 11



COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE08.DWG Percorso File : QE08.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 10	Rev. 0

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL4


CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q24	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q25	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q26	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q27	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q28	-DISPONIBILE-
SL4-PORTA 1	SL4-PORTA 2	SL4-PORTA 3	SL4-PORTA 4	SL4-PORTA 5	SL4-PORTA 6
					
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	


-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-
SL4-PORTA 7	SL4-PORTA 8	SL4-PORTA 9	SL4-PORTA 10	SL4-PORTA 11
				

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE
Matricola	200/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE08.DWG
Percorso File :	QE08.DWG
Nr. Foglio	7
Nr. Fogli	10
Rev.	0

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

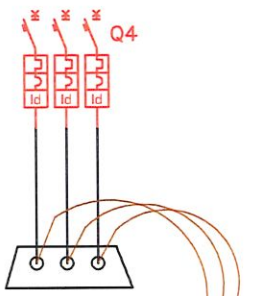

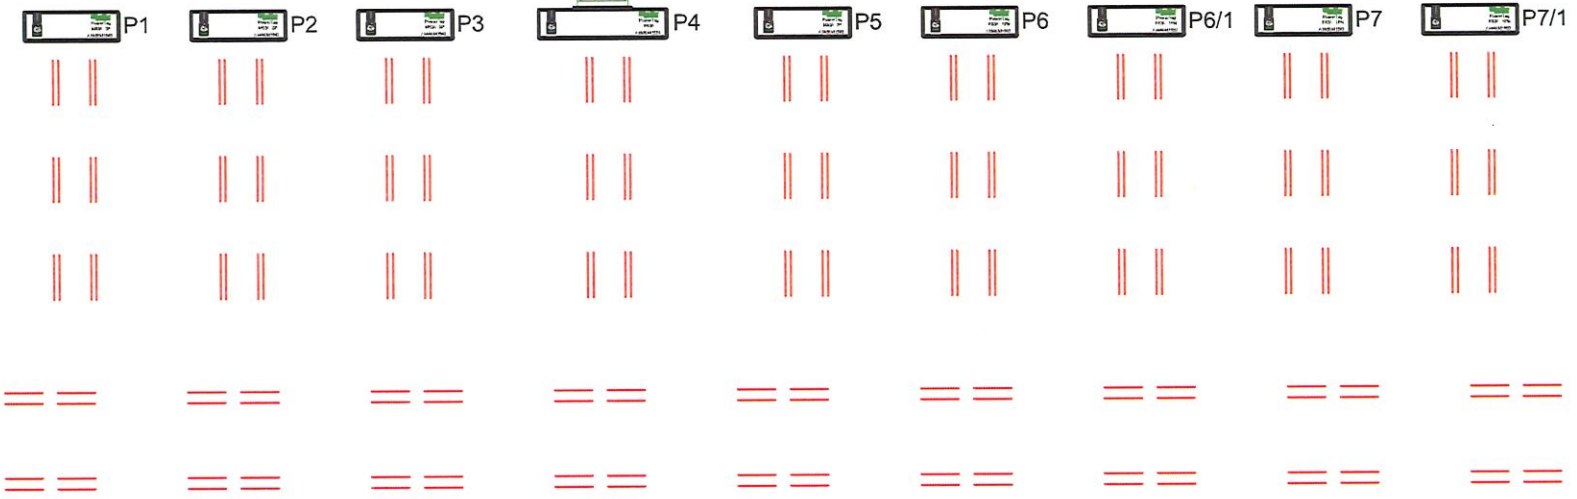




COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE
Matricola	200/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File :	QE08.DWG
Percorso File :	QE08.DWG
Nr. Foglio	8
Nr. Fogli	10
Rev.	0

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

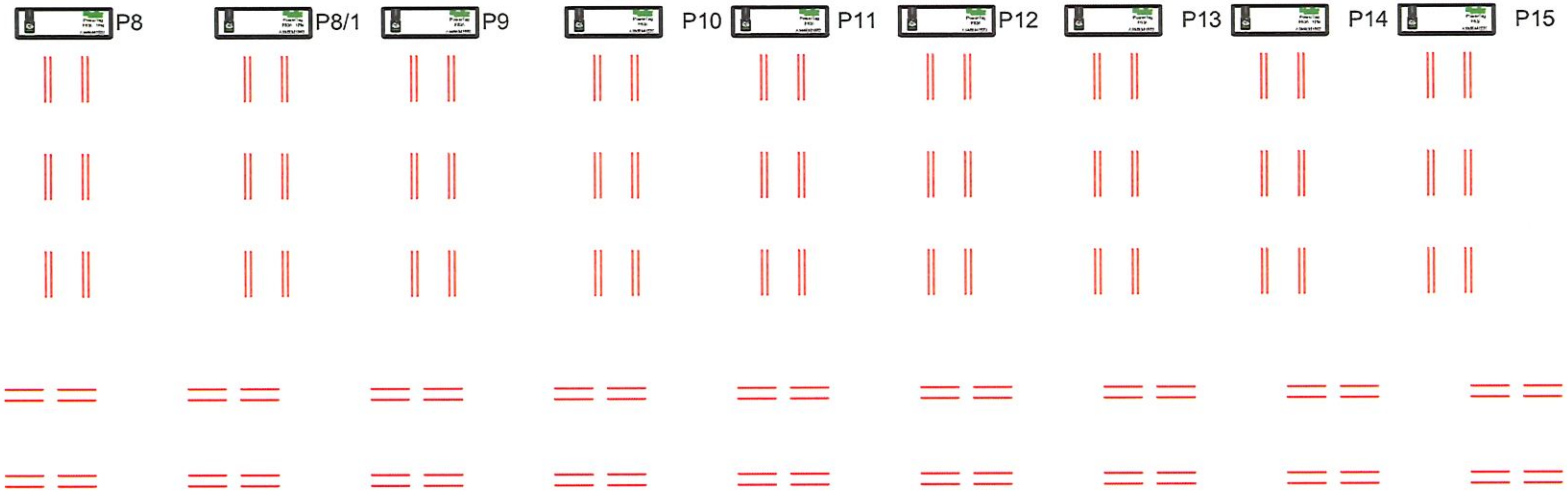

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE08.DWG Percorso File : QE08.DWG	Nr. Foglio 9	Nr. Fogli 10 / Rev. 0

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

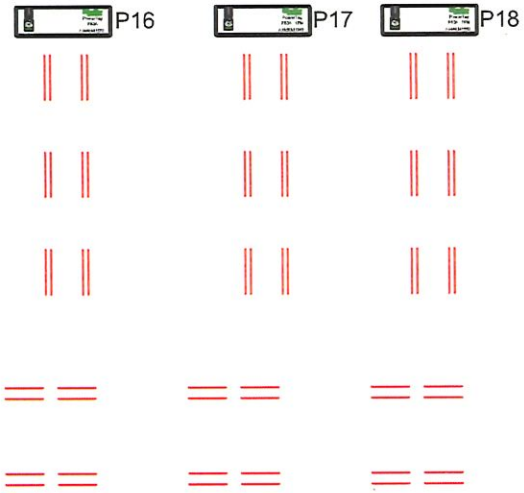

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE08.DWG Percorso File : QE08.DWG	Nr. Foglio 10	Nr. Fogli 10	Rev. 0

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA BUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione:
Q.E. CDZ PT_ZONA SUD
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 200/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE08.DWG
Percorso File : QE08.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 6
Rev. 0

MORSETTIERA X1

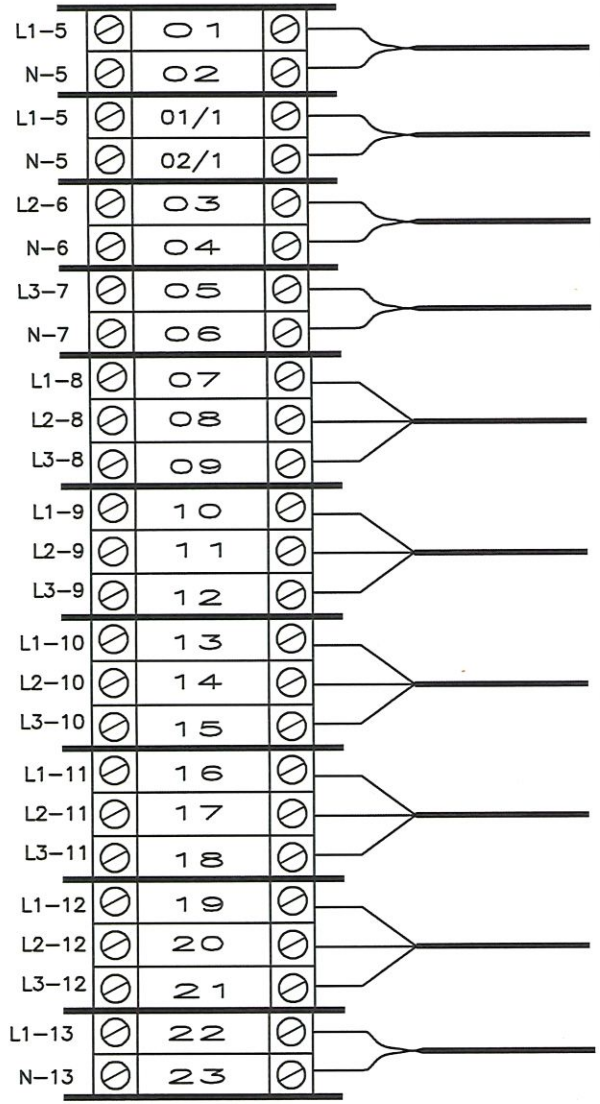

Sigla: QE.08.L1 LUCE LOCALE TECNICO

Sigla: ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE TECNICO

Sigla: RISERVA

Sigla: QE.08.F1 LUCE LOCALE TECNICO

Sigla: QE.08.01"UV01"

Sigla: QE.08.02 UTA "PRODUZIONE" VENTILATORE 1

Sigla: QE.08.03 UTA "PRODUZIONE" VENTILATORE 1

Sigla: QE.08.04 UTA "PRODUZIONE" VENTILATORE 2

Sigla: QE.08.05 UTA "PRODUZIONE" VENTILATORE 2


Sigla: QE.08.06 UTA "RC2" VENTILATORE 1

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	200/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE08.DWG
Percorso File :	QE08.DWG
Nr. Foglio	2
Nr. Fogli	6
Rev.	0

MORSETTIERA X1

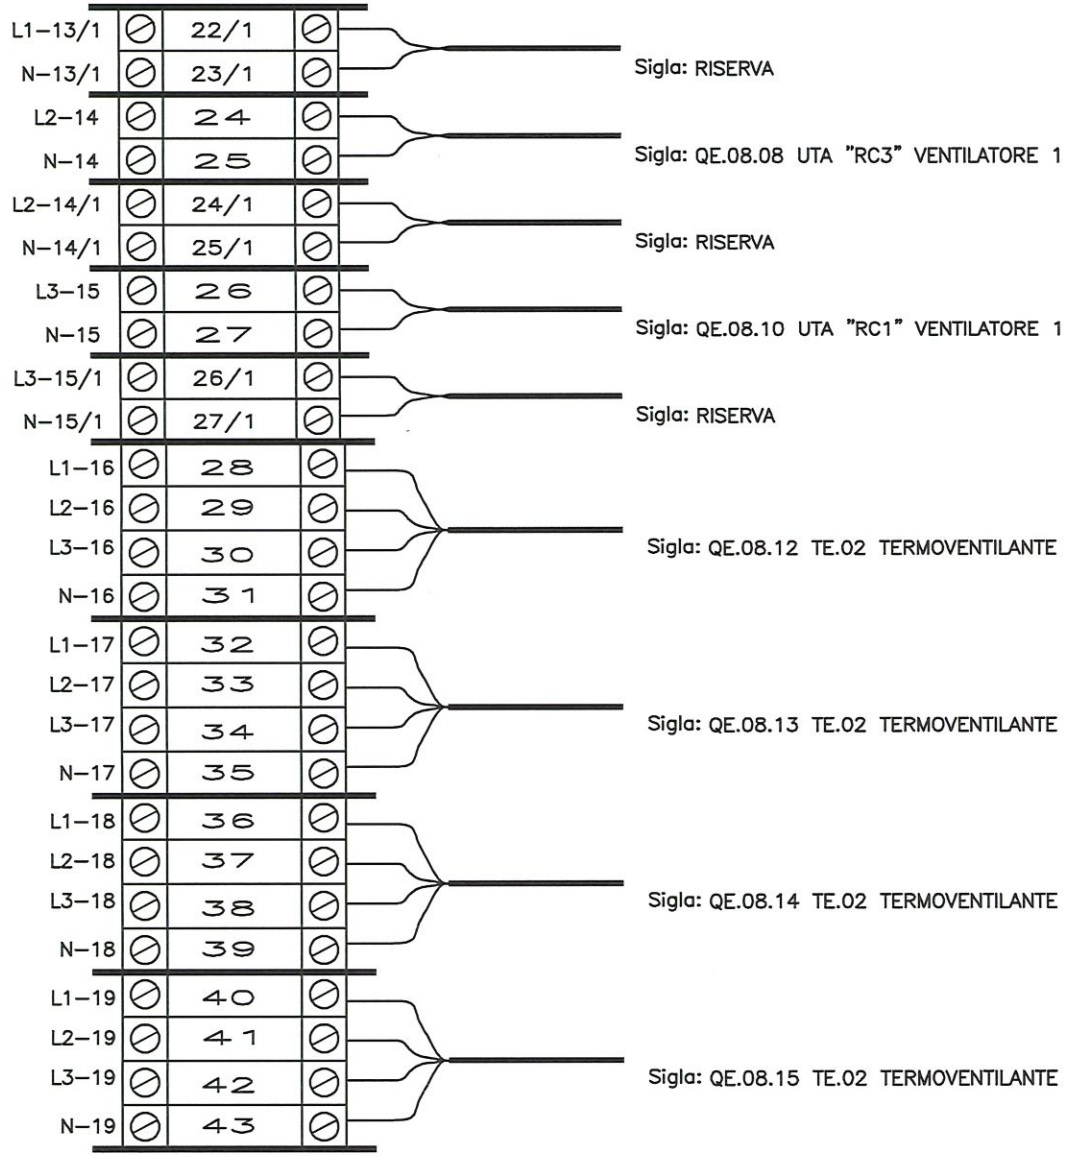


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 200/26
Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Proget.	Note :		Nome File : QE08.DWG — Percorso File : QE08.DWG — Nr. Foglio 3 — Nr. Fogli 6 — Rev. 0
visto			

MORSETTIERA X1

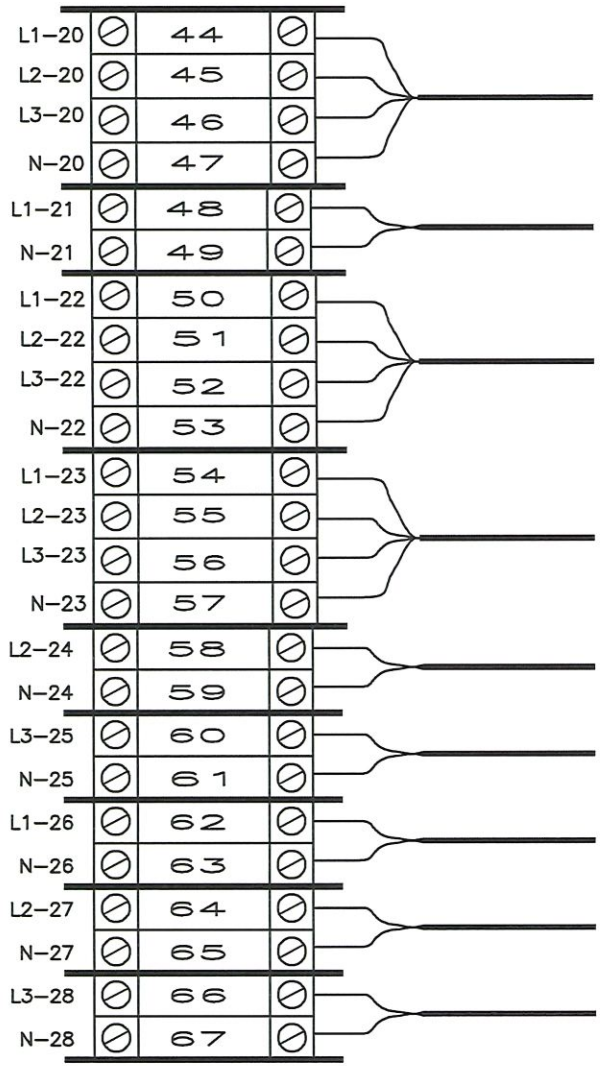

Sigla: QE.08.16 TE.02 TERMOVENTILANTE

Sigla: QE.08.18 "SC1"

Sigla: QE.08.18 "UE.01" UNITÀ ESTERNA

Sigla: QE.08.19 "UE.02" UNITÀ ESTERNA

Sigla: QE.08.20 "UI" 7,9,10 PT ALIM. DA U.E.02

Sigla: QE.08.22 "UI" 1–6,9,11 PT ALIM. DA U.E.01

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: 31 SISTEMA BMS

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.


Note :

Descrizione:
Q.E. CDZ PT_ZONA SUD
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 200/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C

Nome File : QE08.DWG
Percorso File : QE08.DWG
Nr. Foglio 4
Nr. Fogli 6
Rev. 0

MORSETTIERA X1

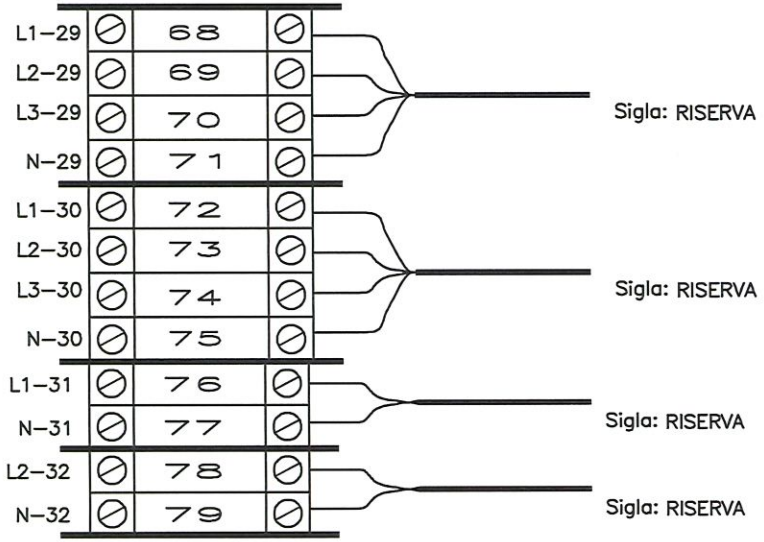


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 200/26
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA MORSETTIERA	Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Proget.	Note :		Nome File : QE08.DWG / Percorso File : QE08.DWG / Nr. Foglio 5 / Nr. Fogli 6 / Rev. 0
visto			

MORSETTIERA X0



Sigla: COMUNICAZIONE BUS MULTIMETRO

MORSETTIERA X0

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 200/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE08.DWG Percorso File : QE08.DWG	Nr. Foglio 6 Nr. Fogli 6 Rev. 0
