COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP QE11



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DÌ CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DÌ CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DÌ TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DÌ POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 20 / 07 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.

Certificato ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2

Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU

Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**
COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**
Committente:	**Megawatt S.p.A.** **Via Circumvallazione Esterna,42 – 80025 Casoria (na)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico CDZ P1_ZONA KNAPP**
Locazione del quadro:	**Interporto Campano S.p.A.** **Modulo Nr. 6-7-8-9 Lotto C** **GMM Farma** **Comune di Nola (Na)**
Quadro:	**QE11**
Identificazione del quadro:	**201 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	160A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	6.8KA

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	31
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	24
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	1006x2100x655 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	PrismaSet P Schneider-electric S.p:A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9001
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Schneider-electric S.p.A.** serie **PrismaSet P** in lamiera di acciaio trattamento di cataforesi + polvere epossi-poliestere polimerizzata a caldo;

- Trattamento elettroforesi + polveri epossidiche poliestere polimerizzata
- Colore bianco RAL9001
- Tenuta meccanica IK10
- Corrente di tenuta nominale di picco Ipk=220KA

Green Premium

Questa offerta Green Premium vi aiuterà a ridurre i costi e le emissioni di gas serra grazie a un imballaggio più sostenibile realizzato interamente in cartone e senza l'uso di plastica. Eseguire la scansione del codice QR per accedere a tutti i fogli di istruzioni.

Prevenzione degli incendi elettrici

Per prevenire gli incendi di natura elettrica è necessario utilizzare prodotti in grado di comunicare tempestivamente, infatti è proprio la comunicazione la chiave per una prevenzione efficace. Scopri i prodotti Schneider Electric dedicati alla prevenzione verso gli incendi di natura elettrica.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Allowing your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP - QE11

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
LVS08760	2 pannelli lat. IP30 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08721	2 chiusure later zoccol P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	SCHNEIDER
LVS04512	Barra preforata PE 25X5	1	SCHNEIDER
LVS04657	3 Supporti PE Verticale	1	SCHNEIDER
LVS03402	Guida app. modul regolabile PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS04226	2 Guide modulari L1600mm	1	SCHNEIDER
LVS03007	Guida app. modulare regolabile L850	1	SCHNEIDER
LVS08603	Struttura L300 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08640	Green Bar L300mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08633	Tetto IP30 L300 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08513	Porta piena IP30 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08733	Pannello fondo IP30 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08723	Zoccolo H100 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08606	Struttura L650 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08566	1ornice supporto piastre frontali L650	1	SCHNEIDER
LVS08642	Green Bar L650mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08636	Tetto IP30 L650 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08536	Porta trasp. IP30 L650 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08736	Pannello fondo IP30 L650 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08726	Zoccolo H100 L650 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08700	4 anelli di sollevamento PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08711	Kit guarnizioni IP31 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS03401	Guida app. modulari PrismaSeT P	7	SCHNEIDER
LVS03203	Piastra frontale modulare 3M	1	SCHNEIDER
LVS03412	Piastra fondo NSX-INS250 H fisso/dir4P	1	SCHNEIDER
LVS03606	Piastra front. NSX160/250 fix dir 4P	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	6	SCHNEIDER
LGY416048	MORSETTIERA TETRAPOLARE 160A 4x12 FORI	2	SCHNEIDER
LGYN12512	BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 125A	1	SCHNEIDER
LVS03805	Piastra frontale piena 5M	1	SCHNEIDER
LGY4230	Piast supporto connet Rj45 Femmina	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	2	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
A9L20600	iPRD20 3P+N 5kA estr. T2	1	SCHNEIDER
A9F89425	iC60H 4P C 25A 10000A	2	SCHNEIDER
A9XMFA04	Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink	3	SCHNEIDER
A9F89416	iC60H 4P C 16A 10000A	10	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	25	SCHNEIDER
A9F89216	iC60H 2P C 16A 10000A	3	SCHNEIDER
A9F79216	iC60N 2P C 16A 6000A	8	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	3	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER

A9F89420	iC60H 4P C 20A 10000A	1	SCHNEIDER
A9Q51425	QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9Q51225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo A	2	SCHNEIDER
A9F79210	iC60N 2P C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A15303	iPC 2P+T 16A 250Vca italiana	1	SCHNEIDER
A9XC2412	Conf. 12 connettori Ti24 a 5 pin	5	SCHNEIDER
A9MEM3255	iEM3255 3P+N ins.TA, modbus MID	1	SCHNEIDER
METSECT5MA015	TA 150/5 D.27 - sbar 10x32 15x25mm	3	SCHNEIDER
A9XMSB11	Smartlink SI B - Modbus Slave RS485	6	SCHNEIDER
A9MEM1570	PowerTag wirel. F63A 3PN monte valle	10	SCHNEIDER
A9MEM1560	PowerTag wirel. F63A 1PN monte valle	10	SCHNEIDER
PAS600L	EPS Universal B-Pas 24VDC 2DI	1	SCHNEIDER
C164160S	NSX160NA 4P_T	1	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	1	SCHNEIDER
ACTPC6ASFLS30WE	PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 3m Bia.	1	SCHNEIDER
VW3A8306DRC	TERMINALE RC MODBUS CON VITI	1	SCHNEIDER

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**201**
Date of document: *Data del documento:*	**20/07/2026**

Customer/*Cliente*:	**Megawatt S.p.A.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**PrismaSet P / Schneider-electric S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**20/07/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**063 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**201/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**QE11**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	160	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	15	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	22,5	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	201/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	201/26 QE11
Schematic dwg. *Schema funzionale*	201/26 QE11
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	201/26 QE11

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit */Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit */Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit */Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function** *Prove di funzionamento elettrico*	CEI EN 61439-2 par. 11.10	Satisfactory *Conforme*	

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE:

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

DATI DI TARGA DEL QUADRO

DENOMINAZIONE	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	160A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	30
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	31
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	1006x2100x665
MATRICOLA	201/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	


COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :


Descrizione:
QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
DATI DI TARGA

Matricola 201/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE11.DWG
Percorso File : QE11.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

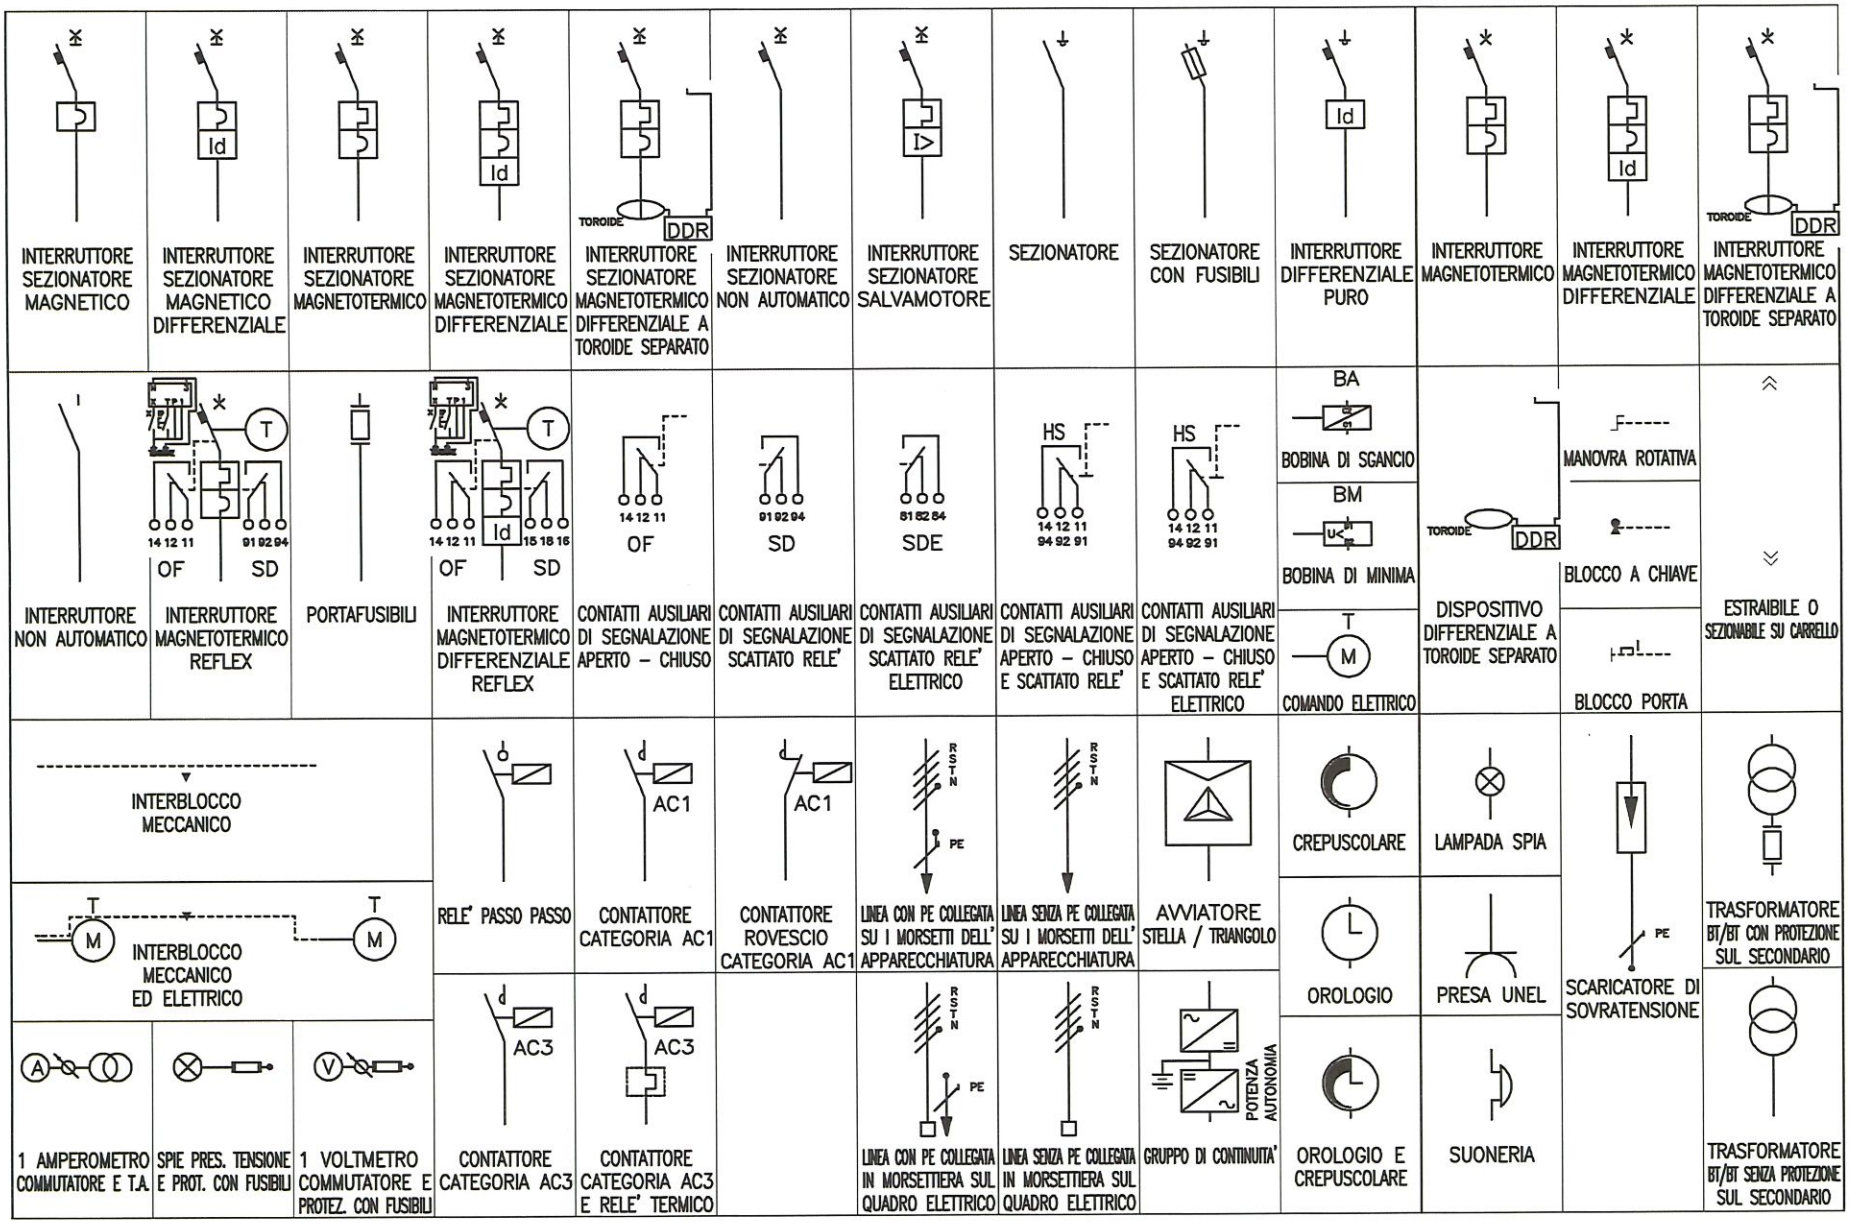

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
	LEGENDA QUADRO
Matricola	201/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE11.DWG
Percorso File :	QE11.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

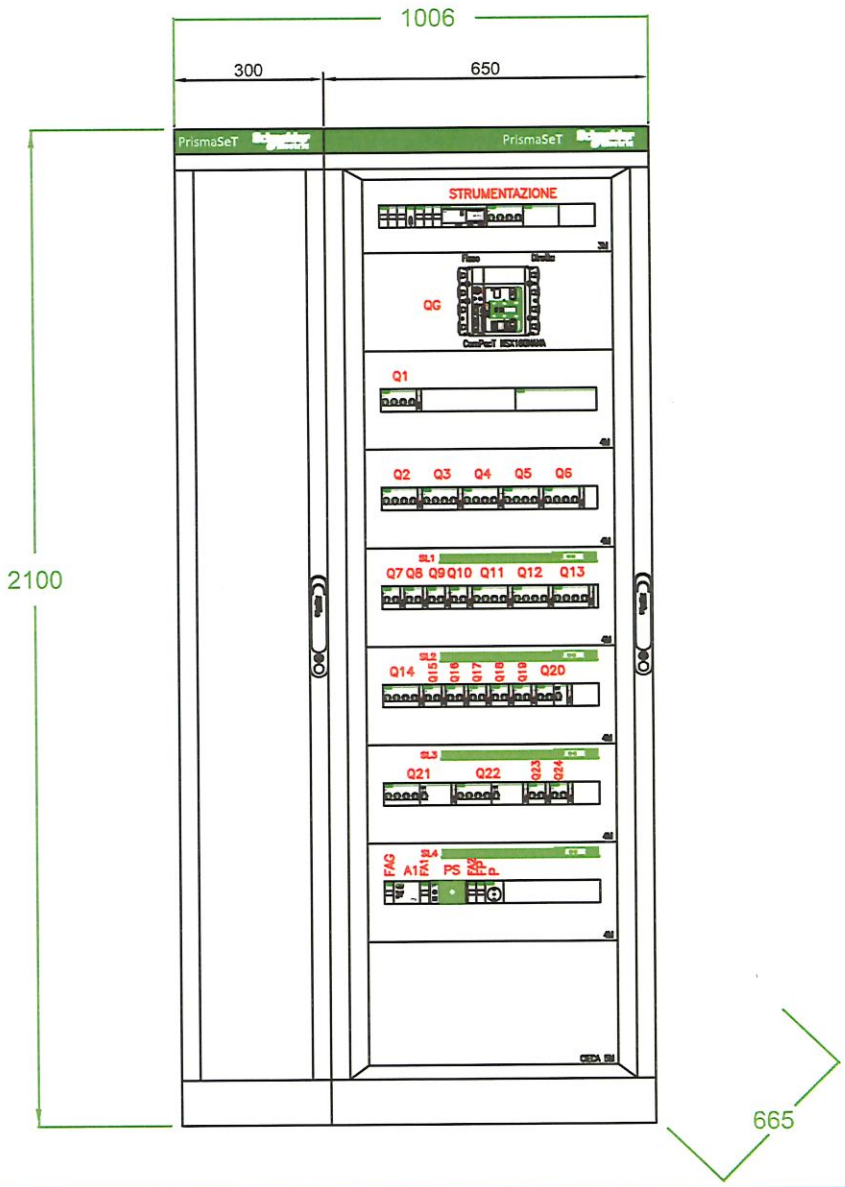

QUADRO ELETTRICO CDZ P1 ZONA UFFICI+PRODUZIONE

BRAND	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.
TIPO	PRISMA SET P
GRADO DI PROTEZIONE	IP31
DIMENSIONE BxHxP (mm)	1006x2100x665mm

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
FRONTE QUADRO

Matricola 201/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QE11.DWG	QE11.DWG	1	1	0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		FP	FM	QS	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

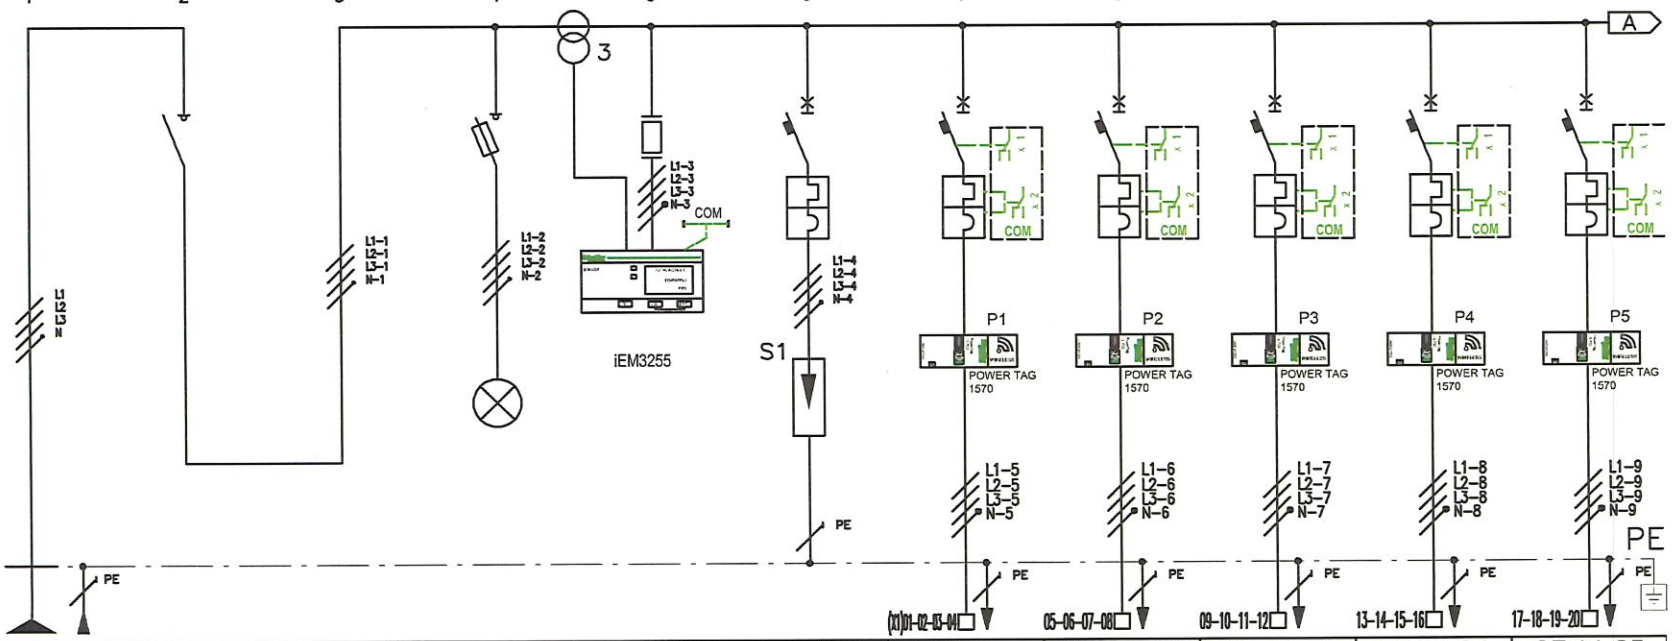

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 6,8 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO CDZ P1 ZONA KNAPP – QE11
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 160 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO		INTERRUTTORE GENERALE		PROTEZIONE PRESENZA RETE	PROTEZIONE MULTIMETRO	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	QE.11.01 TE.01 TERMOVENTILANTE		QE.11.02 TE.01 TERMOVENTILANTE		QE.11.03 TE.01 TERMOVENTILANTE		QE.11.04 TE.01 TERMOVENTILANTE		QE.11.05 TE.02 TERMOVENTILANTE	
INTERRUTTORE	TIPO			NSX160NA		STI_10,3x38		iC60H	IC60H		IC60H		IC60H		IC60H		IC60H	
	P.D.I. (kA)							15	15		15		15		15		15	
	N. POLI x In (A)			4x160				4x25	4x16		4x16		4x16		4x16		4x16	
	CURVA / SGANCIAT.							C	C		C		C		C		C	
	SOGLIA Irth (A)							25	16		16		16		16		16	
	SOGLIA Irm (A)							10Irth	10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)																	
	RITARDO (ms)																	
	CLASSE																	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)																	
	N. POLI x In (A)																	
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)																	
FUSIBILE	N. POLI x In (A)					3x2+N	3x1 + N											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO						iEM3255	iQuick PRD20r 3P+N 5kA T2										
CONDUTTORE	TIPO	FG16M16-0,6/1KV					FS17		FG16OM16-0,6/1kV		FG16OM16-0,6/1kV		FG16OM16-0,6/1kV		FG16OM16-0,6/1kV		FG16OM16-0,6/1kV	
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x35+PE					4x2,5		4x4+PE		4x4+PE		4x6+PE		4x6+PE		4x6+PE	
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	100							20		35		70		80		90	
	Ib (A) Iz (A)	36							2,6		2,6		2,6		2,6		2,6	
	Un (V) Pn (kW)	400	22						400	1,6	400	1,6	400	1,6	400	1,6	400	1,6
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%																	
AUSILIARI ELETTRICI																		
NOTE							T.A. – 125/5A											


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80129-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.6511774 - www.comecsab.it - emailinfo@comecsab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 1 DI 4	Ed. 0
Disegnatore : F.D.M.	File: QE11.DWG	

TAVOLA

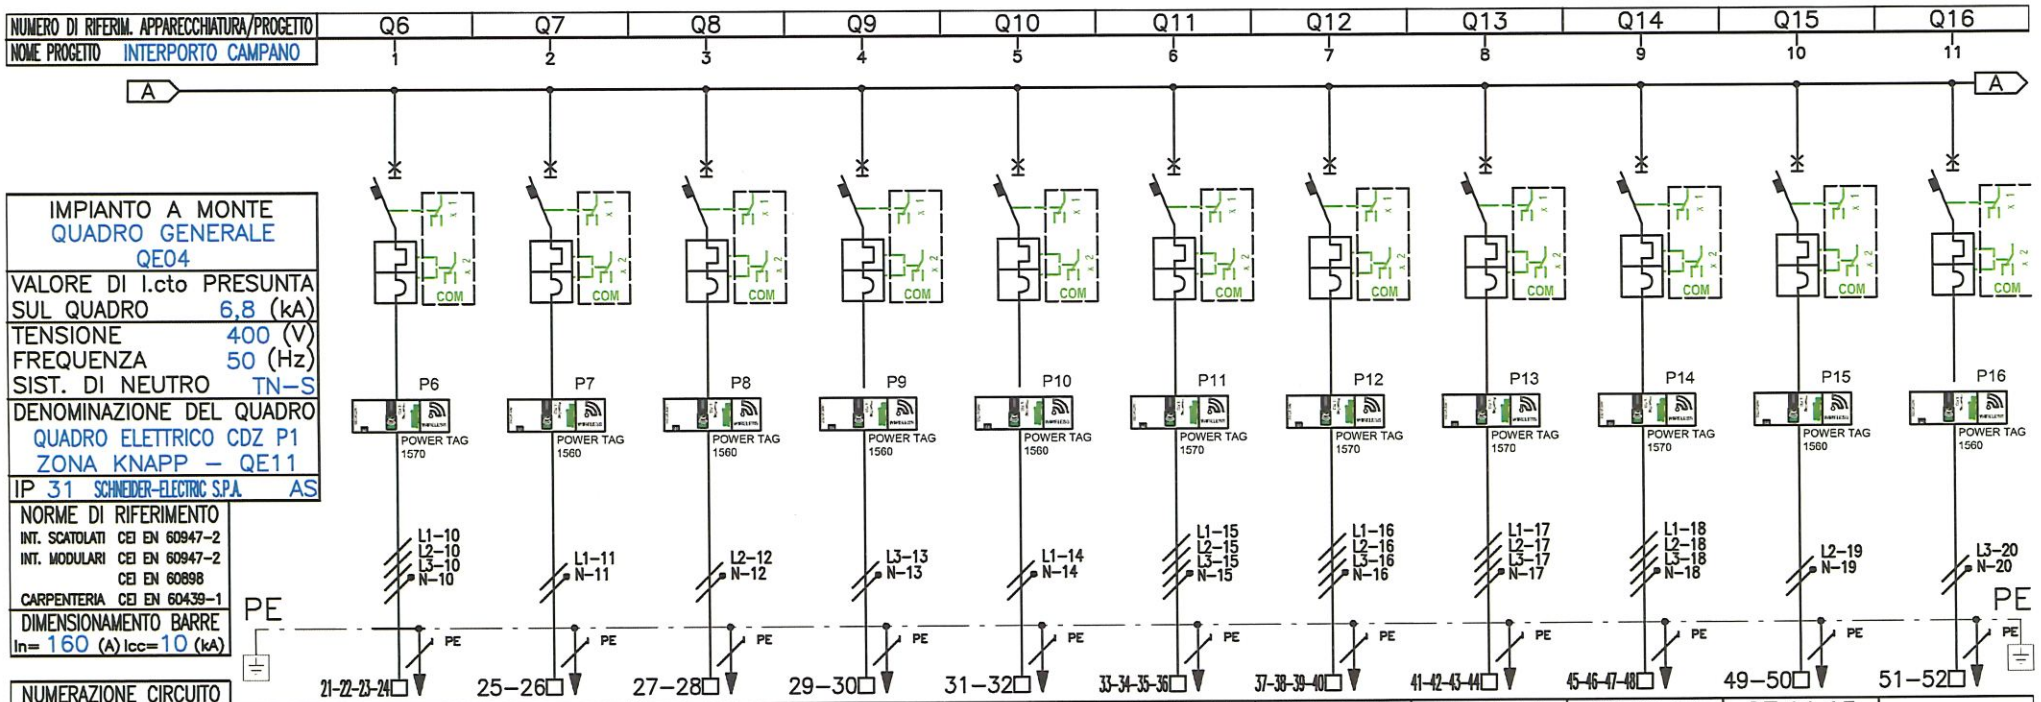


NUMERAZIONE CIRCUITO		QE.11.06 TE.02 TERMOVENTILANTE		QE.11.07 "SC2"		QE.11.08 "VEX 4"		QE.11.09 "RC7"		SCORTA		QE.11.11 TE.01 TERMOVENTILANTE		QE.11.12 TE.01 TERMOVENTILANTE		QE.11.13 TE.02 TERMOVENTILANTE		QE.11.14 TE.02 TERMOVENTILANTE		QE.11.15 "RC6" VENTILATORE 1		SCORTA	
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO																							
INTERRUTTORE	TIPO	IC60H		IC60H		IC60H		IC60N		IC60N		IC60H		IC60H		IC60H		IC60H		IC60N		IC60N	
	P.D.I. (kA)	15		30		30		20		20		15		15		15		15		20		20	
	N. POLI x In (A)	4x16		2x16		2x16		2x16		2x16		4x16		4x16		4x16		4x16		2x16		2x16	
	CURVA / SGANCIAT.	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
	SOGLIA Irth (A)	16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16	
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)																						
	RITARDO (ms)																						
	CLASSE																						
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)																						
	N. POLI x In (A)																						
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)																						
FUSIBILE	N. POLI x In (A)																						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO																						
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV				FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV			
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x10+PE		2x4+PE		2x4+PE		2x4+PE				4x10+PE		4x10+PE		4x6+PE		4x6+PE		2x4+PE			
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	100		110		40		130				100		100		70		90		110			
	Ib (A) Iz (A)	2,6		2,4		5,8		1,4				2,6		2,6		2,6		2,6		2,4			
	Un (V) Pn (kW)	400	1,6	230	0,5	230	1,2	230	0,3	230		400	1,6	400	1,6	400	1,6	400	1,6	230	0,5	230	
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%																						
AUSILIARI ELETTRICI																							
NOTE																							

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - email:info@comecsrl.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)
IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 2 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE11.DWG
TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24			
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

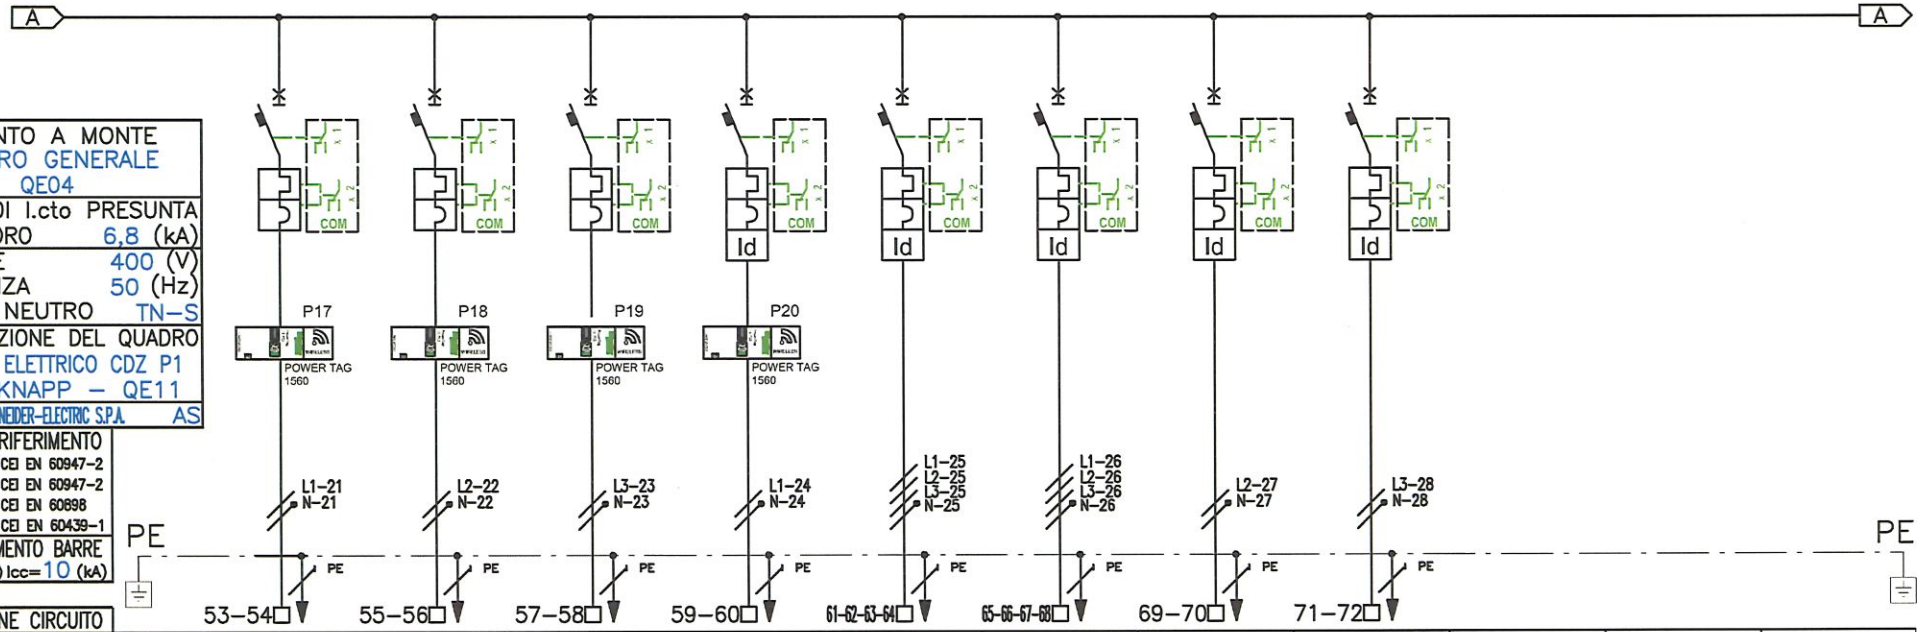

IMPIANTO A MONTE QUADRO GENERALE QE04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 6,8 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO CDZ P1 ZONA KNAPP – QE11
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 160 (A) Icc=10 (kA)


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		QE.11.17 "RC4" VENTILATORE 1		QE.11.19 "RC5" VENTILATORE 1		SCORTA		QE.11.21 "SC1"		RISERVA		RISERVA		RISERVA		RISERVA	
INTERRUTTORE	TIPO	IC60N		IC60N		IC60N		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60N+Vigi		iC60N+Vigi	
	P.D.I. (kA)	20		20		20		30		15		15		20		20	
	N. POLI x In (A)	2x16		2x16		2x16		2x16		4x25		4x20		2x16		2x10	
	CURVA / SGANCIAT.	C		C		C		C		C		C		C		C	
	SOGLIA Irth (A)	16		16		16		16		25		20		16		10	
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)							0.03		0.3		0.03		0.03		0.03	
	RITARDO (ms)							ISTANTANEO		SELETTIVO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO	
	CLASSE							A		A		A		A		A	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)																
	N. POLI x In (A)																
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)																
FUSIBILE	N. POLI x In (A)																
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO																
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16-0,6/1kV		FG160M16-0,6/1kV				FG160M16-0,6/1kV									
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x4+PE		2x4+PE				2x4+PE									
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	40		130				110									
	Ib (A) Iz (A)	5,8		1,4				2,4									
	Un (V) Pn (kW)	230	1,2	230	0,3	230		230	0,5	400		400		230		230	
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%																
AUSILIARI ELETTRICI								CONTATTO COM		CONTATTO COM		CONTATTO COM		CONTATTO COM		CONTATTO COM	
NOTE																	

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via C. Palasciano n. 19 - 081.8511774 - www.comecsrl.it - email:info@comecsrl.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)
IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 3 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : F.D.M. | File: QE11.DWG
TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FAG	A1	FA1	FA2				FAP			
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

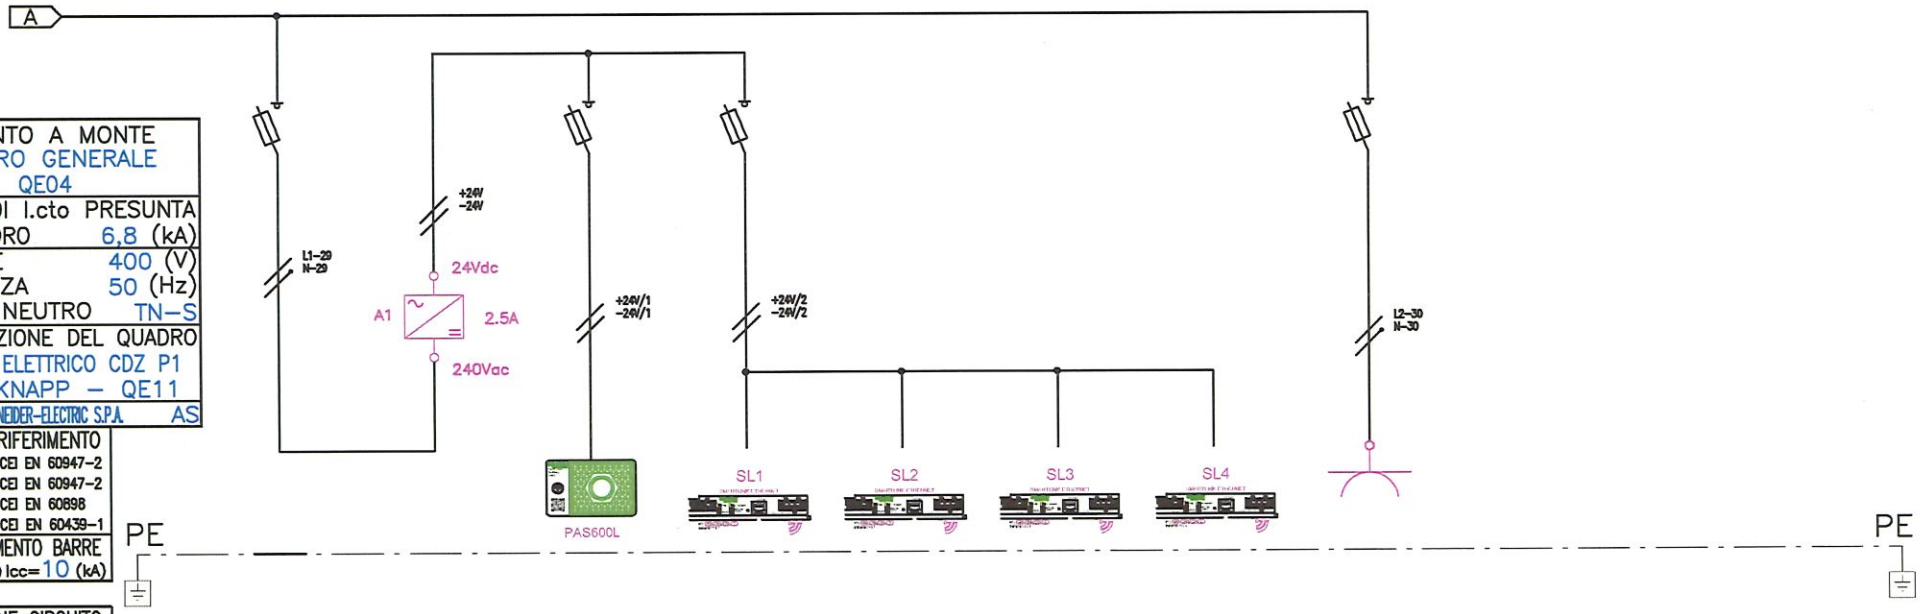

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE
QE04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 6,8 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO CDZ P1
ZONA KNAPP – QE11
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 160 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE ALIMENTATORE 24Vdc MODBUS	ALIMENTATORE 230/24Vdc MODBUS	PROTEZIONE PANEL SERVER	PROTEZIONE SMARTLINK				PRESA DI SERVIZIO			
INTERRUTTORE	TIPO	STI 1P+N		STI 1P+N	STI 1P+N				STI 1P+N			
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x4		1x2+N	1x2+N				1x2+N			
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)											
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Palisello n. 19 - 081.8511774 - www.comecsab.it - emailinfo@comecsab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 4 DI 4	Ed. 0
Disegnatore : F.D.M.	File: QE11.DWG	

TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	BIDIREZIONALE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :


Descrizione:
QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 201/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE11.DWG
Percorso File : QE11.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 10
Rev. 0

DISTRIBUZIONE MOD BUS

CONTATORE DI ENERGIA


PANEL SERVER

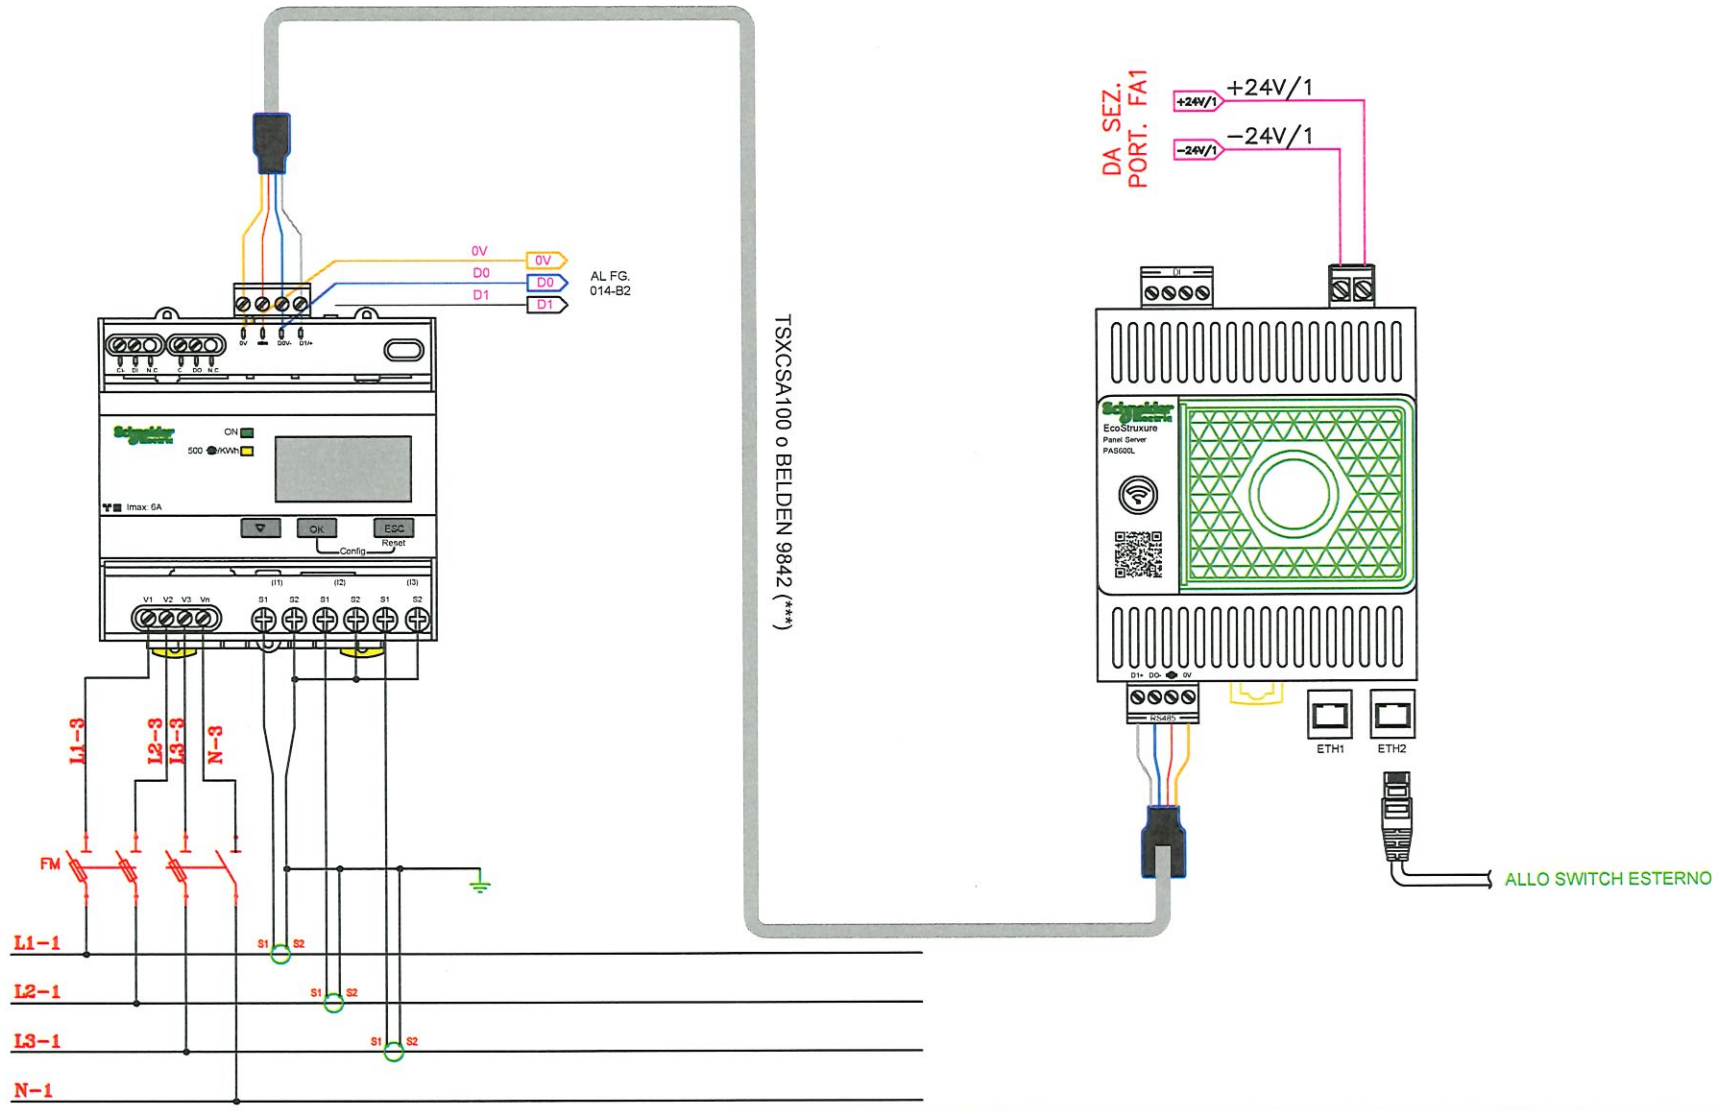

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP SCHEMA AUSILIARE	Matricola 201/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE11.DWG Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 10	Rev. 0





ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK



COLONNA 1

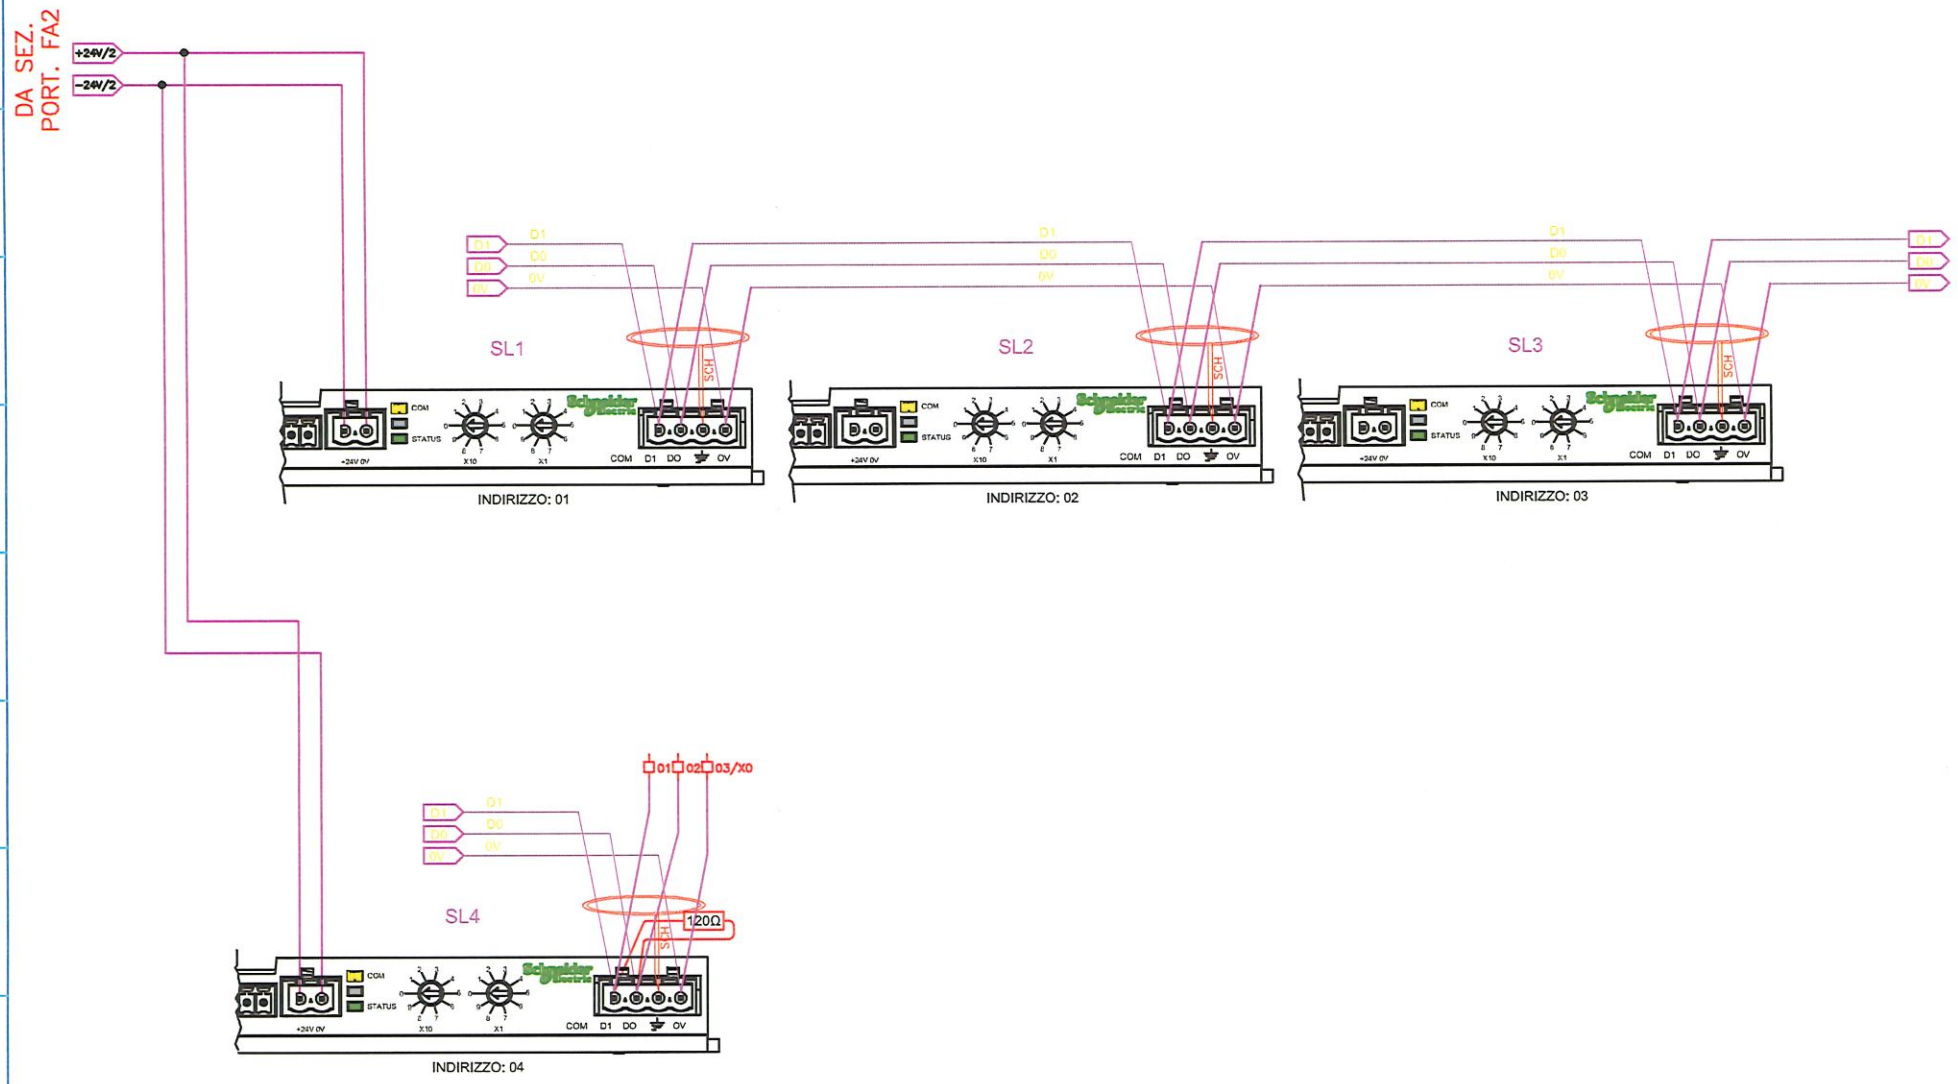

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP SCHEMA AUSILIARE	Matricola 201/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE11.DWG Percorso File : QE11.DWG		Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 10	Rev. 0

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL1

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3	CONTATTI OF/SD INTERRUTTORE Q4	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5	-DISPONIBILE-
SL1-PORTA 1	SL1-PORTA 2	SL1-PORTA 3	SL1-PORTA 4	SL1-PORTA 5	SL1-PORTA 6
					
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	

-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-
SL1-PORTA 7	SL1-PORTA 8	SL1-PORTA 9	SL1-PORTA 10	SL1-PORTA 11
				

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP SCHEMA AUSILIARE	Matricola 201/26		
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C		
	Proget.	Note :		Nome File : QE11.DWG	Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 4 / Nr. Fogli 10 / Rev. 0
	visto					

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL2

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6


SL2-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q7


SL2-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q8


SL2-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q9


SL2-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q10


SL2-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q11


SL2-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q12

SL2-PORTA 7



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 11



COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :

Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP








SCHEMA AUSILIARE

Matricola 201/26

Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QE11.DWG	QE11.DWG	5	10	0

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL3

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q13	CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q14	CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q15	CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q16	CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q17	CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q18
SL3-PORTA 1	SL3-PORTA 2	SL3-PORTA 3	SL3-PORTA 4	SL3-PORTA 5	SL3-PORTA 6
					
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"
-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	
SL3-PORTA 7	SL3-PORTA 8	SL3-PORTA 9	SL3-PORTA 10	SL3-PORTA 11	
					

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
	SCHEMA AUSILIARE
Matricola	201/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File :	QE11.DWG
Percorso File :	QE11.DWG
Nr. Foglio	6
Nr. Fogli	10
Rev.	0

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL4

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q19

SL4-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q20


SL4-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q21

SL4-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q22

SL4-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q23

SL2-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q24

SL2-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 7



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 11



COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: Q.E. CDZ PT_ZONA SUD
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 200/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE08.DWG
Percorso File : QE08.DWG
Nr. Foglio 7
Nr. Fogli 10
Rev. 0


CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

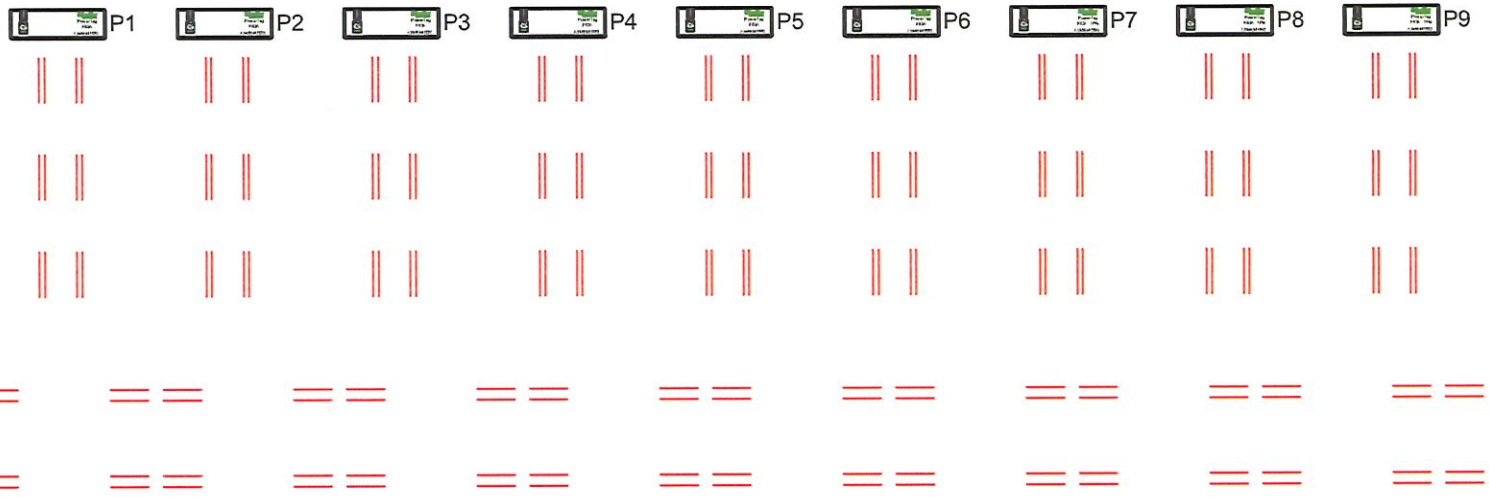



COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP SCHEMA AUSILIARE	Matricola 201/26			
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C			
	Proget.	Note :		Nome File : QE11.DWG	Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 8	Nr. Fogli 10	Rev. 0
	visto						

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

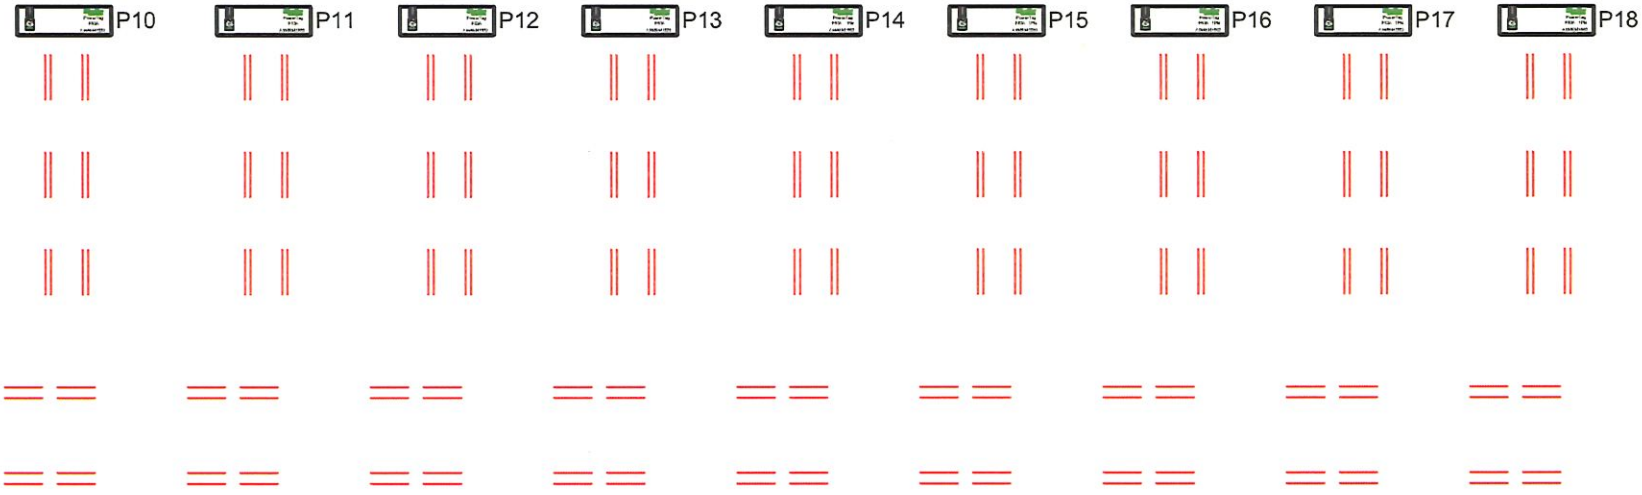

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP SCHEMA AUSILIARE	Matricola 201/26				
Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C				
Proget.	Note :		Nome File : QE11.DWG	Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 9	Nr. Fogli 10	Rev. 0
visto							

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG



COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
	SCHEMA AUSILIARE
Matricola	201/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE11.DWG
Percorso File :	QE11.DWG
Nr. Foglio	10
Nr. Fogli	10
Rev.	0

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA BUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 201/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE11.DWG
Percorso File : QE11.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 5
Rev. 0

MORSETTIERA X1

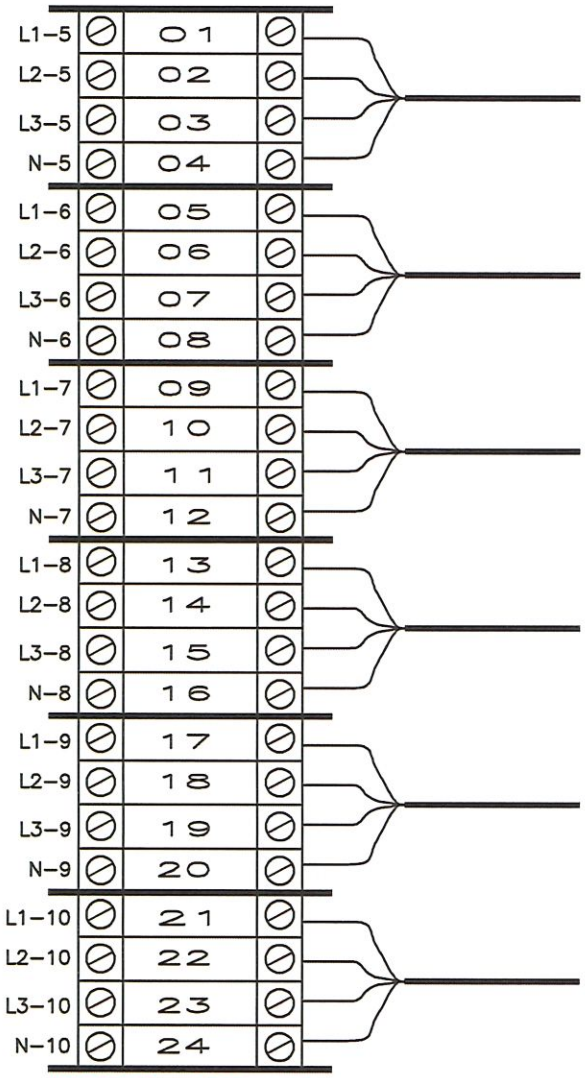

Sigla: QE.11.01 TE.01 TERMOVENTILANTE

Sigla: QE.11.02 TE.01 TERMOVENTILANTE

Sigla: QE.11.03 TE.01 TERMOVENTILANTE

Sigla: QE.11.04 TE.01 TERMOVENTILANTE

Sigla: QE.11.05 TE.02 TERMOVENTILANTE


Sigla: QE.11.06 TE.02 TERMOVENTILANTE

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 201/26
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP	Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QE11.DWG / Percorso File : QE11.DWG / Nr. Foglio 2 / Nr. Fogli 5 / Rev. 0
visto			

MORSETTIERA X1

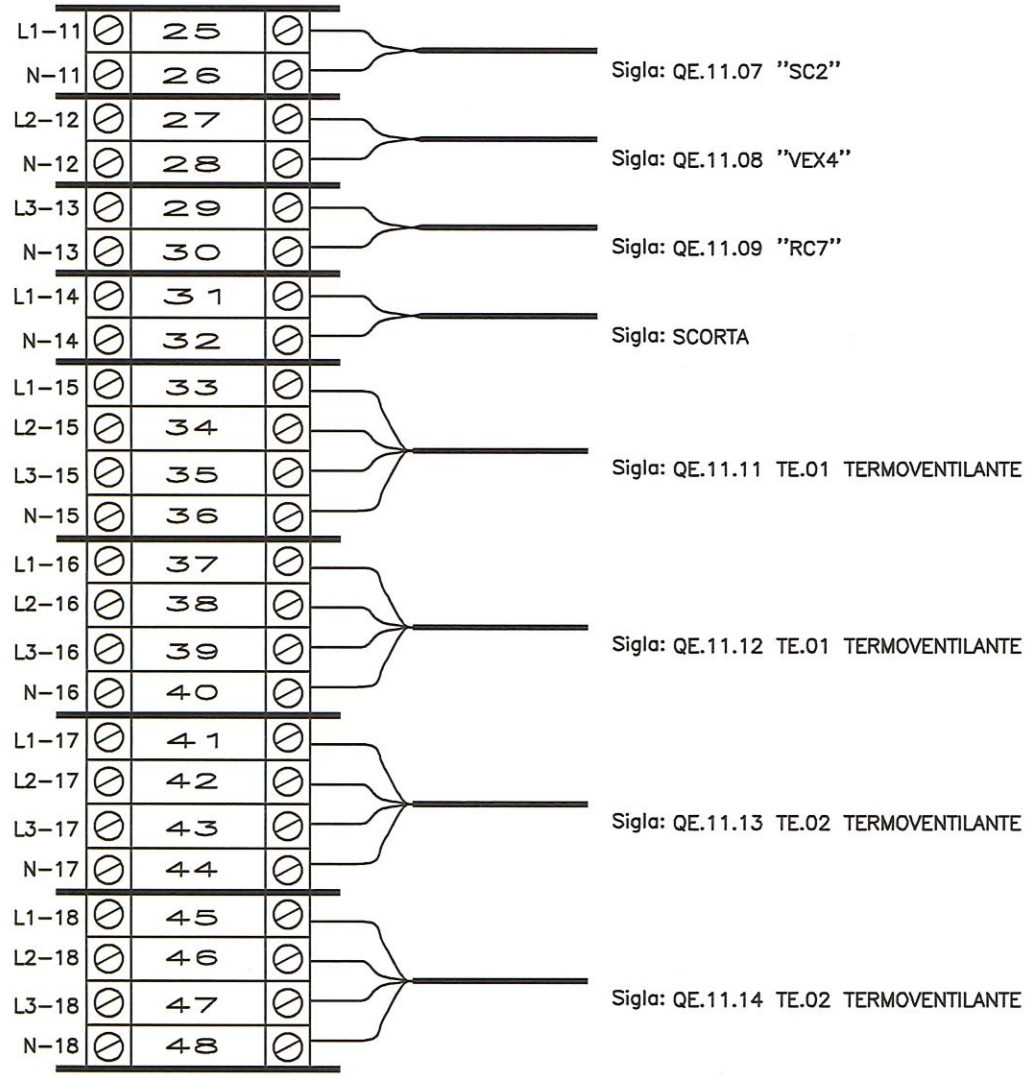


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	201/26			
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP	Cliente	INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C			
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QE11.DWG	Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 5	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1

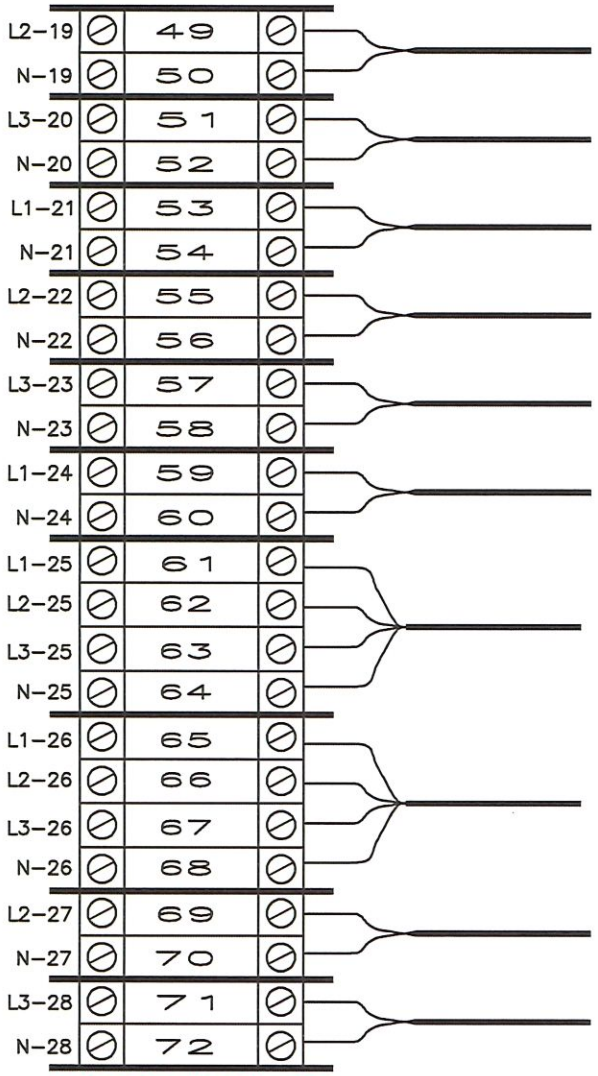

Sigla: QE.11.15 "RC6" VENTILATORE 1

Sigla: SCORTA

Sigla: QE.11.17 "RC4" VENTILATORE 1

Sigla: QE.11.19 "RC5" VENTILATORE 1

Sigla: SCORTA

Sigla: QE.11.21 "SC1"

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA


Sigla: RISERVA

MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 201/26				
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP	Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QE11.DWG	Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 5	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X0



Sigla: COMUNICAZIONE BUS MULTIMETRO

MORSETTIERA X0

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: QUADRO ELETTRICO CDZ P1_ZONA KNAPP SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 201/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE11.DWG Percorso File : QE11.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 5	Rev. 0
