COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE QE14



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DI TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DI POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 25 / 08 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**
COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**
Committente:	**Megawatt S.p.A.** **Via Circumvallazione Esterna,42 – 80025 Casoria (na)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico P1 Zona Produzione**
Locazione del quadro:	**Interporto Campano S.p.A.** **Modulo Nr. 6-7-8-9 Lotto C** **GMM Farma** **Comune di Nola (Na)**
Quadro:	**QE14**
Identificazione del quadro:	**209 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	250A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	15KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	22.5KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	12.4KA

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	31
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	20x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	60
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	2550x2100x655 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	PrismaSet P Schneider-electric S.p:A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9001
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Schneider-electric S.p.A.** serie **PrismaSet P** in lamiera di acciaio trattamento di cataforesi + polvere epossi-poliestere polimerizzata a caldo;

- Trattamento elettroforesi + polveri epossidiche poliestere polimerizzata
- Colore bianco RAL9001
- Tenuta meccanica IK10
- Corrente di tenuta nominale di picco Ipk=220KA

Green Premium

Questa offerta Green Premium vi aiuterà a ridurre i costi e le emissioni di gas serra grazie a un imballaggio più sostenibile realizzato interamente in cartone e senza l'uso di plastica. Eseguire la scansione del codice QR per accedere a tutti i fogli di istruzioni.

Prevenzione degli incendi elettrici

Per prevenire gli incendi di natura elettrica è necessario utilizzare prodotti in grado di comunicare tempestivamente, infatti è proprio la comunicazione la chiave per una prevenzione efficace. Scopri i prodotti Schneider Electric dedicati alla prevenzione verso gli incendi di natura elettrica.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO ELETTRICO P1_ZONA PRODUZIONE - QE14

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
LVS08760	2 pannelli lat. IP30 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08721	2 chiusure later zoccol P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	SCHNEIDER
LVS03220	Otturatore M9 L1000	2	SCHNEIDER
LVS04512	Barra preforata PE 25X5	2	SCHNEIDER
LVS04657	3 Supporti PE Verticale	3	SCHNEIDER
LVS03402	Guida app. modul regolabile PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS04226	2 Guide modulari L1600mm	3	SCHNEIDER
LVS08604	Struttura L400 P600 PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS08641	Green Bar L400mm PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS08634	Tetto IP30 L400 P600 PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS08514	Porta piena IP30 L400 PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS08734	Pannello fondo IP30 L400 PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS08724	Zoccolo H100 L400 PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS08711	Kit guarnizioni IP31 PrismaSeT P	4	SCHNEIDER
LVS08608	Struttura L800 P600	1	SCHNEIDER
LEEB3636N	Kit 36 moduli PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08921	20 viti+Dadi/Struttura	1	SCHNEIDER
LVS08643	Green Bar L800mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08638	Tetto IP30 L800 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08538	Porta trasp. IP30 L800 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08738	Pannello fondo IP30 L800 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08728	Zoccolo H100 L800 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08700	4 anelli di sollevamento PrismaSeT P	2	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	7	SCHNEIDER
LVS03216	Piastra frontale modulare 3M L850	1	SCHNEIDER
LVS03007	Guida app. modulare regolabile L850	2	SCHNEIDER
LVS03218	Piastra frontale modulare 5M L850	1	SCHNEIDER
LGY416048	MORSETTIERA TETRAPOLARE 160A 4x12 FORI	2	SCHNEIDER
LGYN12512	BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 125A	2	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	7	SCHNEIDER
LVS08606	Struttura L650 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08566	1ornice supporto piastre frontali L650	1	SCHNEIDER
LVS08642	Green Bar L650mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08636	Tetto IP30 L650 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08536	Porta trasp. IP30 L650 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08736	Pannello fondo IP30 L650 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08726	Zoccolo H100 L650 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS03401	Guida app. modulari PrismaSeT P	9	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	9	SCHNEIDER
LGY412560	MORSETTIERA TETRAPOLARE 4x15 FORI	1	SCHNEIDER
LGYN12515	BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 125A	1	SCHNEIDER

LVS08603	Struttura L300 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08640	Green Bar L300mm PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08633	Tetto IP30 L300 P600 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08513	Porta piena IP30 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08733	Pannello fondo IP30 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LVS08723	Zoccolo H100 L300 PrismaSeT P	1	SCHNEIDER
LGY4230	Piast supporto connet Rj45 Femmina	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	4	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	2	SCHNEIDER
A9L20600	iPRD20 3P+N 5kA estr. T2	2	SCHNEIDER
A9F79425	iC60N 4P C 25A 6000A	2	SCHNEIDER
A9XMFA04	Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink	7	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	8	SCHNEIDER
A9F89410	iC60H 4P C 10A 10000A	6	SCHNEIDER
A9Q51425	QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo A	8	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	58	SCHNEIDER
A9F89416	iC60H 4P C 16A 10000A	6	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	4	SCHNEIDER
A9F89216	iC60H 2P C 16A 10000A	20	SCHNEIDER
LV426950	Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP-B	4	SCHNEIDER
A9F64210	iC60a 2P C 10A 4500A	5	SCHNEIDER
A9Q51225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo A	39	SCHNEIDER
A9F64216	iC60a 2P C 16A 4500A	2	SCHNEIDER
18896	Int. Aut. NG125NA 4P 125A	1	SCHNEIDER
A9F79416	iC60N 4P C 16A 6000A	2	SCHNEIDER
A9F79216	iC60N 2P C 16A 6000A	17	SCHNEIDER
A9XC2412	Conf. 12 connettori Ti24 a 5 pin	2	SCHNEIDER
A9A15303	iPC 2P+T 16A 250Vca italiana	1	SCHNEIDER
A9MEM3255	iEM3255 3P+N ins.TA, modbus MID	2	SCHNEIDER
METSECT5MA015	TA 150/5 D.27 - sbar 10x32 15x25mm	3	SCHNEIDER
A9XMSB11	Smartlink SI B - Modbus Slave RS485	8	SCHNEIDER
A9MEM1570	PowerTag wirel. F63A 3PN monte valle	3	SCHNEIDER
A9MEM1560	PowerTag wirel. F63A 1PN monte valle	35	SCHNEIDER
PAS600L	EPS Universal B-Pas 24VDC 2DI	2	SCHNEIDER
METSECT5CC013	TA 125/5 cavo D.21mm	3	SCHNEIDER
C124160LS	NSXm 160NA 4P EverLink_T	1	SCHNEIDER
C11E6TM080L	NSXm 16kA TM80D 4P/3R EverLink_T	1	SCHNEIDER
LV426844	Bobina MX 220/240 V CA NSXm PP-B	1	SCHNEIDER
LV481010	RELE VIGI RHB	1	SCHNEIDER
LV481013	TORIDE 120 MM	1	SCHNEIDER
LV481017	KIT CONN	1	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	3	SCHNEIDER
VW3A8306DRC	TERMINALE RC MODBUS CON VITI	1	SCHNEIDER
ACTPC6ASFLS30WE	PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 3m Bia.	1	SCHNEIDER
C12E44V160L	NSXm 16kA Vigi 160A 4P EverLink_T	1	SCHNEIDER
LV429453	OF/SD Wireless NSXm_T	1	SCHNEIDER
METSECT5MA025	TA 250/5 D.27 - sbar 10x32 15x25mm	3	SCHNEIDER
A9F89406	iC60H 4P C 6A 10000A	1	SCHNEIDER

A9Q54425	QuickVigi iC60 4P 25A 300mA Tipo A	1	SCHNEIDER
3107	INS250 fisso ant 4P man nera	1	SCHNEIDER
LVS03030	Piastra di fondo NS-INS250 H fisso/dir	1	SCHNEIDER
LVS03239	Piastra frontale INS250 H 36 mod	1	SCHNEIDER
LVS04172	4 Barre filettate 250A L1400	1	SCHNEIDER
LVS04191	Supp.barre sul fondo G	4	SCHNEIDER
A9XCAL06	Conf. 6 cavi 870mm Ti24 con 2 con. prec.	4	SCHNEIDER
A9XCAM06	Conf. 6 cavi 160mm Ti24 con 2 con. prec.	4	SCHNEIDER

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**209**
Date of document: *Data del documento:*	**25/08/2026**

Customer/*Cliente*:	**Megawatt S.p.A.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**PrismaSet P / Schneider-electric S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**25/08/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**063 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**209/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**QE14**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	250	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	15	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	22,5	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	209/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	209/26 QE14
Schematic dwg. *Schema funzionale*	209/26 QE14
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	209/26 QE14

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function**
  Prove di funzionamento elettrico — CEI EN 61439-2 par. 11.10 — Satisfactory / *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE:

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

QUADRO ELETTRICO

DATI DI TARGA DEL QUADRO

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE	Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	250A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	16
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	31
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	2550x2100x665
MATRICOLA	209/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	


COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :


Descrizione:
Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
DATI DI TARGA

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 2

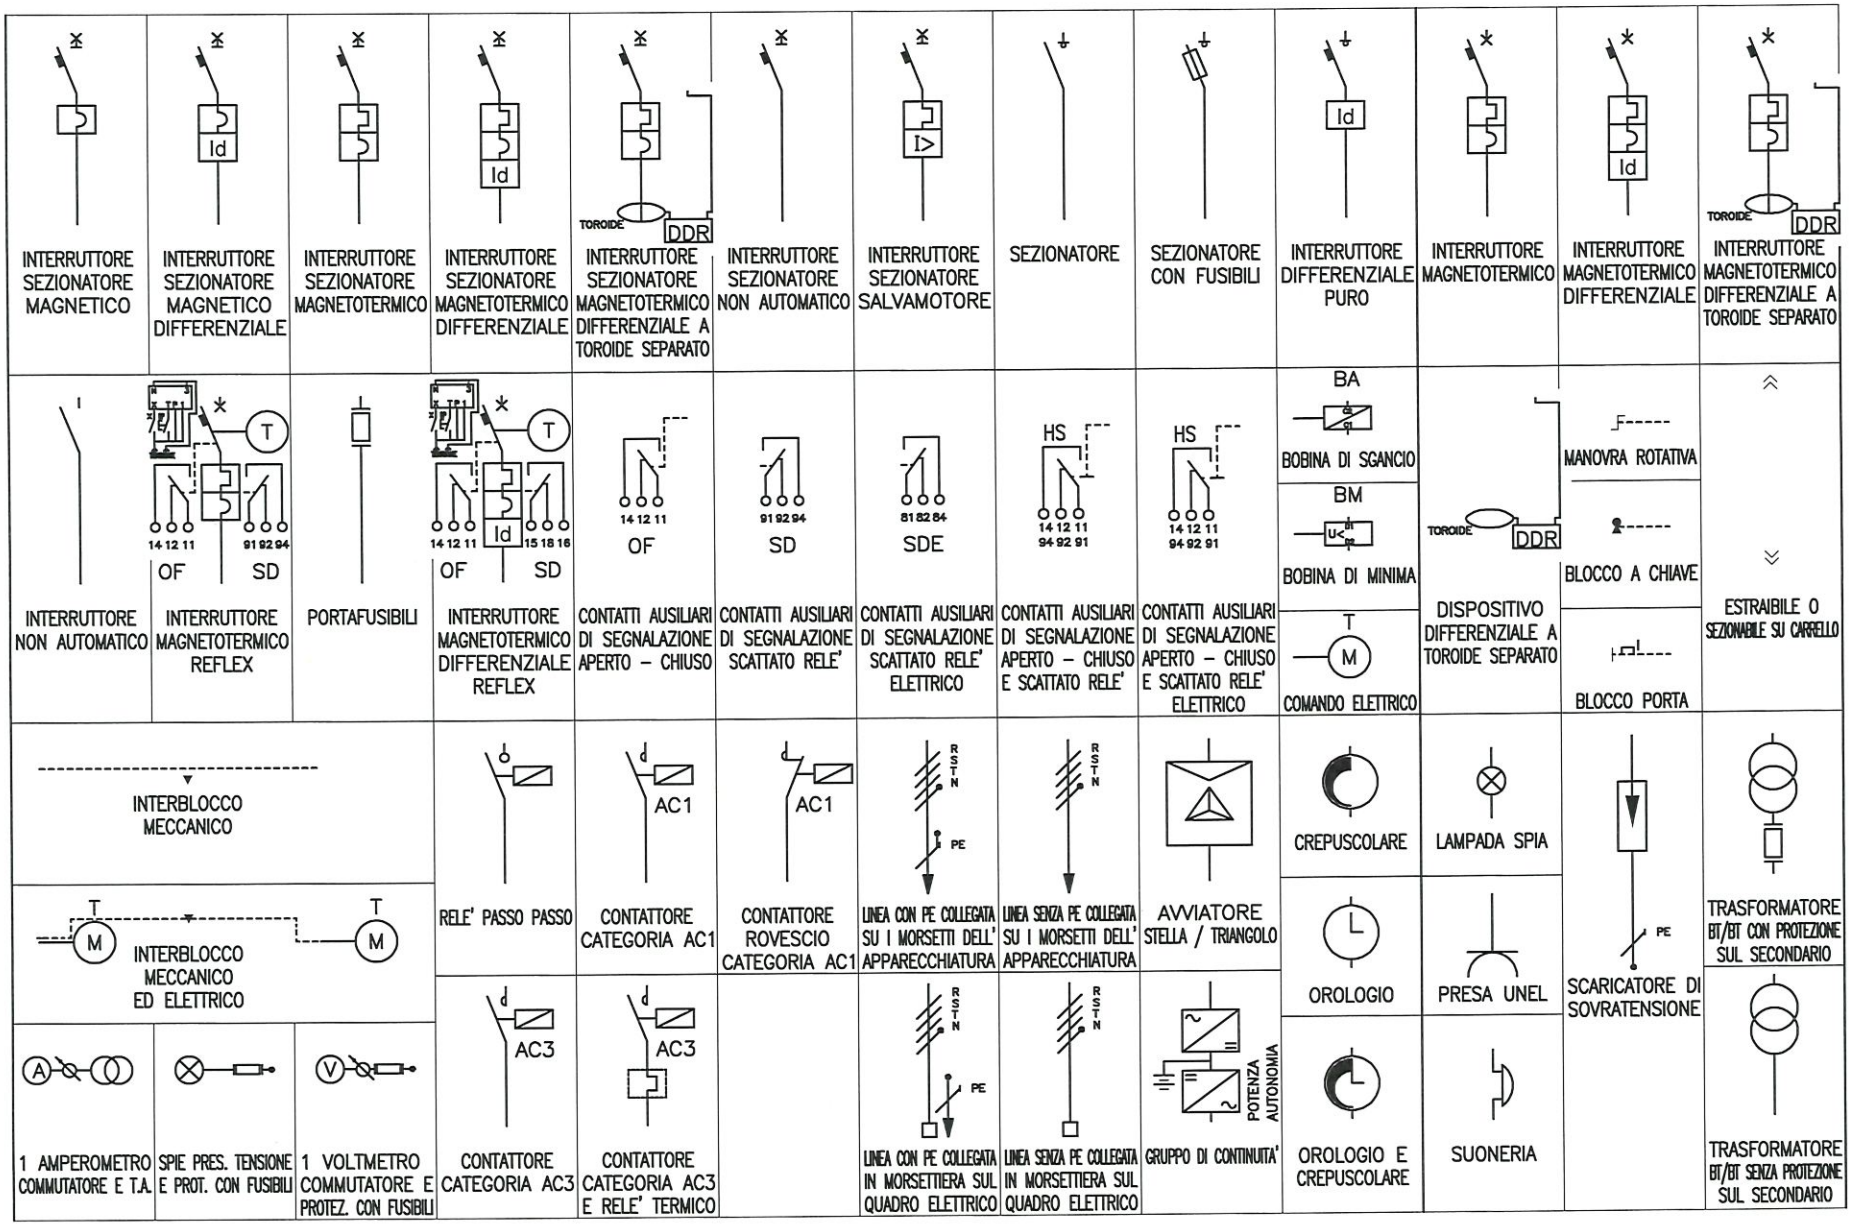

COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
	LEGENDA QUADRO
Matricola	209/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File :	QE14.DWG
Percorso File :	QE14.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	2

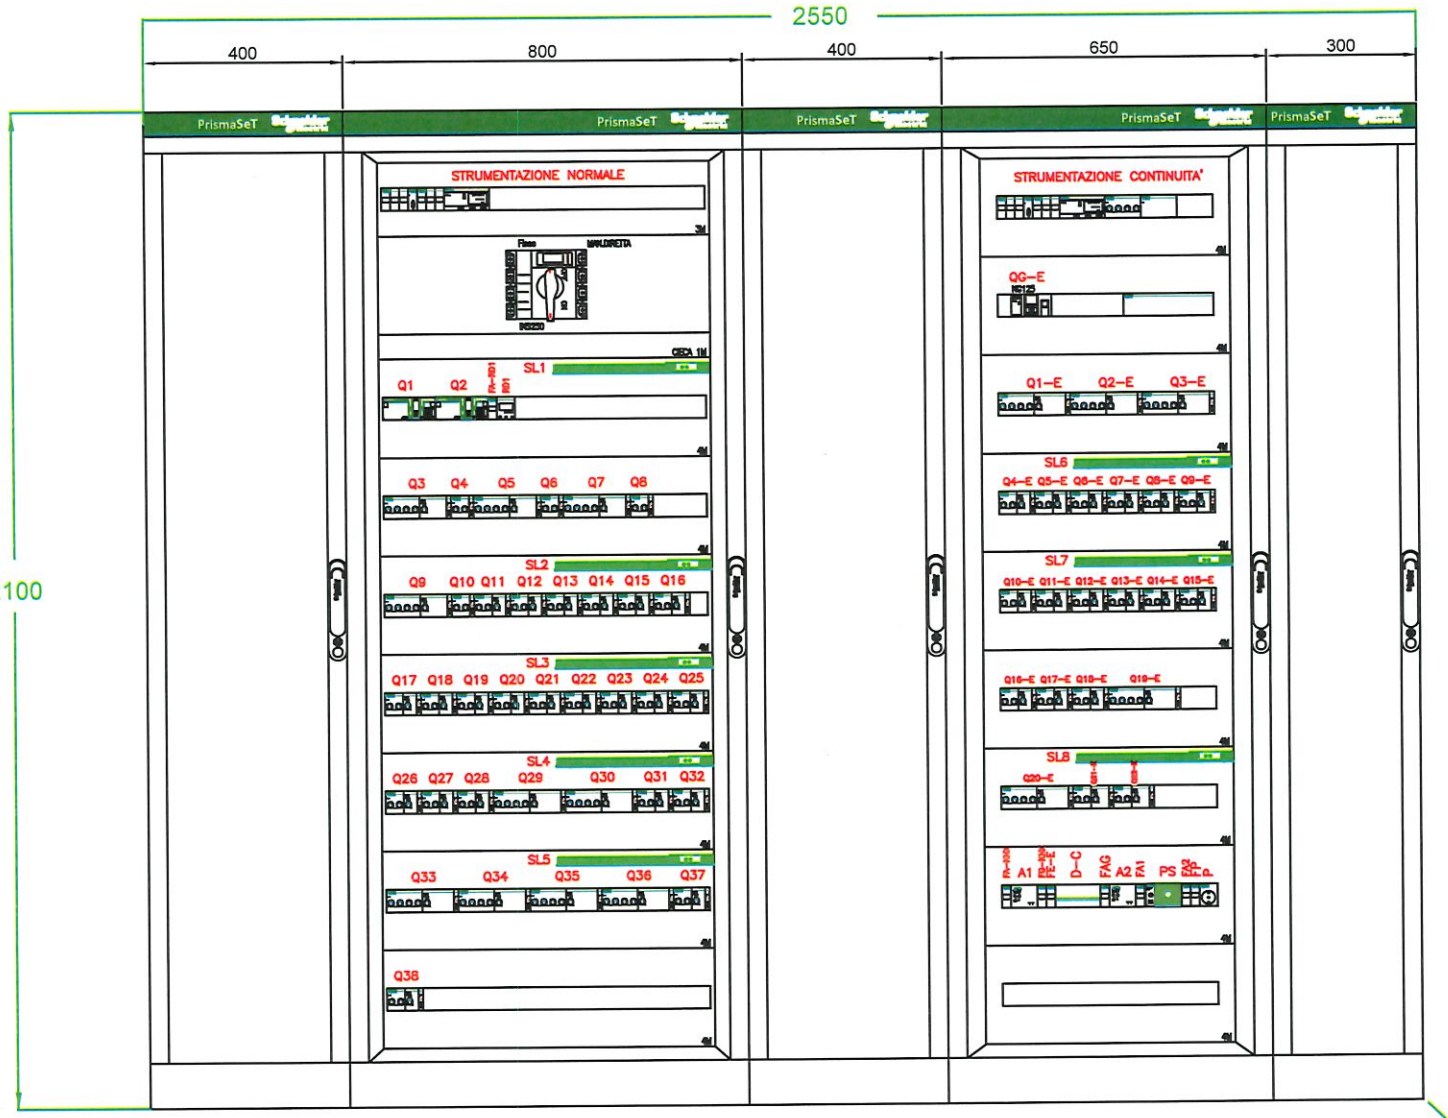

Q.E.
P1_ZONA PRODUZ.-QE14

BRAND	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.
TIPO	PRISMA SET P
GRADO DI PROTEZIONE	IP31
DIMENSIONE BxHxP (mm)	2550x2100x665mm

COMEC s.r.l.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.


Note :

Descrizione:
Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE - QE14
FRONTE QUADRO

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 2

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		FP	FM	QS1	FA–RD1	Q1	Q2		
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

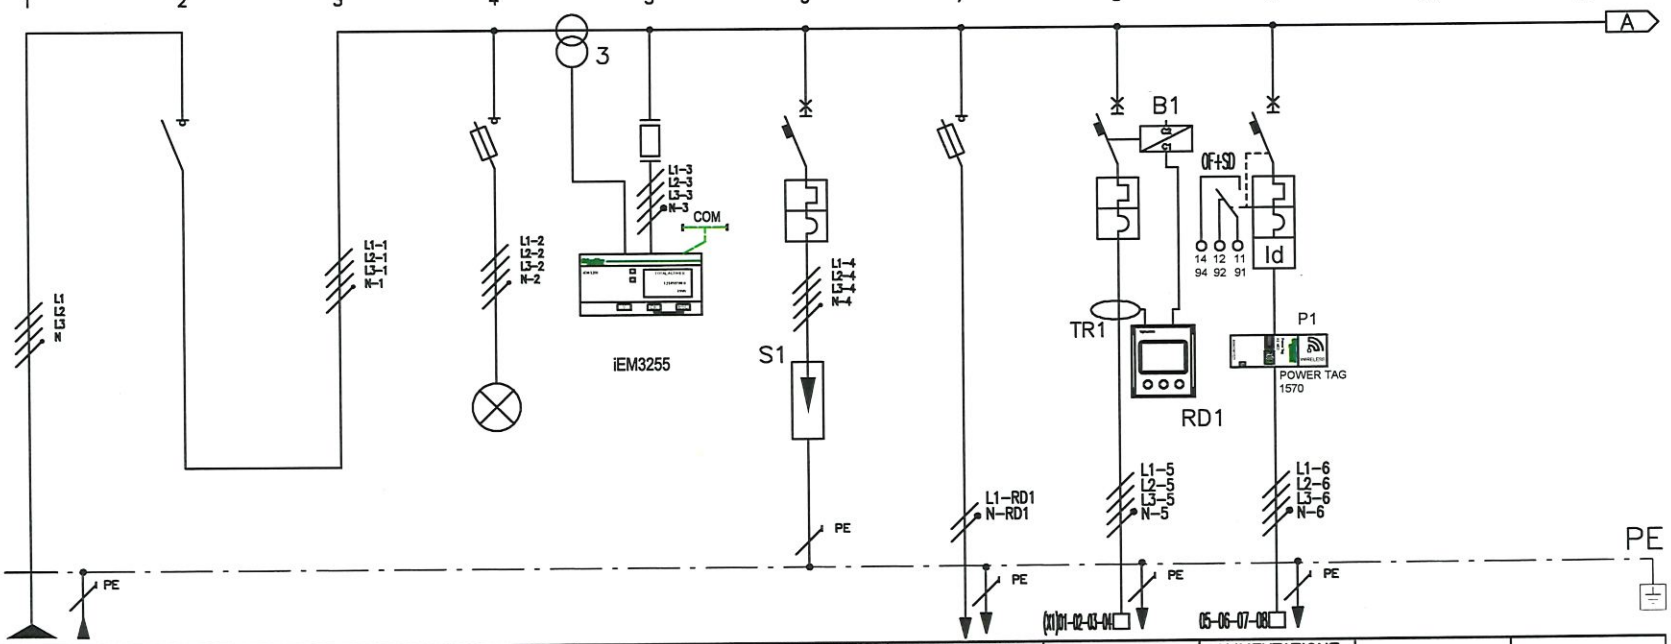

IMPIANTO A MONTE QUADRO GENERALE QE.04	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	12.4 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO	INTERRUTTORE GENERALE SEZ.NORMALE		PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZ.NORMALE	PROTEZIONE STRUM.DI MISURA SEZ.NORMALE	PROTEZIONE S.DI SOVRATENSIONE SEZ.NORMALE	PROTEZIONE RELE' DIFFERENZIALE RD1	A UPS	ALIMENTAZIONE QUADRO QE.14.1		
INTERRUTTORE	TIPO		INS250		STI 3P+N		iC60N	STI 2P	NSXm	NSXm+Vigi		
	P.D.I. (kA)						10		16	16		
	N. POLI x In (A)		4x250				4x25		4x80	4x160		
	CURVA / SGANCIAT.						C		TMD	Mloqic4.1 Vigi		
	SOGLIA Irth (A)						25		80	0,4–1Irth		
	SOGLIA Irm (A)						10Irth		10Irth	1,5–10Irth		
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)									0,03–5		
	RITARDO (ms)									0–1000ms		
	CLASSE									A / AC		
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				3x2+N	3x1 + N		2x2				
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iEM3255	iQuick PRD20r 3P+N 5kA T2					
CONDUTTORE	TIPO	FG16M16				FS17		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x120+PE				4x2,5			4x25+PE	4x95+PE		
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	70							5	80		
	Ib (A) Iz (A)	174,4							73	46,2		
	Un (V) Pn (kW)	400	112,8					230	400 50	400 27,6		
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI									CONT. AUX DI STATO	CONTATTO DI STATO E SCATTATO POWER TAG		
NOTE						T.A. – 250/5A						

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)


IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 1 DI 11 | Ed. 2

Disegnatore : F.D.M. | File: QE14.DWG

TAVOLA


NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q3 · Q4 · Q5 · Q6
NOME PROGETTO	INTERPORTO CAMPANO

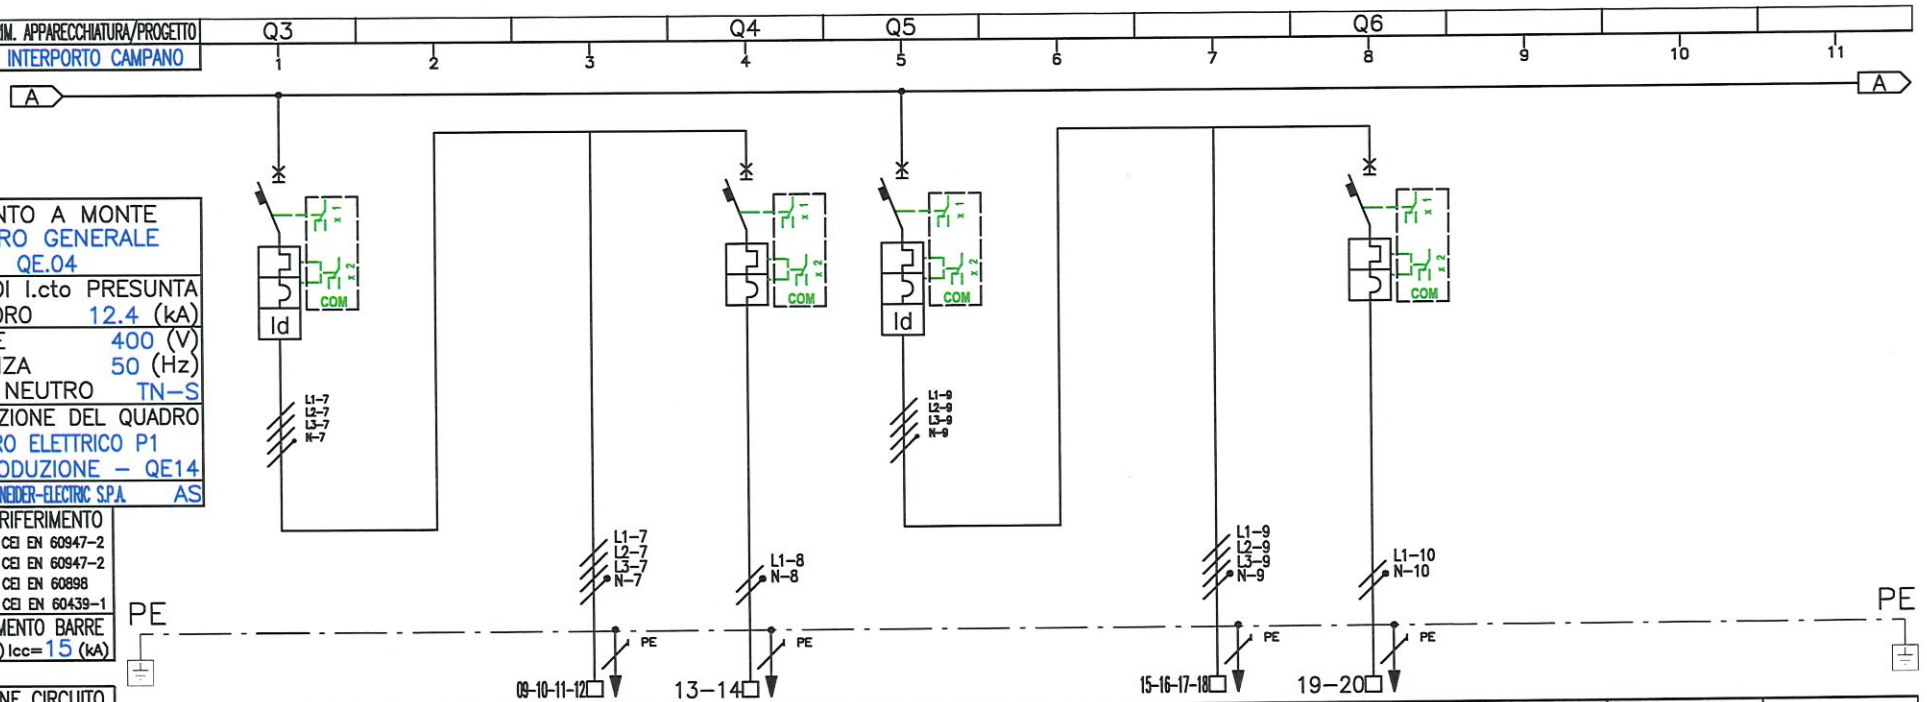

IMPIANTO A MONTE	QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	12.4 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2; INT. MODULARI CEI EN 60947-2, CEI EN 60898; CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)


| NUMERAZIONE CIRCUITO | | |

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q7			Q8	Q9			Q10	Q11	Q12	Q13
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

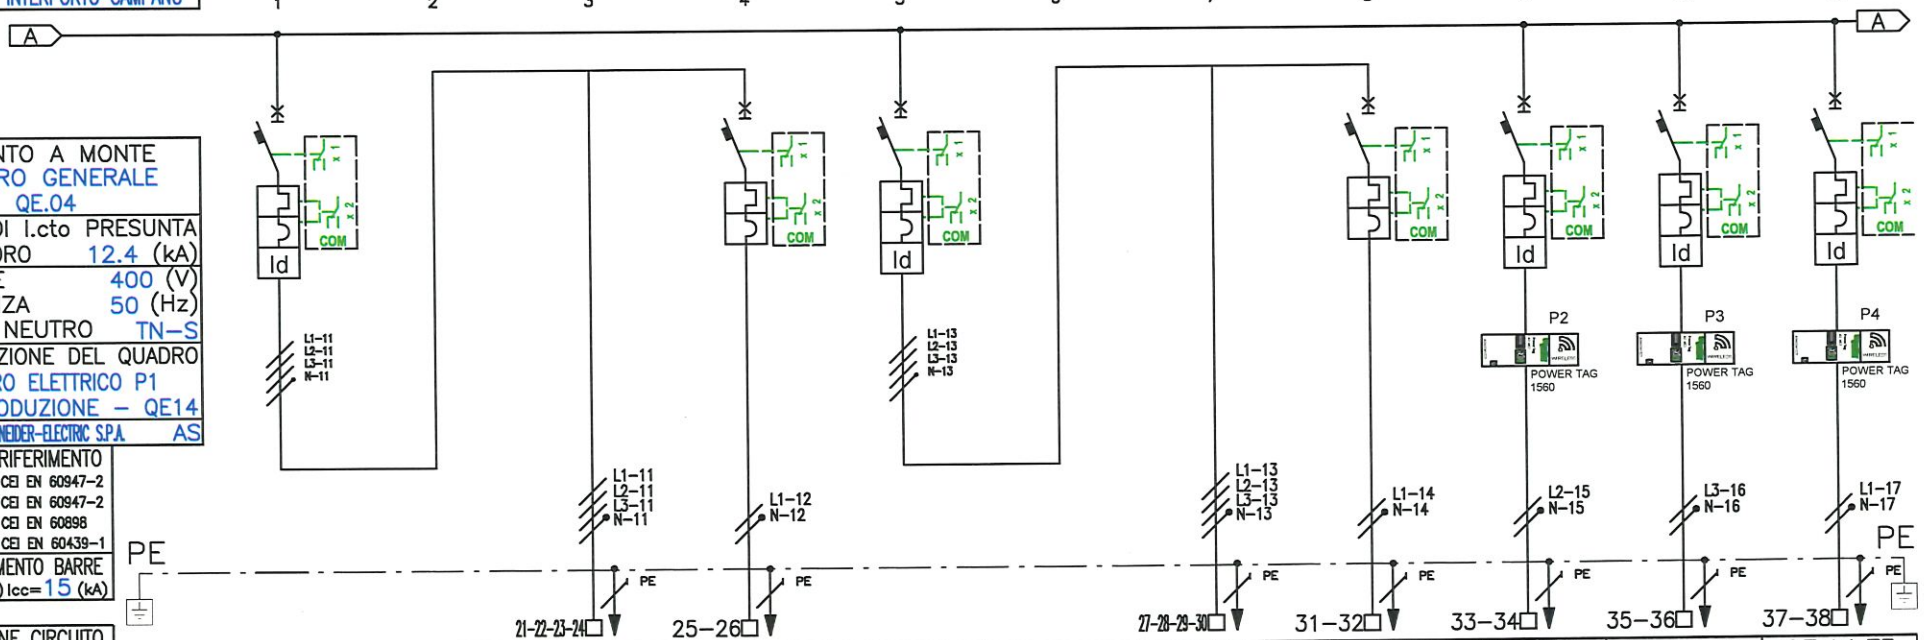

IMPIANTO A MONTE	QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	12.4 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)

| NUMERAZIONE CIRCUITO | | |

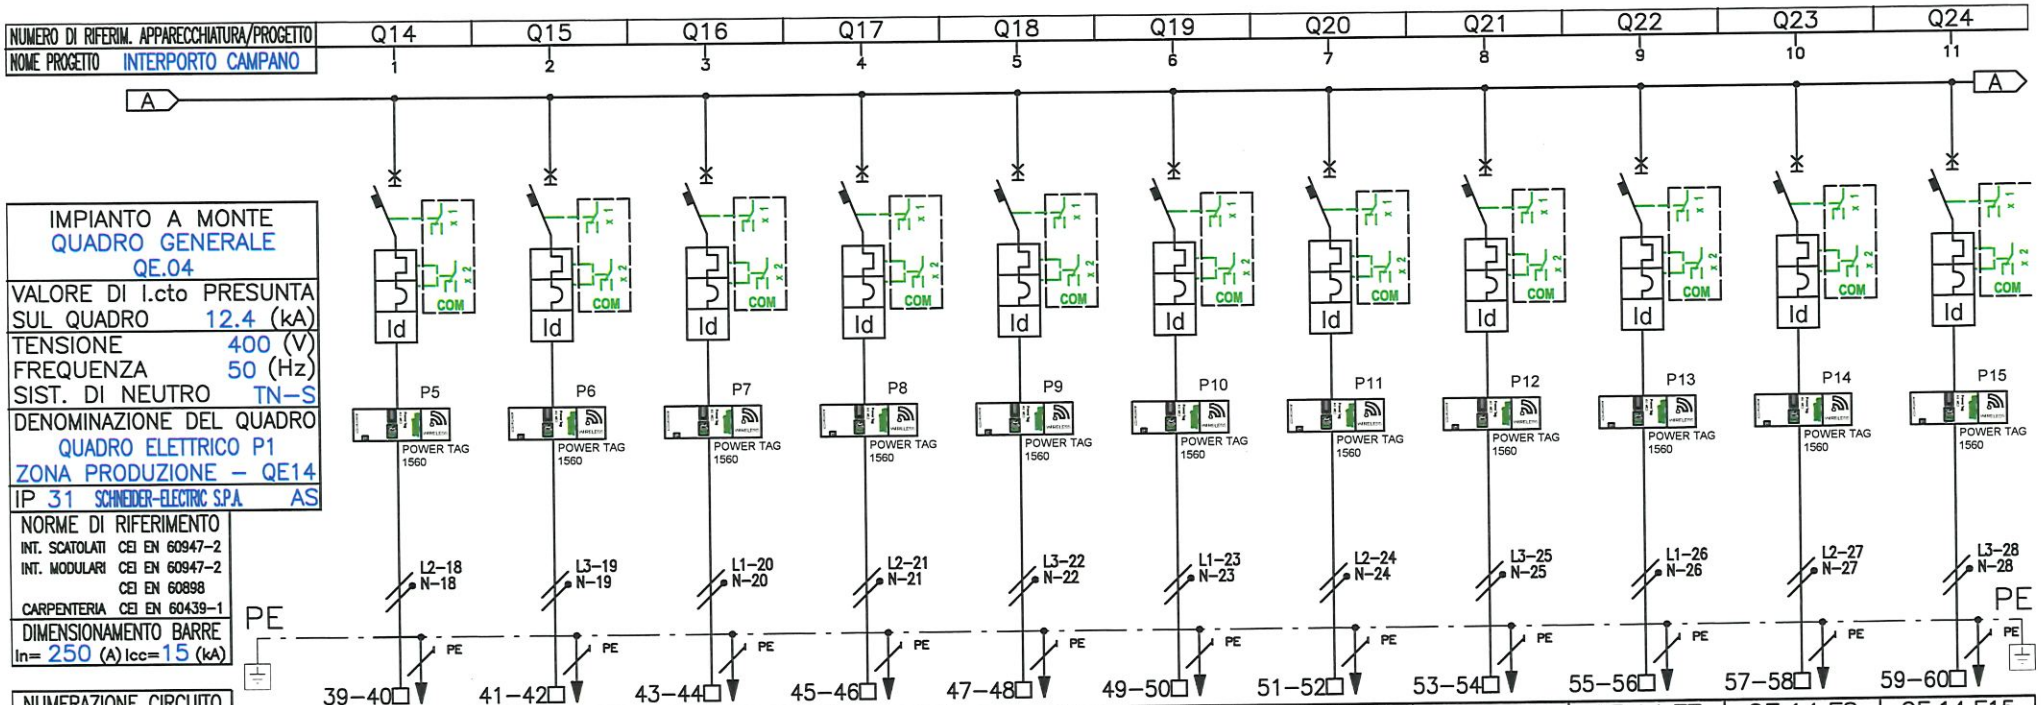

IMPIANTO A MONTE	QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	12.4 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO	INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2; INT. MODULARI CEI EN 60947-2, CEI EN 60898; CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		QE.14.F4	QE.14.F10	QE.14.F11	QE.14.F12	QE.14.F13	QE.14.F14	QE.14.F5	QE.14.F6	QE.14.F7	QE.14.F8	QE.14.F15
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		FM GRUPPO PRESE LATO DX	FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)	FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)	FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)	FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)	FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)	FM GRUPPO PRESE LATO SX	FM GRUPPO PRESE LATO SX	FM GRUPPO PRESE LATO SX	FM GRUPPO PRESE LATO SX	FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO SX)
INTERRUTTORE	TIPO	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi
	P.D.I. (kA)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x6+PE	2x10+PE	2x10+PE	2x10+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x10+PE	2x10+PE	2x10+PE	2x10+PE	2x10+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	50	55	60	65	70	80	85	85	90	95	100
	Ib (A) Iz (A)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	Un (V) Pn (kW)	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Parisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 4 DI 11 | Ed. 2
Disegnatore : F.D.M. | File: QE14.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

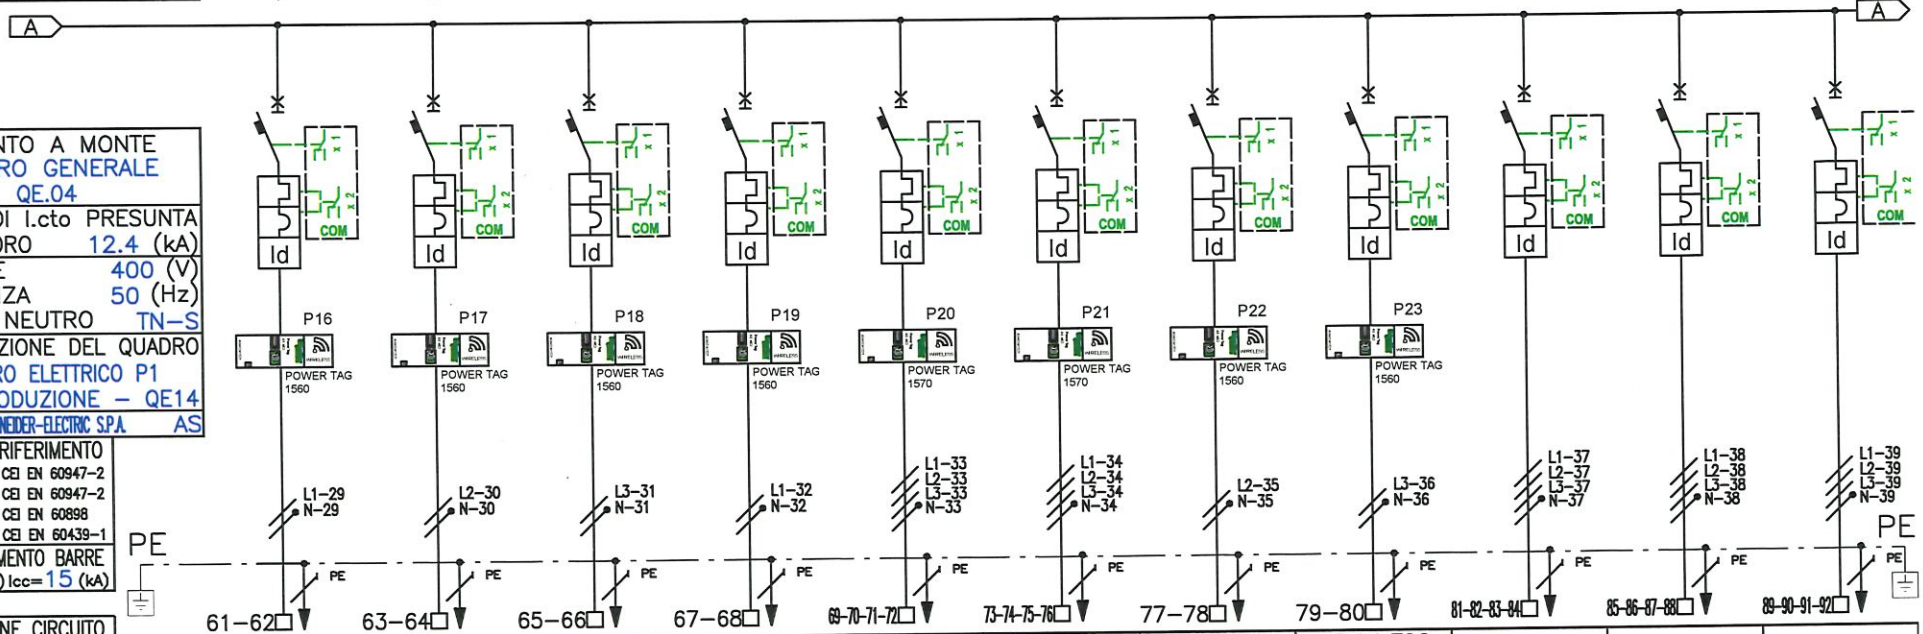

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 12.4 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO P1
ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		QE.14.F16 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)		QE.14.F17 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)		QE.14.F18 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)		QE.14.F19 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)		QE.14.F20 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)		QE.14.F21 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO SX)		QE.14.F9 FM LAVAGGIO		QE.04.F22 CDZ LOCALE QUADRI		RISERVA		RISERVA		RISERVA	
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO																							
INTERRUTTORE	TIPO	iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi		iC60H+Vigi	
	P.D.I. (kA)	30		30		30		30		15		15		30		30		15		15		15	
	N. POLI x In (A)	2x16		2x16		2x16		2x16		4x16		4x16		2x16		2x16		4x10		4x10		4x16	
	CURVA / SGANCIAT.	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
	SOGLIA Irth (A)	16		16		16		16		16		16		16		16		10		10		16	
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,3	
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		SELETTIVO	
	CLASSE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)																						
	N. POLI x In (A)																						
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)																						
FUSIBILE	N. POLI x In (A)																						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO																						
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16		FG160M16		FG160M16		FG160M16		FG160M16		FG160M16		FG160M16		FG160M16							
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	2x10+PE		2x10+PE		2x10+PE		2x10+PE		5G6		5G6		2x10+PE		2x4+PE							
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	105		105		105		105		70		90		105		10							
	Ib (A) Iz (A)	7,2		7,2		7,2		7,2		4,8		4,8		7,2		4,8							
	Un (V) Pn (kW)	230	1,5	230	1,5	230	1,5	230	1,5	400	3	400	3	230	1,5	230	1	400		400		400	
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%																						
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM		CONTATTO COM		CONTATTO COM	
NOTE																							

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 5 DI 11 | Ed. 2
Disegnatore : F.D.M. | File: QE14.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q36	Q37	Q38								
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

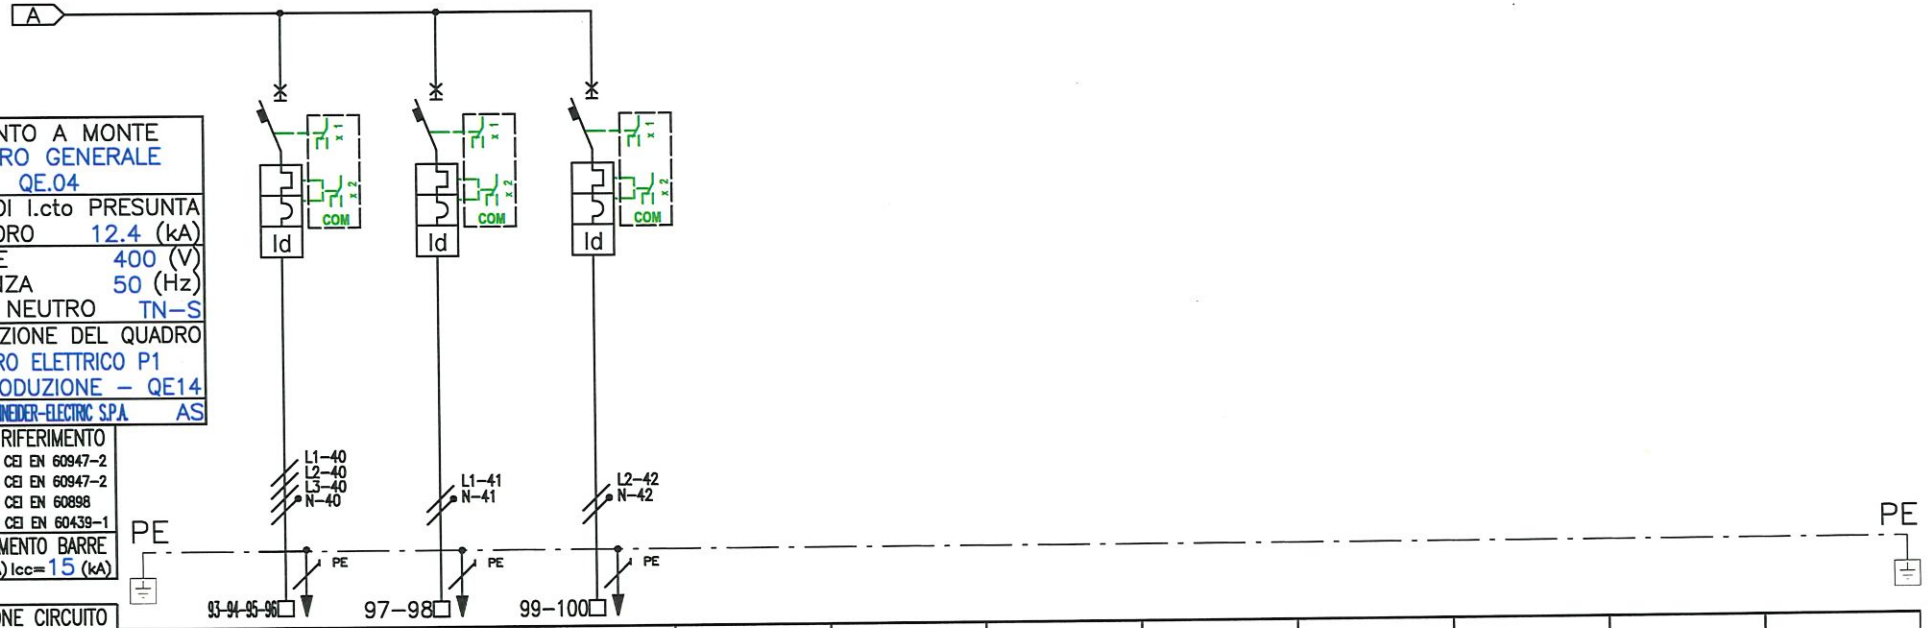

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE
QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 12.4 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO P1
ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947–2
INT. MODULARI CEI EN 60947–2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		RISERVA	RISERVA	RISERVA								
INTERRUTTORE	TIPO	iC60H+Vigi	iC60a+Vigi	iC60a+Vigi								
	P.D.I. (kA)	15	10	10								
	N. POLI x In (A)	4x16	2x16	2x10								
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C								
	SOGLIA Irth (A)	16	16	10								
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth								
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3	0,03	0,03								
	RITARDO (ms)	SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO								
	CLASSE	A	A	A								
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)		2x4+PE	2x4+PE								
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400	230	230								
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM								
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 6 DI 11	Ed. 2
Disegnatore : F.D.M.	File: QE14.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL–E	QG–E		FP–E	FM1–E	QS1–E	Q1–E	Q2–E	Q3–E	Q4–E	Q5–E
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

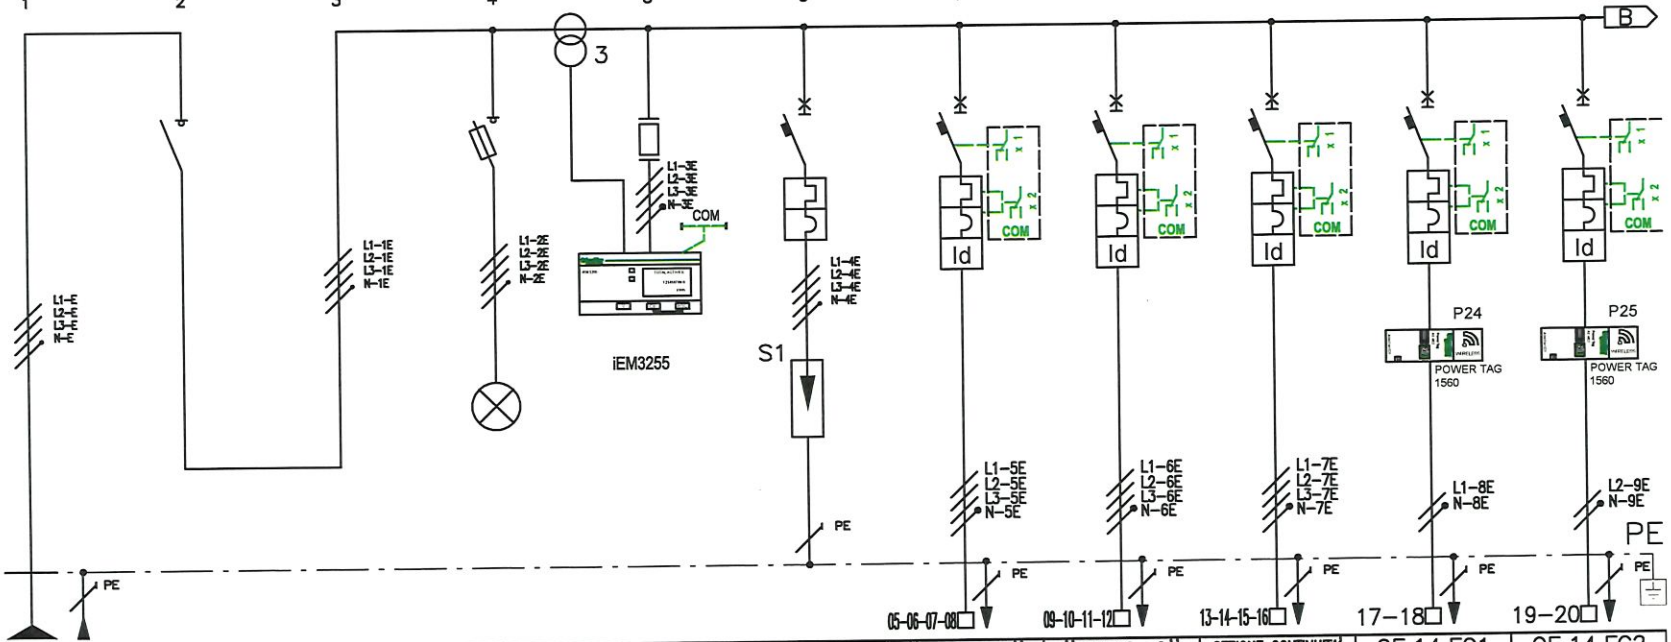

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 12.4 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947–2
INT. MODULARI CEI EN 60947–2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 250 (A) Icc= 15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE CONTINUITA'		PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZIONE CONTINUITA'	PROTEZIONE STRUM.DI MISURA SEZIONE CONTINUITA'	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZIONE CONTINUITA'	"QE.09–C" QUADRO ELETTRICO PT ZONA UFFICI	"QE.12–C" QUADRO ELETTRICO P1 ZONA UFFICI	SEZIONE CONTINUITA' QE.14.1	QE.14.FC1 GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.FC2 GRUPPO PRESE LATO DX
	TIPO		NSXm		STI 3P+N		iC60N	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi
	P.D.I. (kA)						10	15	15	15	20	20
INTERRUTTORE	N. POLI x In (A)		4x125				4x25	4x6	4x16	4x16	2x16	2x16
	CURVA / SGANCIAT.						C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)						25	6	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)							0,3	0,3	0,3	0,03	0,03
	RITARDO (ms)							SELETTIVO	SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE							A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				3x2+N	3x1 + N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iEM3255	iQuick PRD20r 3P+N 5kA T2					
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16				FS17		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x25+PE				4x2,5		4x25+PE	4x25+PE	4x6+PE	2x6+PE	2x6+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	5						90	90	1	40	45
	Ib (A) Iz (A)	48,1						4,8	9,6	9,6	4,8	4,8
	Un (V) Pn (kW)	400	29					400 3	400 5	400 6	230 1	230 1
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI								CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE						T.A. – 125/5A						

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 7 DI 11 | Ed. 2
Disegnatore : F.D.M. | File: QE14.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q6–E	Q7–E	Q8–E	Q9–E	Q10–E	Q11–E	Q12–E	Q13–E	Q14–E	Q15–E	Q16–E
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

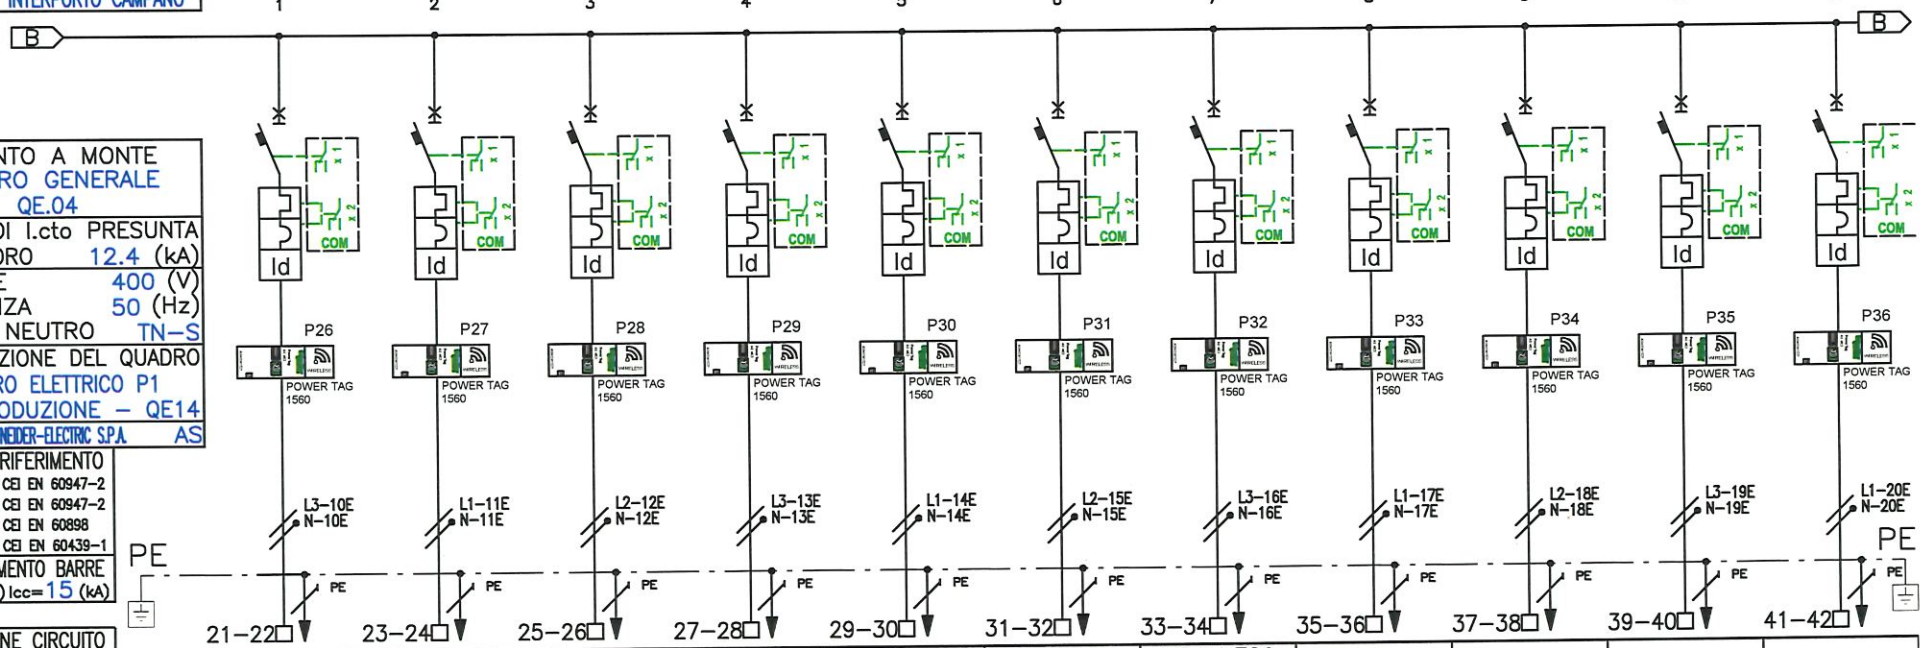

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 12.4 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO P1
ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947–2
INT. MODULARI CEI EN 60947–2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		QE.14.FC3 GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.FC4 GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.FC5 GRUPPO PRESE LATO SX	QE.14.FC6 GRUPPO PRESE LATO SX	QE.14.FC7 GRUPPO PRESE LATO SX	QE.14.FC8 GRUPPO PRESE LATO SX	QE.14.FC9 LAVAGGIO	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE
INTERRUTTORE	TIPO	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi
	P.D.I. (kA)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x10+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	50	55	80	80	85	90	105	60	70	95	100
	Ib (A) Iz (A)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Un (V) Pn (kW)	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE												


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081 8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C*

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q17–E	Q18–E	Q19–E	Q20–E	Q21–E	Q22–E	FA–KNX	A1		FG–KNX	FE–E
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

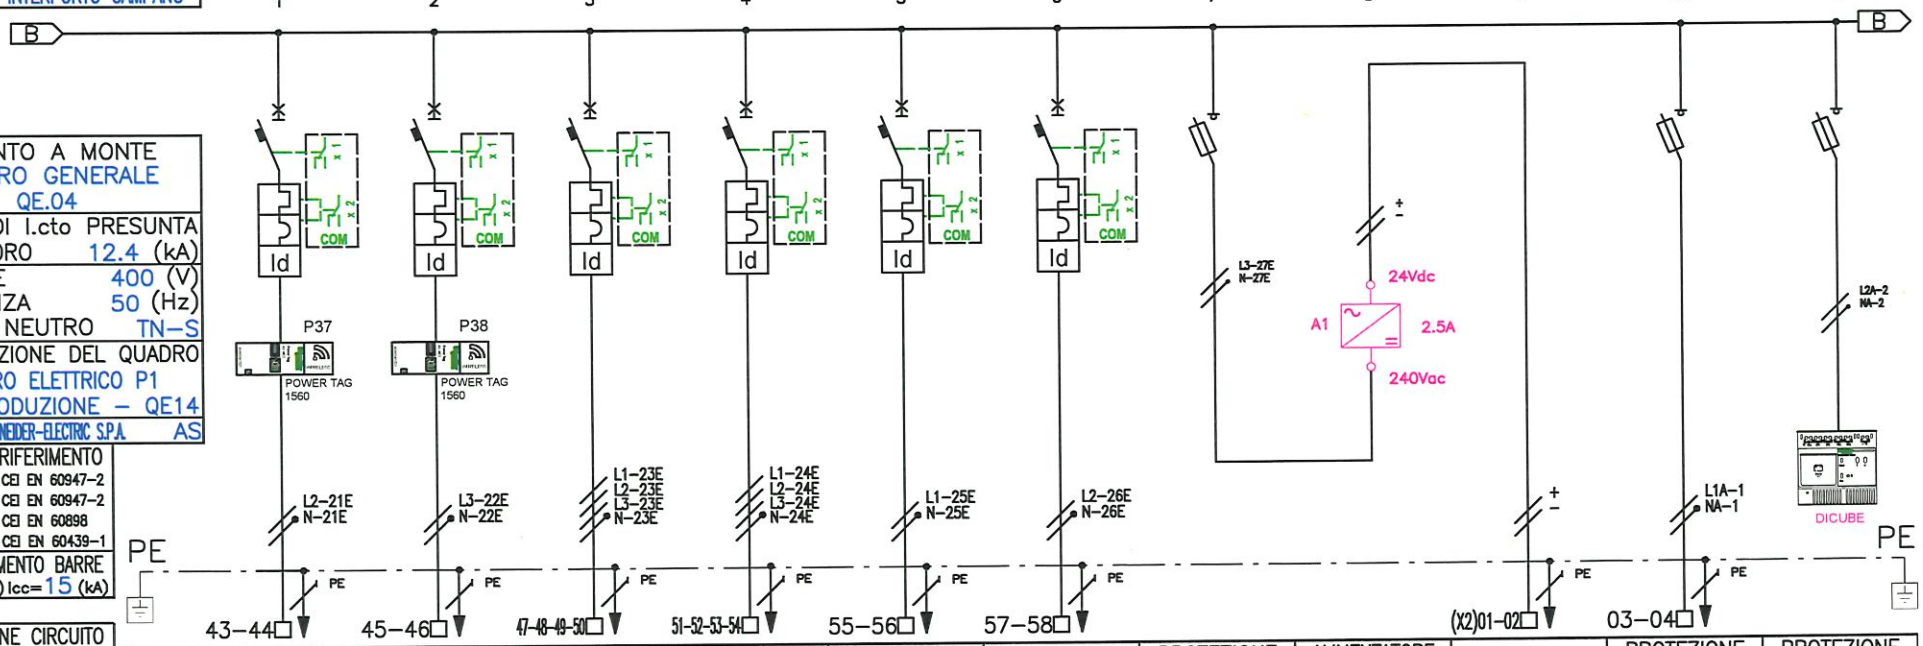

IMPIANTO A MONTE	QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	12.4 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO P1 ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	PROTEZIONE ALIMENTATORE IMP. KNX	ALIMENTATORE 230/24Vdc KNX		PROTEZIONE GATAWAY DALI KNX	PROTEZIONE CENTRALINA DICUBE ILLUMINAZIONE EMERGENZA
INTERRUTTORE	TIPO	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	STI 2P			STI 2P	STI 2P
	P.D.I. (kA)	20	20	10	10	20	20					
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	4x16	4x16	2x16	2x16					
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C					
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16					
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth					
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03					
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO					
	CLASSE	A	A	A	A	A	A					
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)							2x2			2x2	2x2
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16	FG16OM16								FG16OM16	
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	2x6+PE	2x6+PE									
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	65	105									
	Ib (A) Iz (A)	4,8	4,8									
	Un (V) Pn (kW)	230 1	230 1	400	400	230	230				230	
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM					
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 9 DI 11	Ed. 2
Disegnatore : F.D.M.	File: QE14.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FAG	A2	FA1	FA2							
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

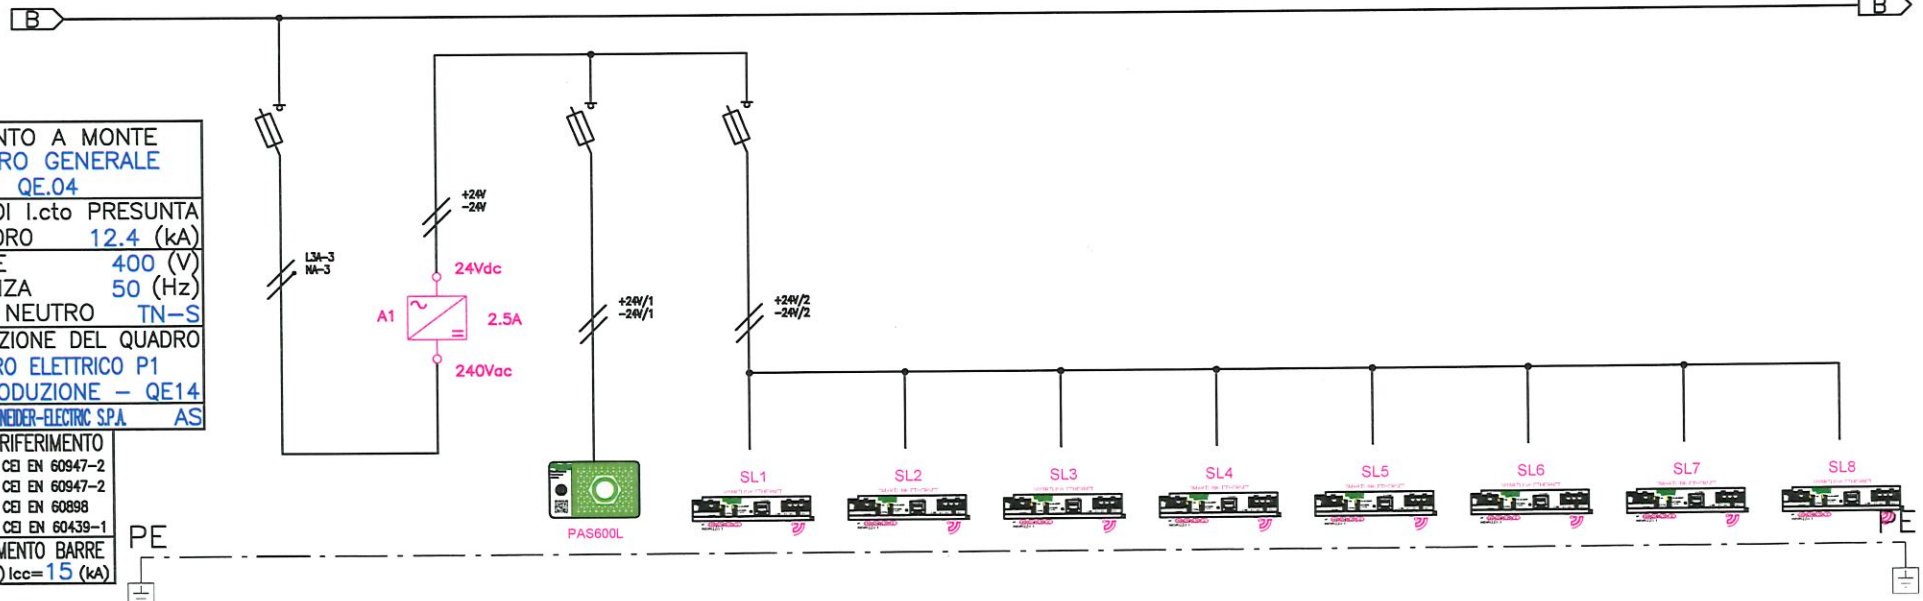

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 12.4 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO P1
ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 250 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE ALIMENTATORE 24Vdc MODBUS	ALIMENTATORE 230/24Vdc MODBUS	PROTEZIONE PANEL SERVER	PROTEZIONE SMARTLINK							
INTERRUTTORE	TIPO	STI 2P		STI 2P	STI 2P							
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x2		2x2	2x2							
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)											
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 10 DI 11	Ed. 2
Disegnatore : F.D.M.	File: QE14.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FAP										
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

B

L1-2SE
N-2SE

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE QE.04
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 12.4 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO P1
ZONA PRODUZIONE – QE14
IP 31 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 250 (A) Icc=15 (kA)

PE

PE

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PRESA DI SERVIZIO										
INTERRUTTORE	TIPO	STI 2P										
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x2										
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)											
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*


DATA 22/04/26	PAG. 11 DI 11	Ed. 2
Disegnatore : F.D.M.	File: QE14.DWG	





TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	SEZIONATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC s.r.l.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :


Descrizione:
Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE - QE14
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 22
Rev. 2

DISTRIBUZIONE MOD BUS


MULTIMETRO SEZIONE NORMALE

PANEL SERVER

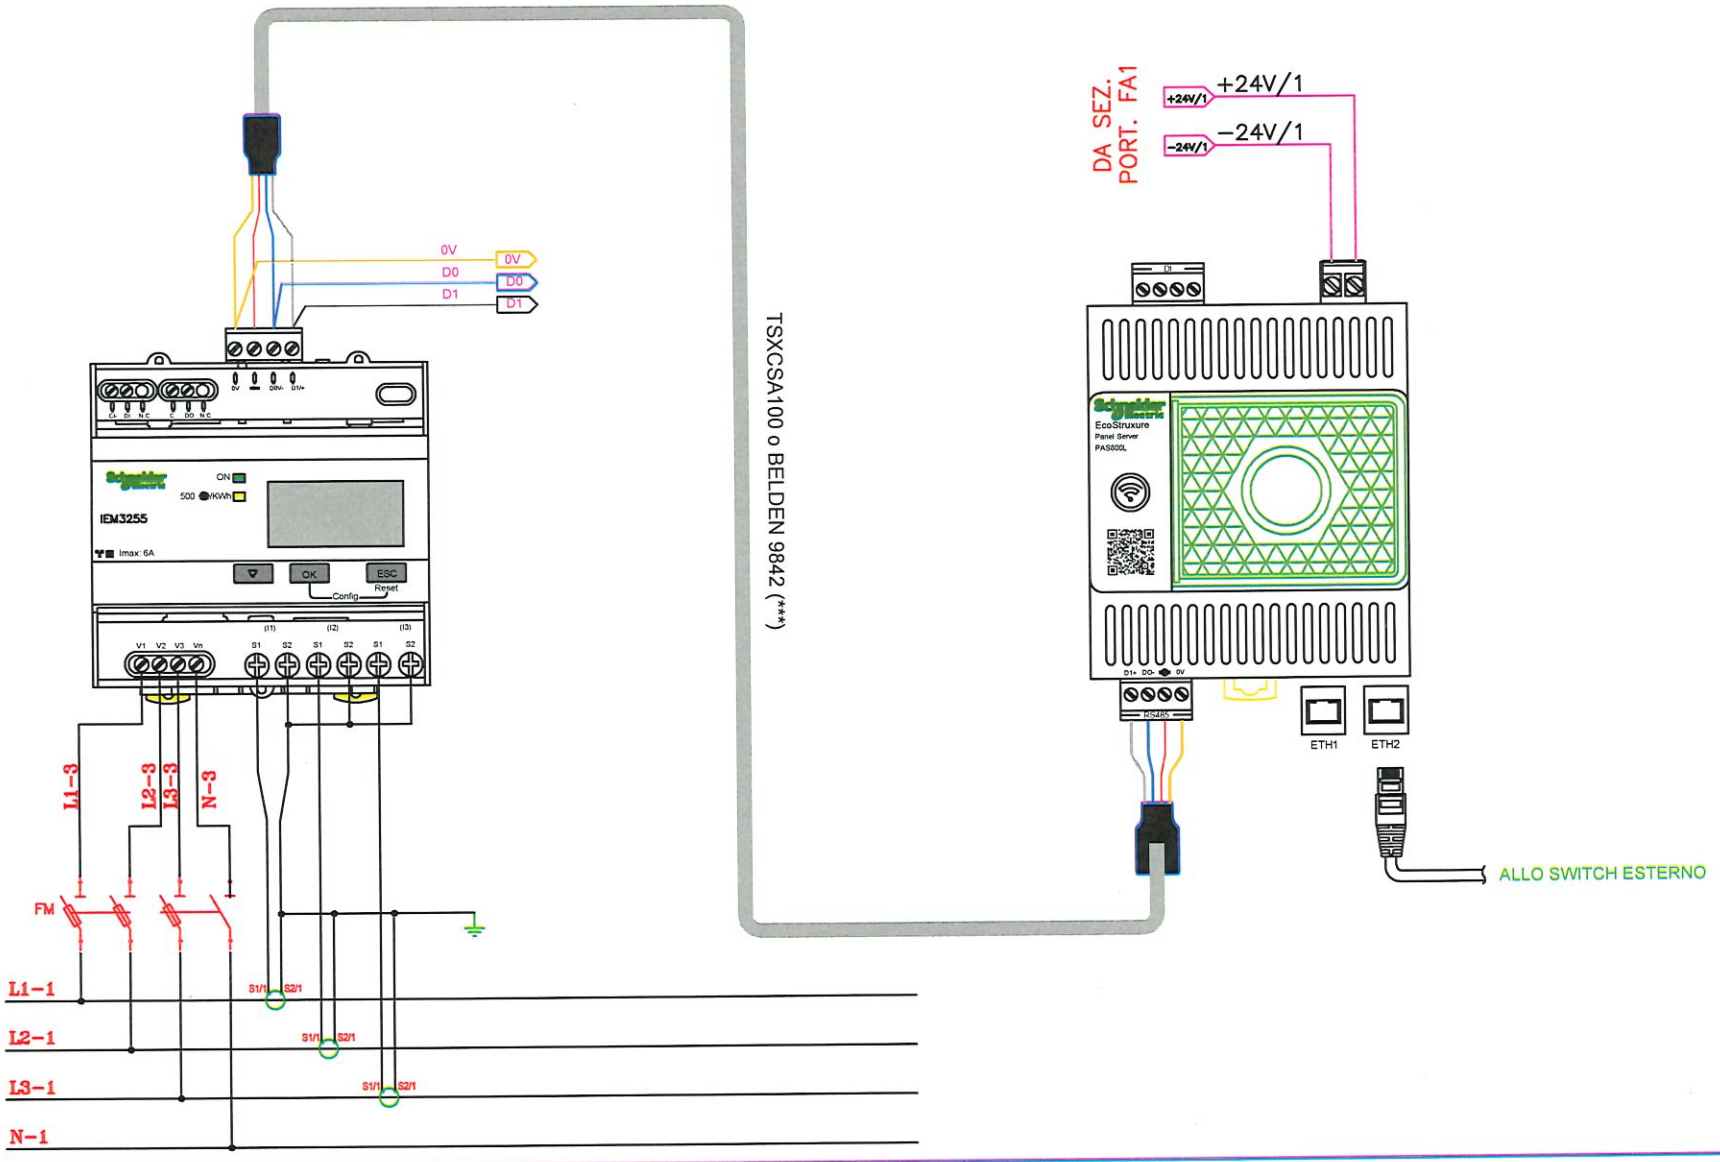

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 22	Rev. 2


ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK

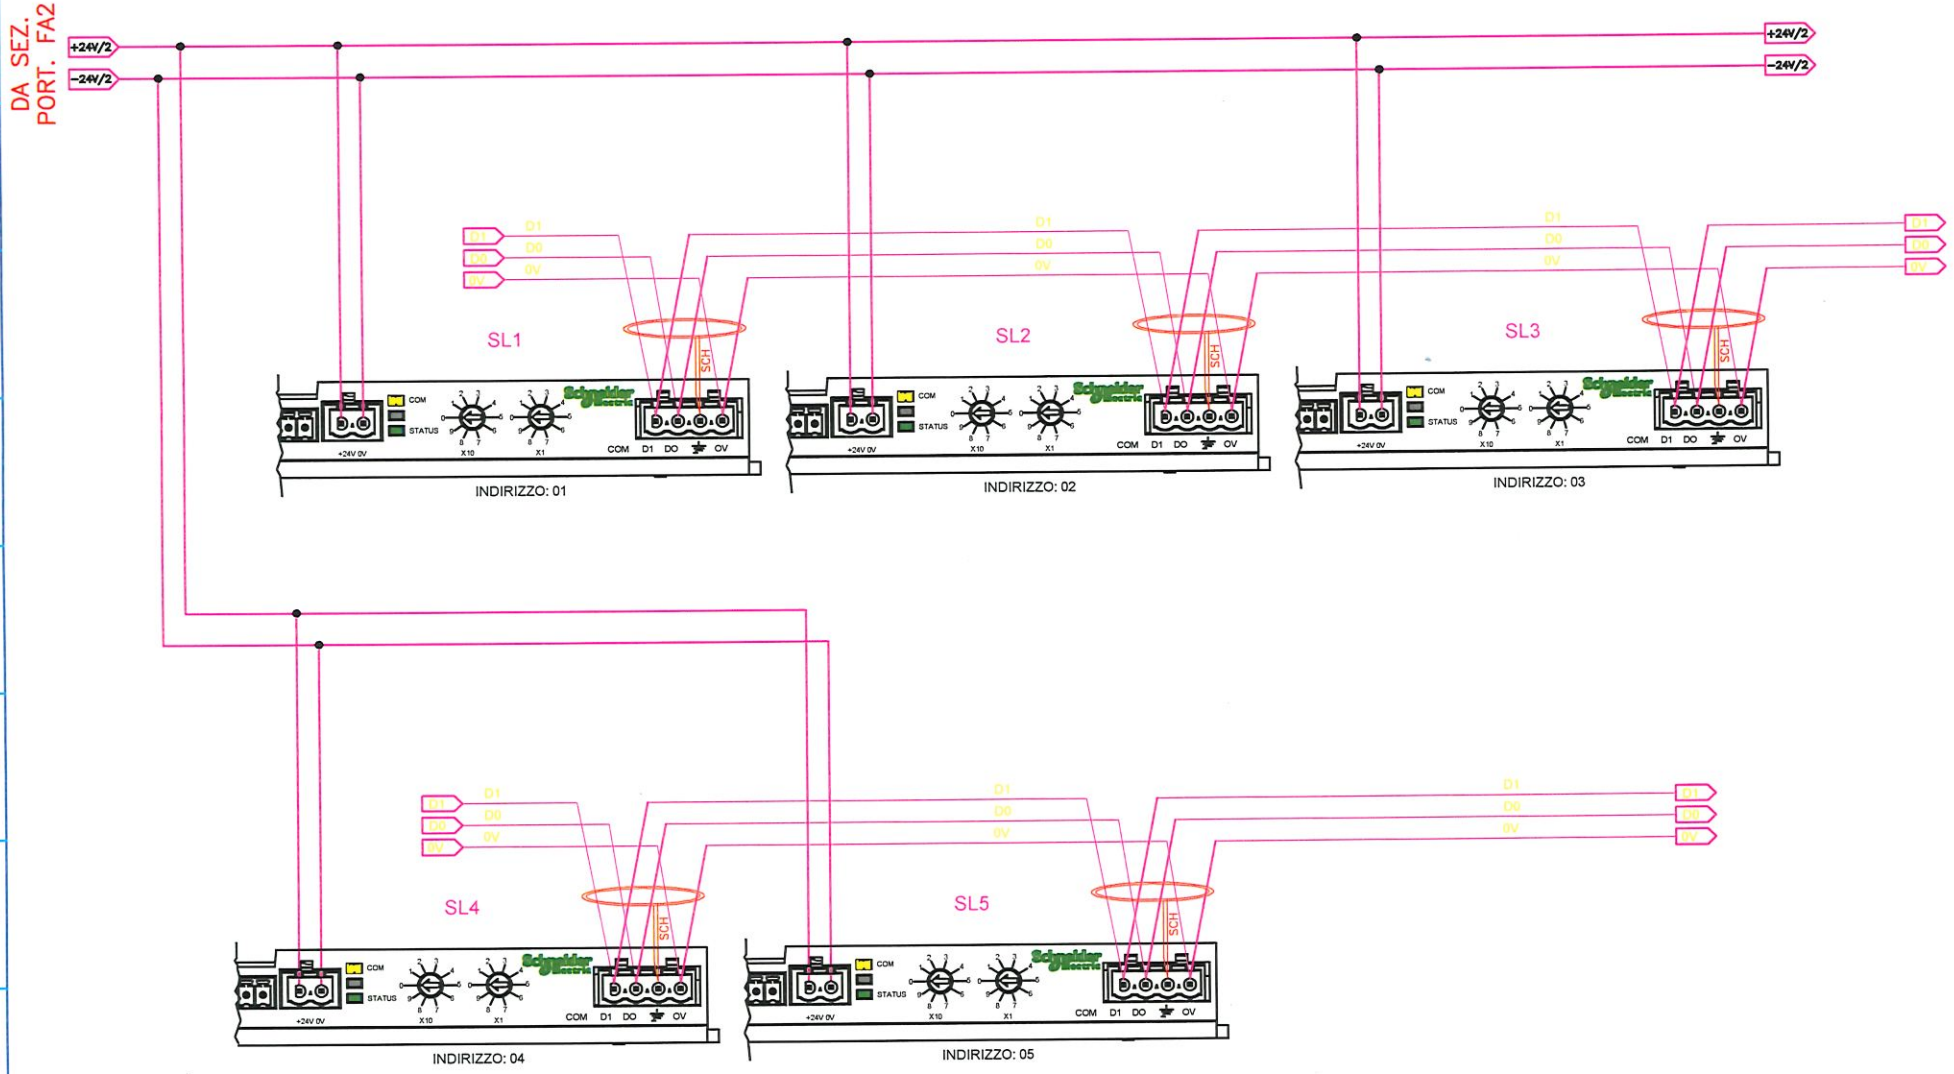

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 22	Rev. 2


DISTRIBUZIONE MOD BUS

MULTIMETRO SEZIONE COTINUITÀ

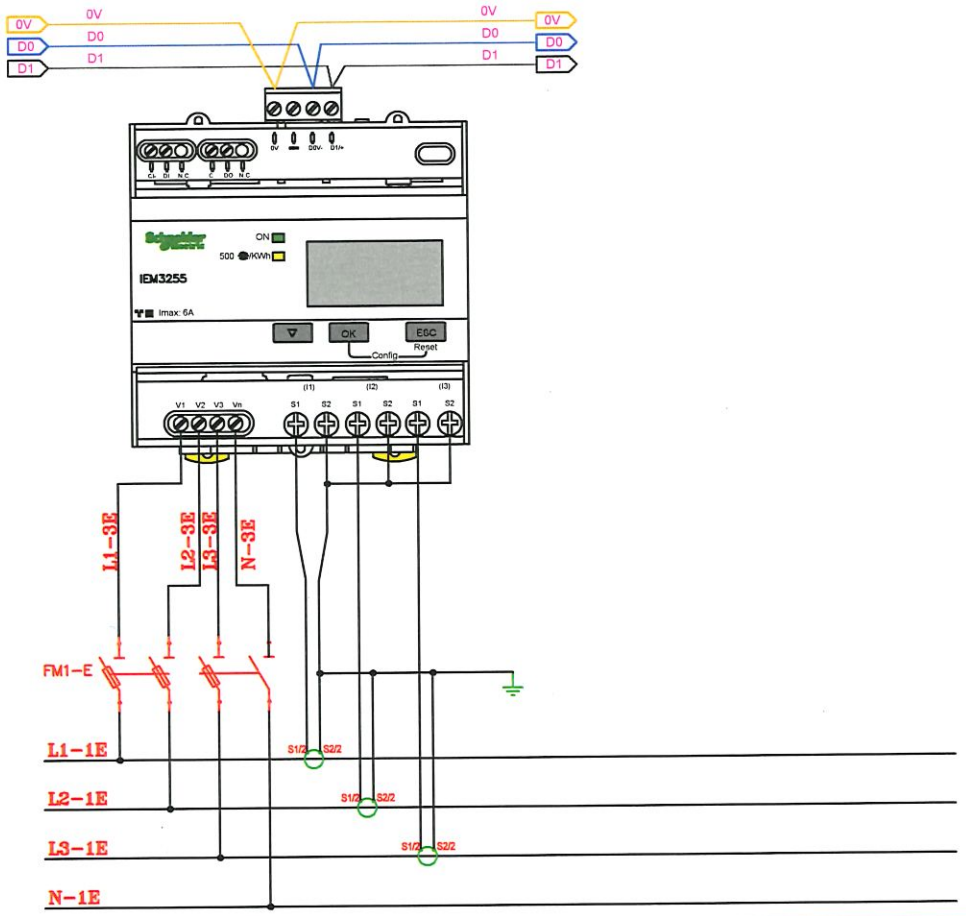

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 22	Rev. 2

ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK

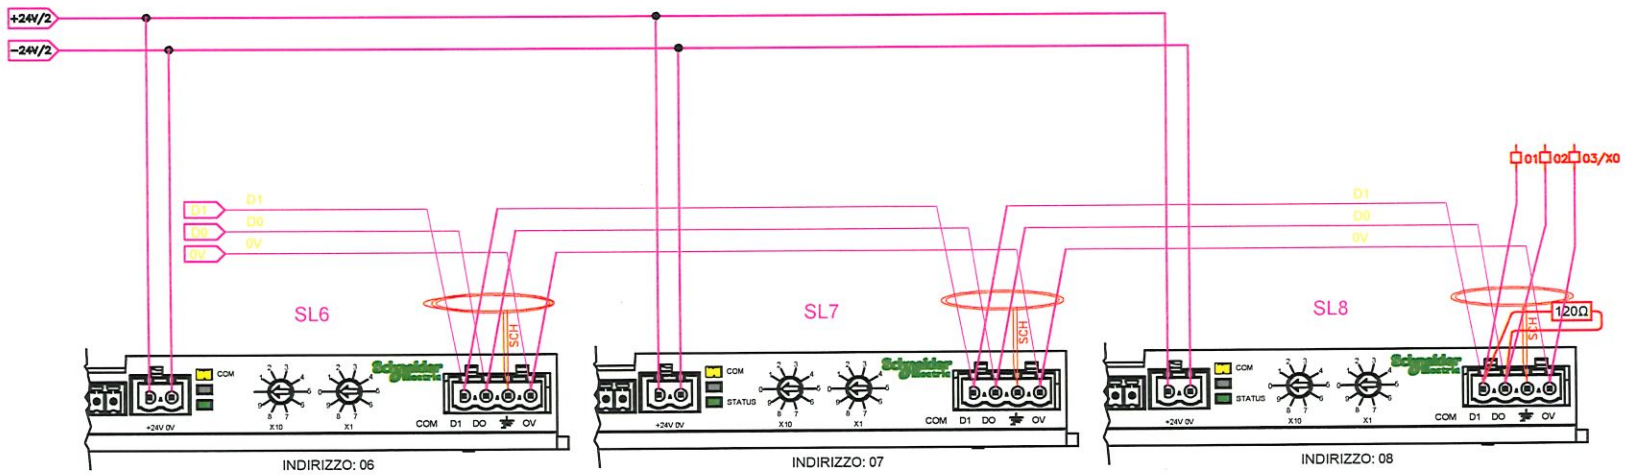


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 22	Rev. 2

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL1

CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE Q2

SL1-PORTA 1

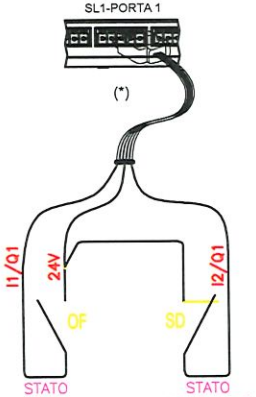


STATO "CHIUSO"

STATO "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3


SL1-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4


SL1-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5


SL1-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6


SL1-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q7


SL1-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q8

SL1-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 11




COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26			
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C			
	Proget.	Note :		Nome File : QE14.DWG	Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 22	Rev. 2
	visto						

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL2

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q9

SL2-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q10

SL2-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q11


SL2-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q12

SL2-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q13


SL2-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q14


SL2-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q15


SL2-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q16


SL2-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 11



COMEC srl
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :


Descrizione:
Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 7
Nr. Fogli 22
Rev. 2

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL3

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q17

SL3-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q18

SL3-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q19

SL3-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q20

SL3-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q21

SL3-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q22


SL3-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q23


SL3-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q24


SL3-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q25

SL3-PORTA 9



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 11




COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26		
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C		
	Proget.	Note :		Nome File : QE14.DWG	Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 8 / Nr. Fogli 22 / Rev. 2
	visto					

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL4

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q26


SL4-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q27


SL4-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q28


SL4-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q29


SL4-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q30


SL4-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q31


SL4-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q32

SL4-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 11




COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG		Nr. Foglio 9	Nr. Fogli 22 / Rev. 2

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL5

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q33

SL5-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q34


SL5-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q35

SL5-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q36


SL5-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q37

SL5-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q38

SL5-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 7



-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 11



COMEC s.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :

Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14

SCHEMA AUSILIARE

Matricola 209/26

Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C

Nome File : QE14.DWG

Percorso File : QE14.DWG

Nr. Foglio 10


Nr. Fogli 22

Rev. 2

COLONNA 2: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL6

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1-E


SL6-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2-E

SL6-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3-E


SL6-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4-E


SL6-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5-E


SL6-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6-E


SL6-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q7-E

SL6-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 11



COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :

Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 209/26


Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QE14.DWG	QE14.DWG	11	22	2

COLONNA 2: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL7

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q8-E


SL7-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q9-E

SL7-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q10-E


SL7-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q11-E

SL7-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q12-E


SL7-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q13-E


SL7-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q14-E


SL7-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q15-E

SL7-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q16-E


SL7-PORTA 9



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q17-E

SL7-PORTA 10



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-


SL7-PORTA 11



COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26	
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C	
	Proget.	Note :		Nome File : QE14.DWG	Percorso File : QE14.DWG
	visto			Nr. Foglio 12	Nr. Fogli 22
					Rev. 2

COLONNA 2: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL8

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q18-E	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q19-E	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q20-E	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q21-E	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q22-E	-DISPONIBILE-
SL8-PORTA 1	SL8-PORTA 2	SL8-PORTA 3	SL8-PORTA 4	SL8-PORTA 5	SL8-PORTA 6

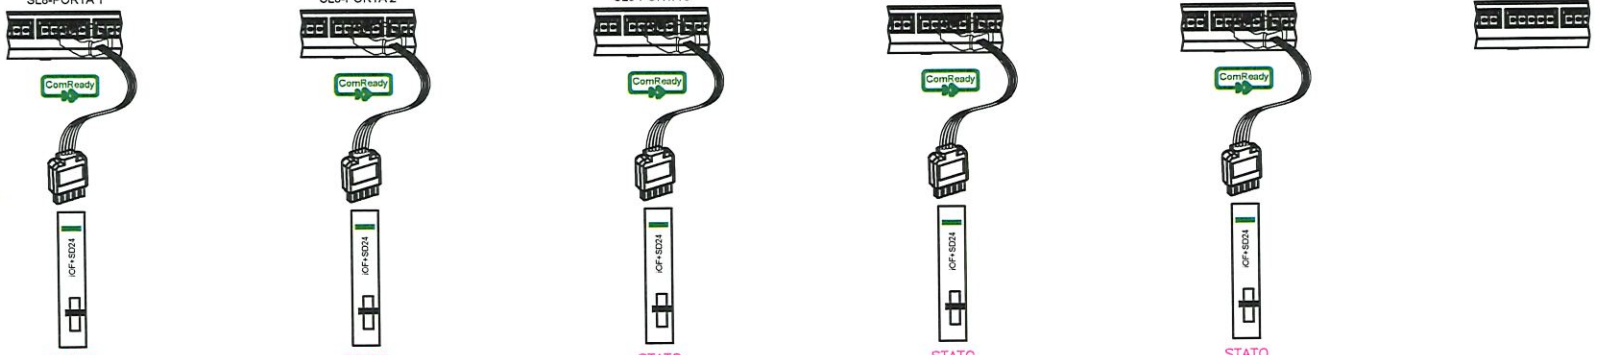


-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-
SL7-PORTA 7	SL7-PORTA 8	SL7-PORTA 9	SL7-PORTA 10	SL7-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
	SCHEMA AUSILIARE
Matricola	209/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE14.DWG
Percorso File :	QE14.DWG
Nr. Foglio	13
Nr. Fogli	22
Rev.	2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

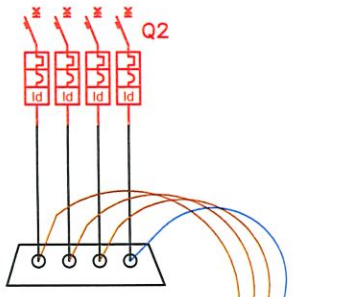















COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 14 Nr. Fogli 22 Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

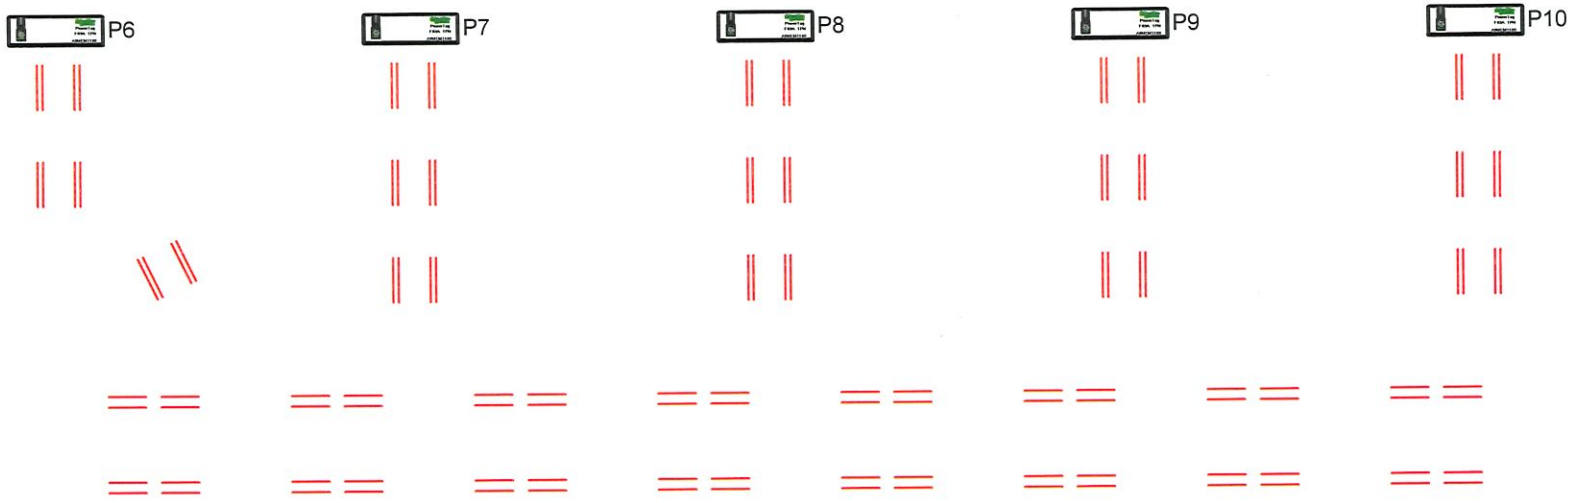


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 15	Nr. Fogli 22	Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

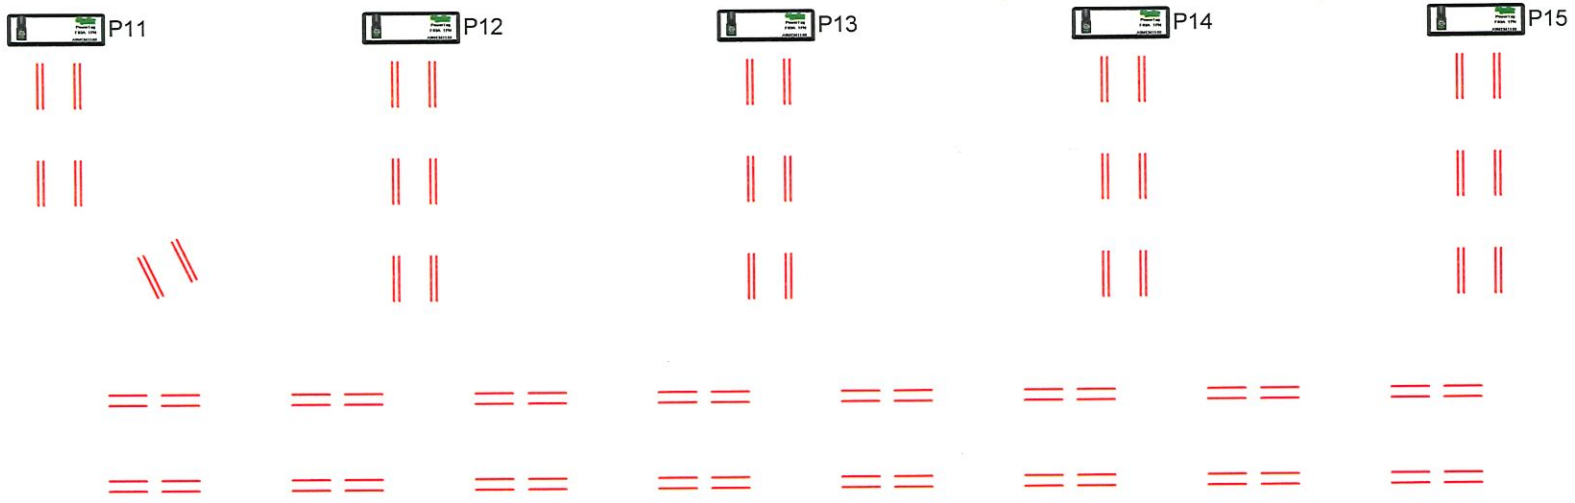


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 16 Nr. Fogli 22 Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

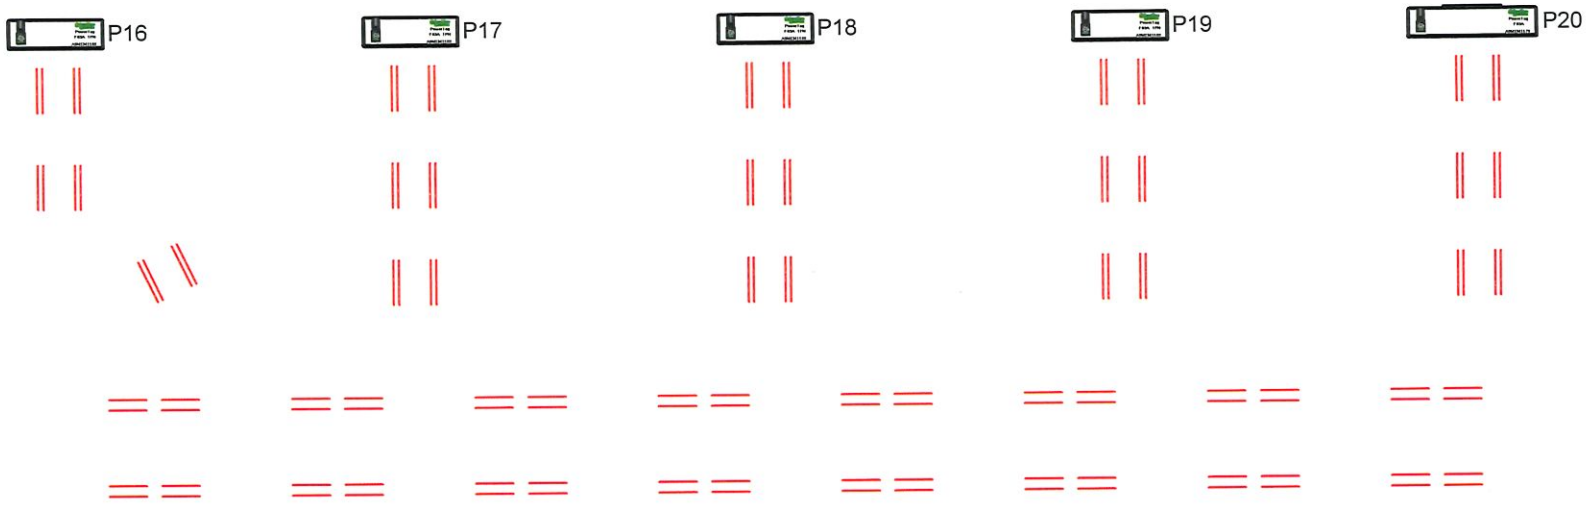


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 17 Nr. Fogli 22 Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

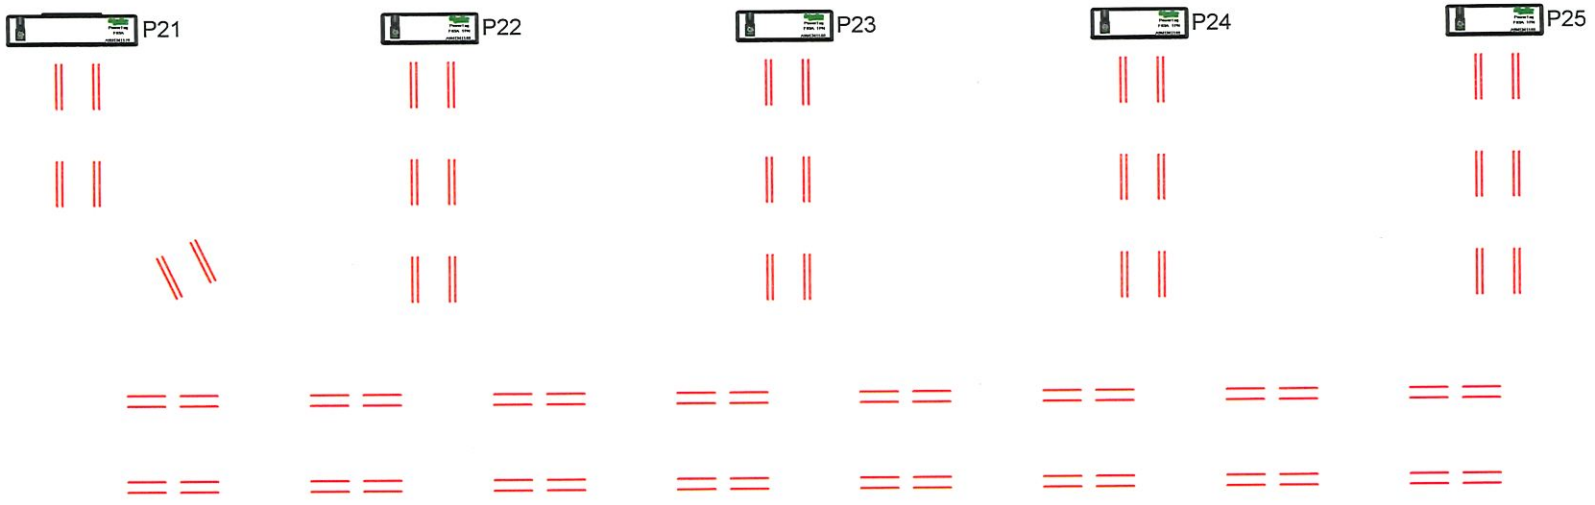


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 18 Nr. Fogli 22 Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

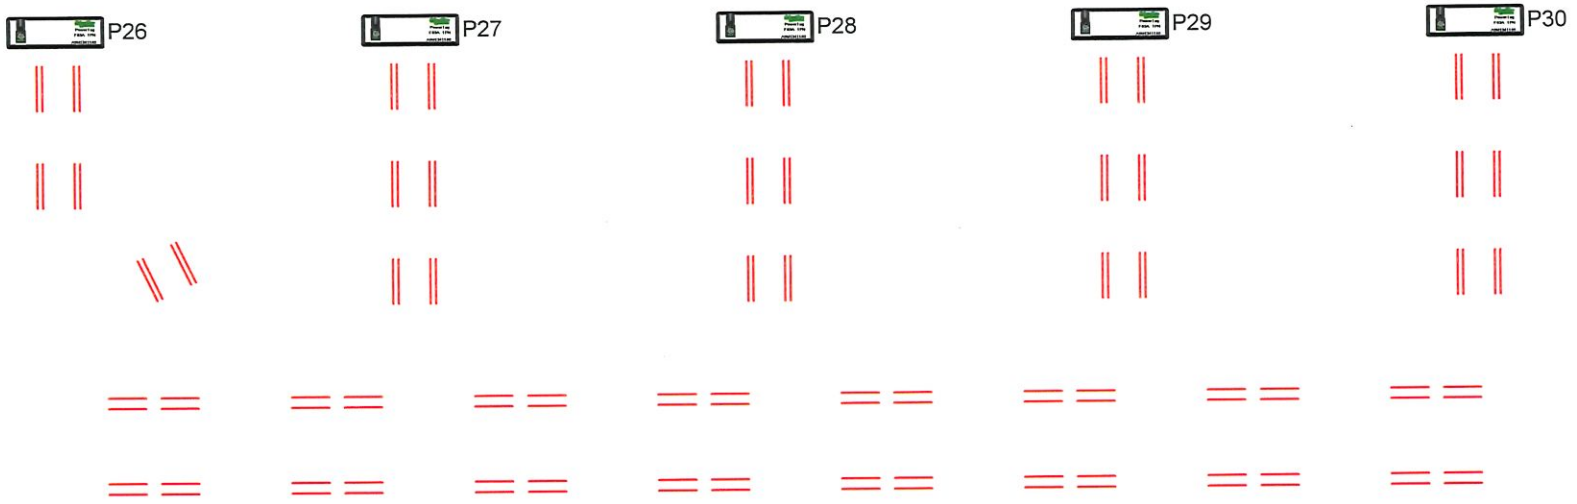


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 19 Nr. Fogli 22	Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

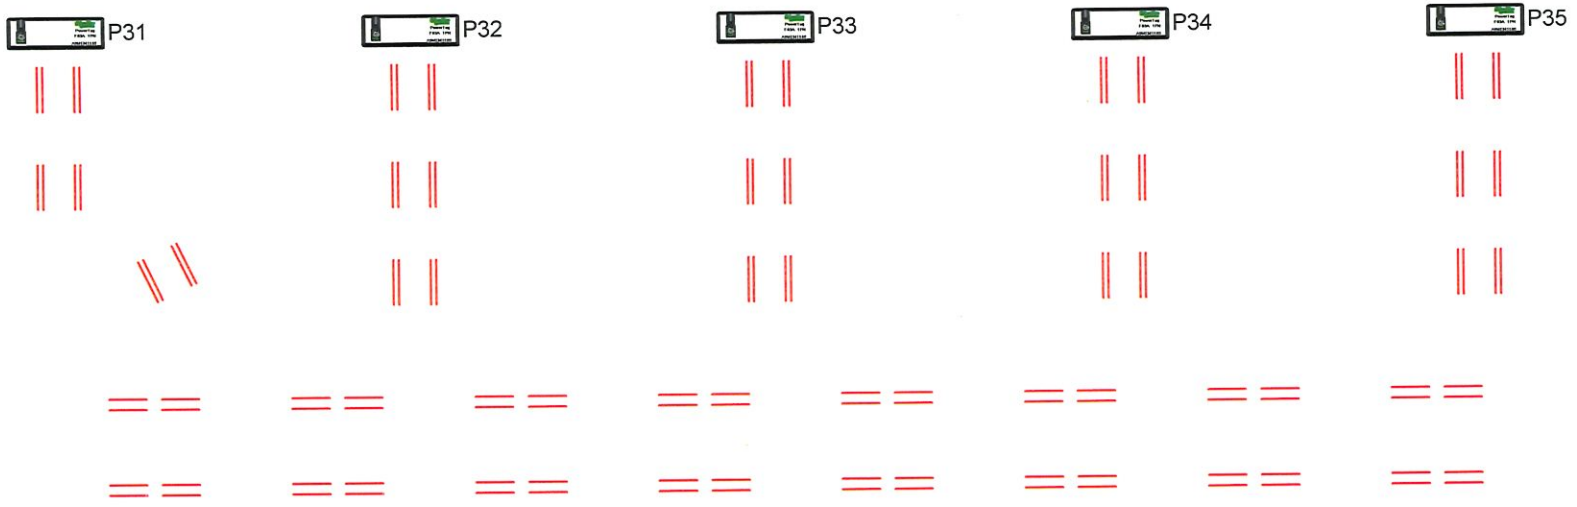

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 20 Nr. Fogli 22	Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

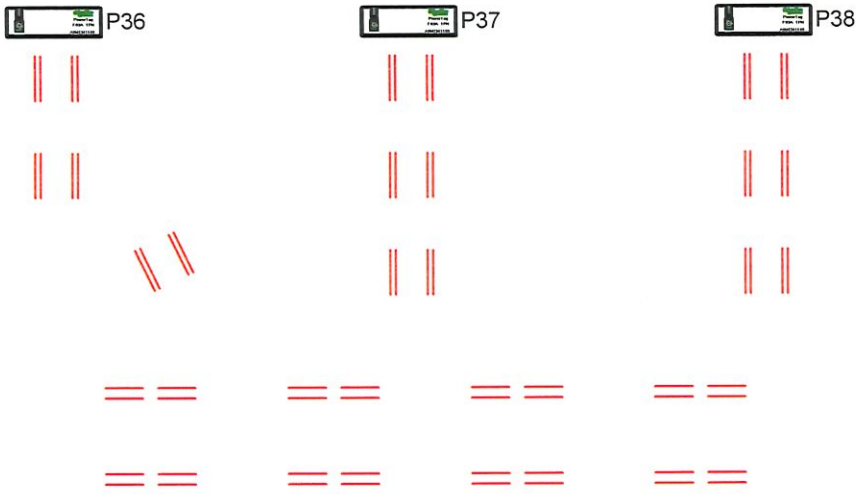


COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
	SCHEMA AUSILIARE
Matricola	209/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE14.DWG
Percorso File :	QE14.DWG
Nr. Foglio	21
Nr. Fogli	22
Rev.	2

RELE' DIFFERENZIALE - INTERRUTTORE Q1

SCHNEIDER
LV481010

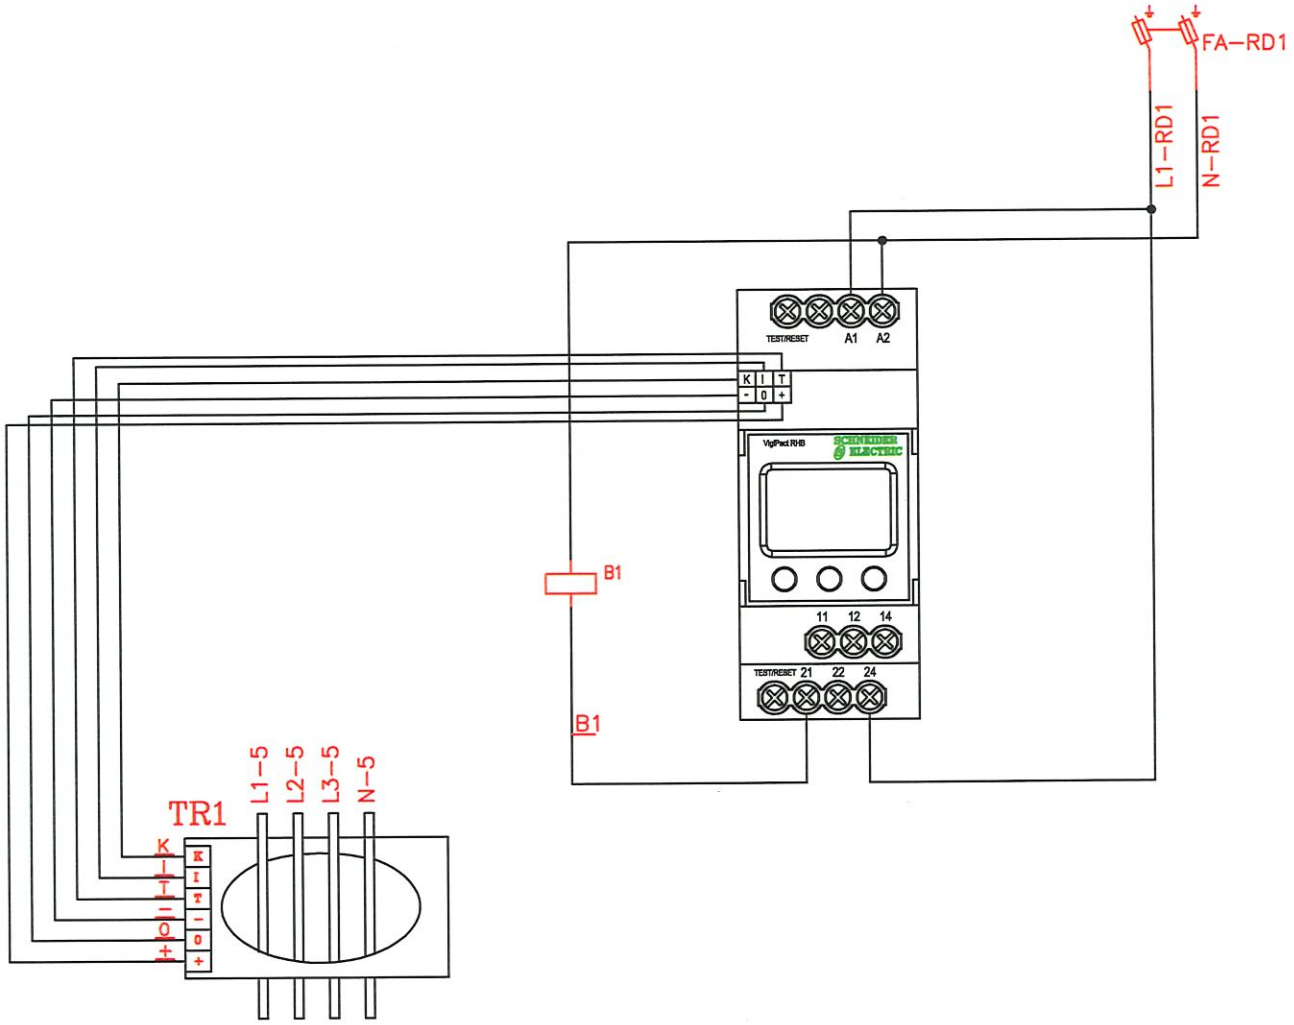

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 209/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.DWG Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 22	Nr. Fogli 22	Rev. 2

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA BUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
X2	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE AUSILIARE
XE	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE CONTINUITA'

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 8
Rev. 2

MORSETTIERA X1

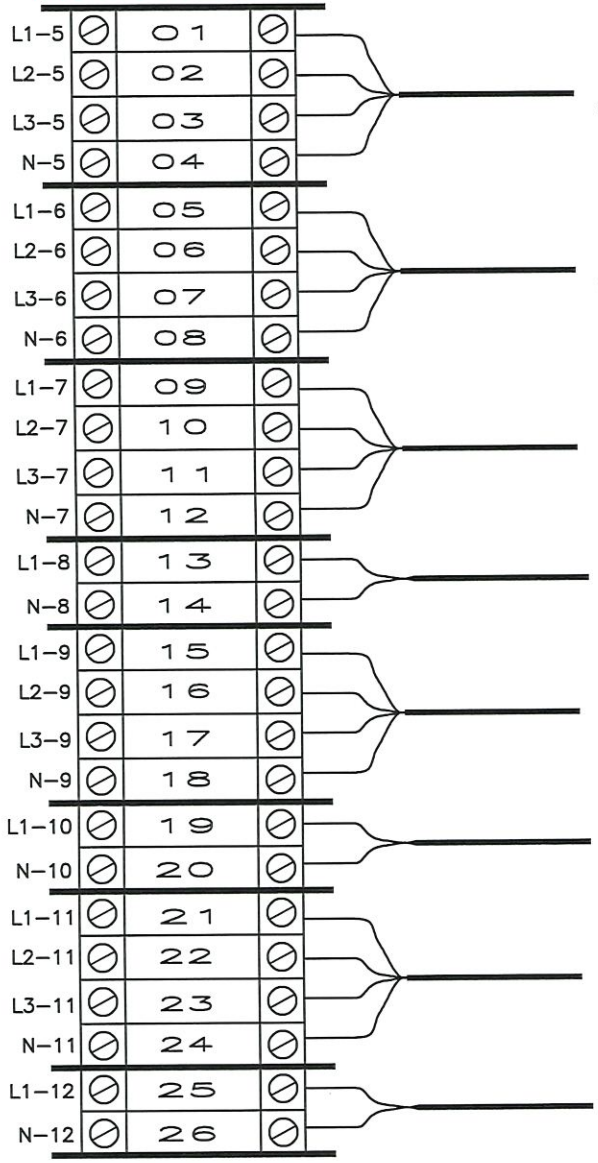

Sigla: A UPS

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO QE.14.1

Sigla: QE.14.L1 LUCE FILTRI+CIRCUITO 1

Sigla: QE.14.LE1 LUCE EMER. FILTRI+CIRCUITO 1

Sigla: QE.14.L2 LUCE FILTRI+CIRCUITO 2

Sigla: QE.14.LE2 LUCE EMER. FILTRI+CIRCUITO 2

Sigla: QE.14.L3 LUCE FILTRI+CIRCUITO 3


Sigla: QE.14.LE3 LUCE EMER. FILTRI+CIRCUITO 3

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 209/26
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14	Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QE14.DWG — Percorso File : QE14.DWG — Nr. Foglio 2 — Nr. Fogli 8 — Rev. 2
visto			

MORSETTIERA X1

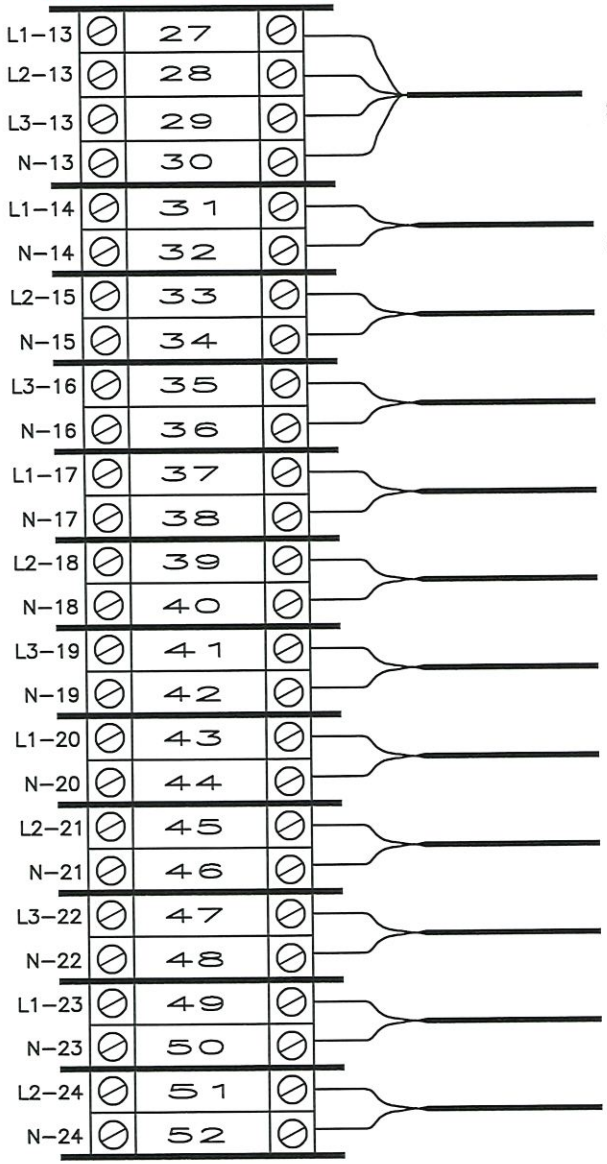

Sigla: QE.14.L4 LUCE FILTRI+CIRCUITO 4

Sigla: QE.14.LE4 LUCE EMER. FILTRI+CIRCUITO 4

Sigla: QE.14.F1 FM GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.F2 FM GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.F3 FM GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.F4 FM GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.F10 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F11 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F12 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F13 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F14 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F5 FM GRUPPO PRESE LATO SX

MORSETTIERA X1

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione:
Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 3
Nr. Fogli 8
Rev. 2

MORSETTIERA X1

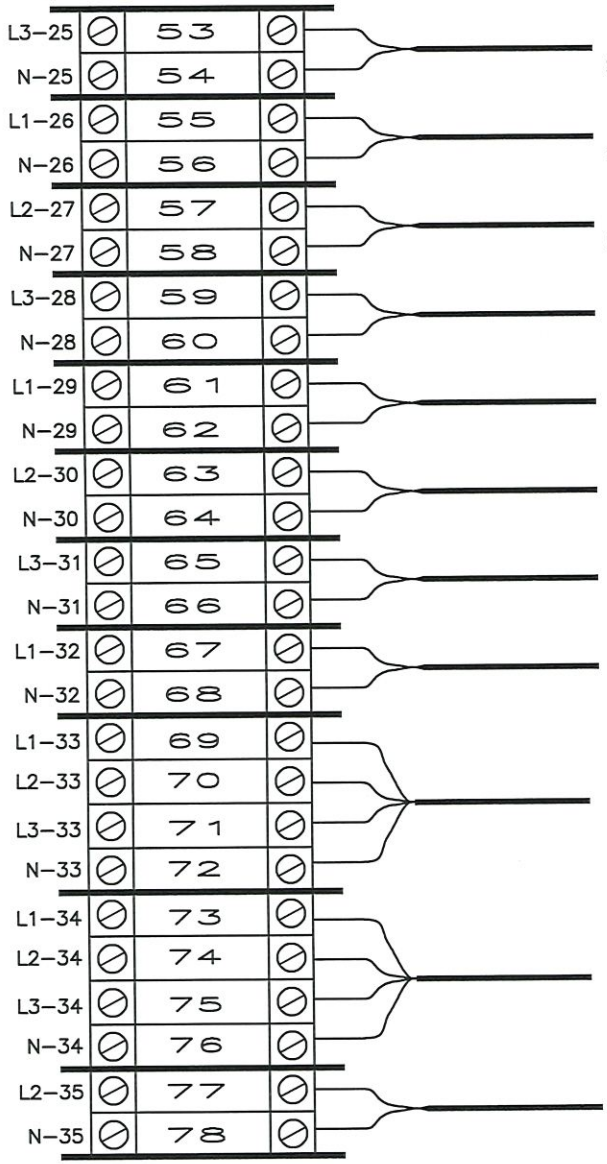

Sigla: QE.14.F6 FM GRUPPO PRESE LATO SX

Sigla: QE.14.F7 FM GRUPPO PRESE LATO SX

Sigla: QE.14.F8 FM GRUPPO PRESE LATO SX

Sigla: QE.14.F15 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO SX)

Sigla: QE.14.F16 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F17 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F18 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F19 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F20 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO DX)

Sigla: QE.14.F21 FM GRUPPO PRESE CENTRALE (LATO SX)

Sigla: QE.14.F9 FM LAVAGGIO

MORSETTIERA X1

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione:
Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 4
Nr. Fogli 8
Rev. 2

MORSETTIERA X1

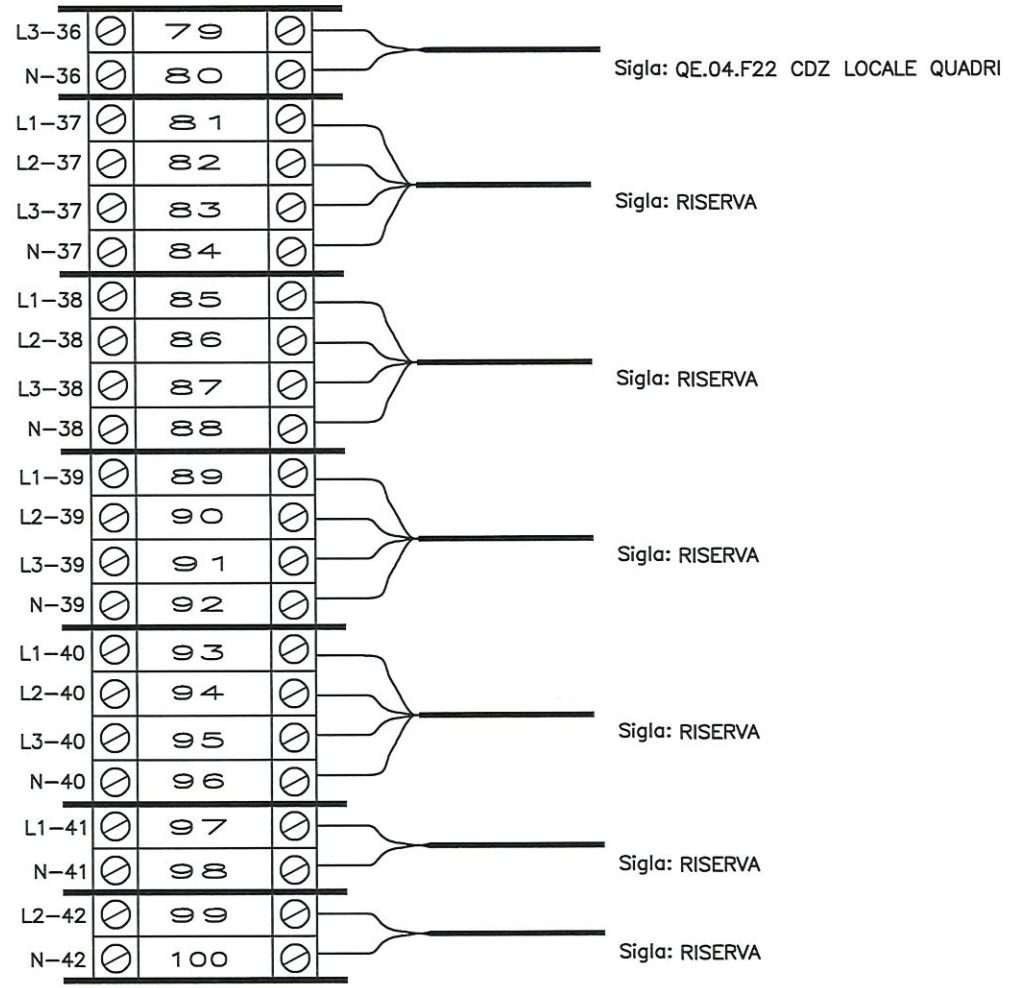


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE - QE14 SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 209/26
Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Proget.	Note :		Nome File : QE14.DWG / Percorso File : QE14.DWG / Nr. Foglio 5 / Nr. Fogli 8 / Rev. 2
visto			

MORSETTIERA XE

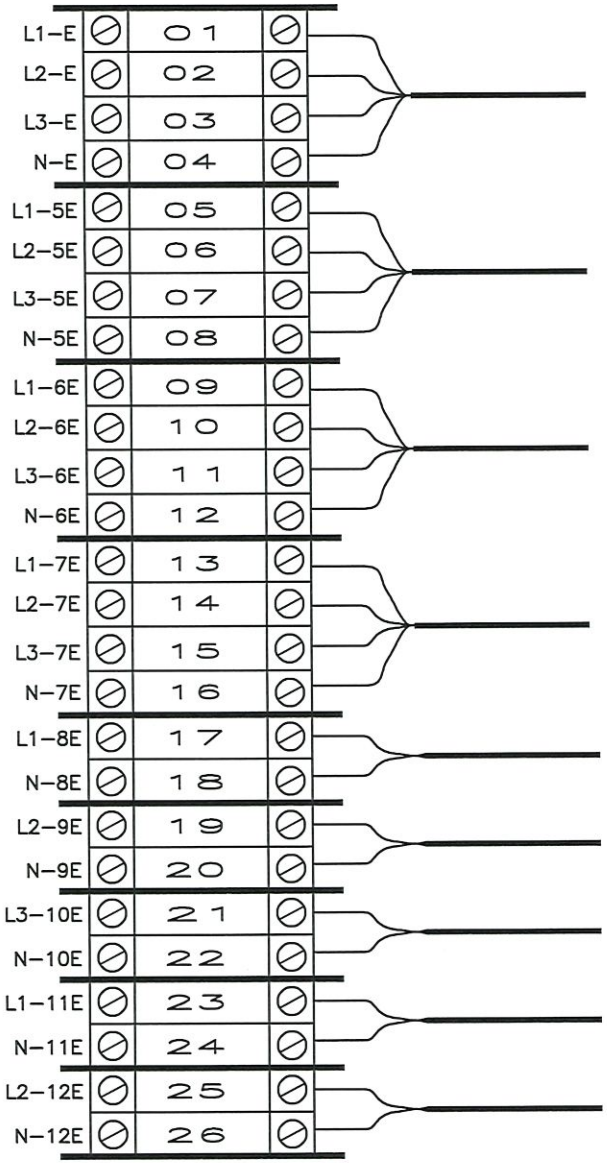

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE CONTINUITA'

Sigla: "QE.09–C" QUADRO ELETTRICO PT ZONA UFFICI

Sigla: "QE.12–C" QUADRO ELETTRICO P1 ZONA UFFICI

Sigla: SEZIONE CONTINUITA' QE.14.1

Sigla: QE.14.FC1 GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.FC2 GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.FC3 GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.FC4 GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.FC5 GRUPPO PRESE LATO SX

MORSETTIERA XE


COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
SCHEMA MORSETTIERA


Matricola 209/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File : QE14.DWG
Percorso File : QE14.DWG
Nr. Foglio 6
Nr. Fogli 8
Rev. 2

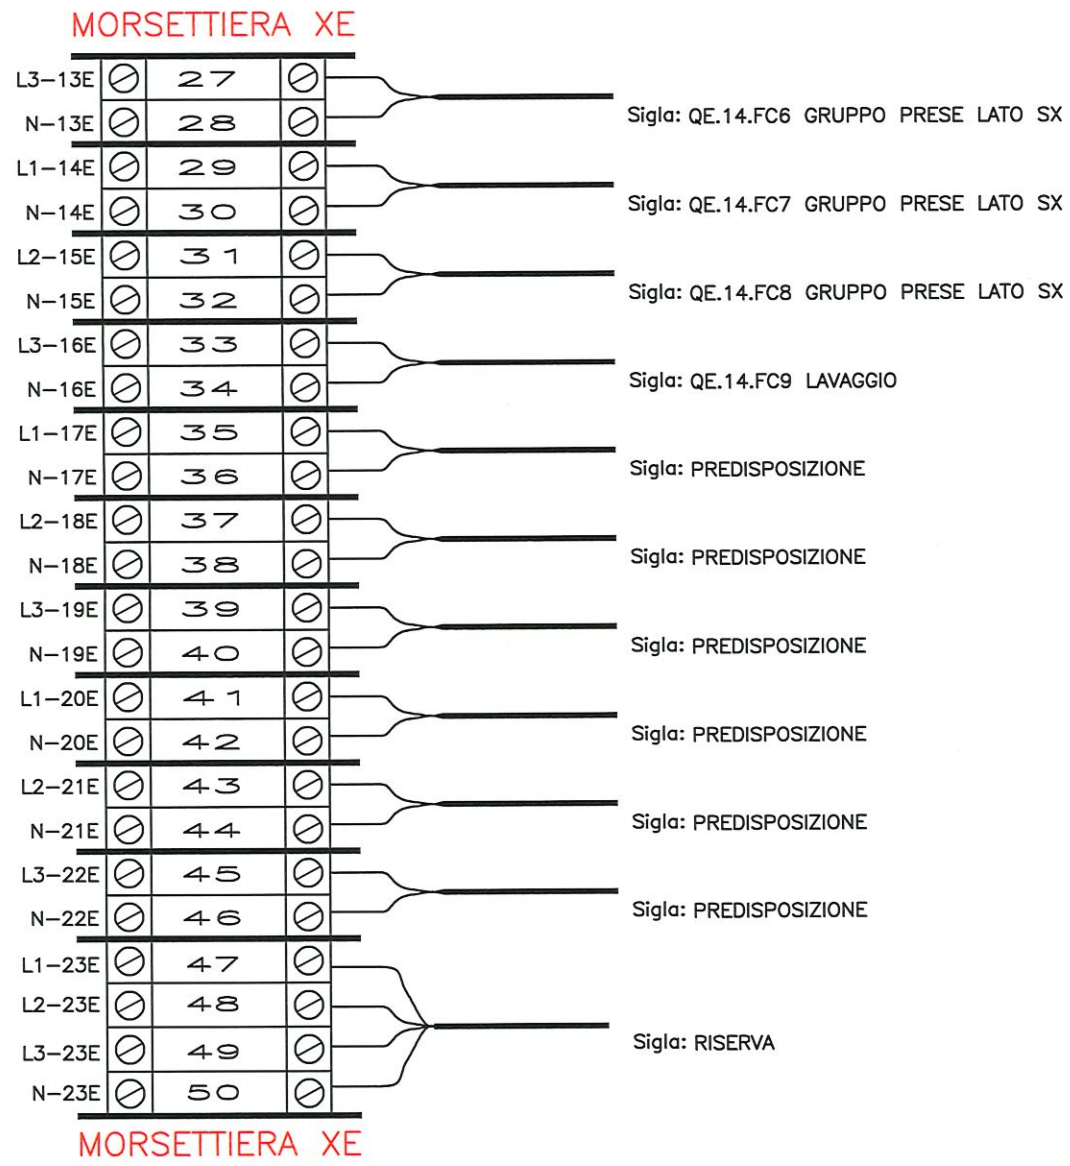

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14 SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 209/26		
Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C		
Proget.	Note :		Nome File : QE14.DWG	Percorso File : QE14.DWG	Nr. Foglio 7 / Nr. Fogli 8 / Rev. 2
visto					

MORSETTIERA XE

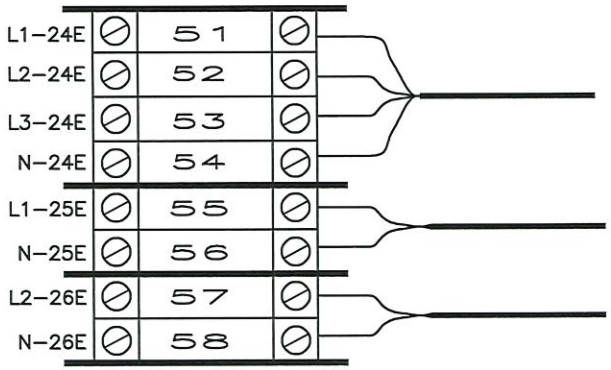


Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

MORSETTIERA XE

MORSETTIERA X2




Sigla:

Sigla: PROTEZIONE GATAWAY DALI KNX

MORSETTIERA X2

MORSETTIERA X0



Sigla: COMUNICAZIONE BUS

MORSETTIERA X0

COMEC srl
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :	
Descrizione:	Q. E. P1_ZONA PRODUZIONE – QE14
	SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	209/26
Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C
Nome File :	QE14.DWG
Percorso File :	QE14.DWG
Nr. Foglio	8
Nr. Fogli	8
Rev.	2
