COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO CENTRALE TERMICA Q.C.T.



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DI TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DI POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE PER CIRCUITO AUSILIARE
9	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
10	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI Via G. Paisiello, 19 - 80128 NAPOLI www.comeccab.it - P.Iva e C.F. 06414831211

Data 10 / 07 / 2026 **Firma**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**Elettrocampania S.p.A.** **S.S. 87 km 21,200, 81025 - Marcianise (CE)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Centrale Termica**
Locazione del quadro:	**Hotel Tre Farine**
Quadro:	**QCT**
Identificazione del quadro:	**341 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	125 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	55
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	24
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	1353x2150x402 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	Siemens S.p.A. Alpha 630
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Grigio RAL7035
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Siemens S.p.A.** serie **Alpha 630** in lamiera con superficie zincocromata elettroliticamente e verniciata a polvere.

Pannelli frontali apribili con viti.

Verniciatura con Colore Grigio Chiaro RAL7035.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO CENTRALE TERMICA

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
3NW60021	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 2A GG	3	SIEMENS
3NW60041	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A GG	8	SIEMENS
3NW60121	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 32A GG	3	SIEMENS
3NW70232	BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 2P 32A 2UM	4	SIEMENS
3NW70632	BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 3P+N 32A 3UM	2	SIEMENS
3RH29111HA22	BLOCAUS.2L,2R 1L,1L,S00-S0,	11	SIEMENS
3RT20161AB01	CONT4KW,1L,AC 24V,S00 VT	11	SIEMENS
3RT20261AC20	CONT11KW,1L,1R,AC 24V 50-60HZ,S0 VT	6	SIEMENS
3RT23171AB00	CONT14.5KW,22A,AC 24V 50HZ,4L,S00,VT	1	SIEMENS
3RU21160EB0	RELE' TERS00 0,28-0,40 A VT	2	SIEMENS
3RU21161CB0	RELE' TERS00 1,8-2,5 A VT	10	SIEMENS
3SU11002BL601LA0	SEL.LUM.PLAS.BIAN 3P.MANT 2X1NO+1NC VITE	19	SIEMENS
3SU11026AA301AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 24V UC	18	SIEMENS
3SU11026AA401AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 24V UC	18	SIEMENS
5SD74640	SURGE ARR.C/T2/II 350V TN-S/TT	1	SIEMENS
5SL62107BB	INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 2P C10	11	SIEMENS
5SL62167BB	INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 2P C16	9	SIEMENS
5SL64167BB	INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 4P C16	4	SIEMENS
5SM23236	BLOC.DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A X 5SL	3	SIEMENS
5SM23436	BLOC.DIFF. 4P 40A 30MA TIPO A X 5SL	2	SIEMENS
5SM26236	BLOC.DIFF. 2P 40A 0,3A TIPO A X 5SL	17	SIEMENS
5SM26436	BLOC.DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A X 5SL	2	SIEMENS
5SP44927	INT. MT 10KA 4P C 125A 6UM	1	SIEMENS
5ST3020	CONT. SEGN. (CS) 1NA+1NC	7	SIEMENS
5TE5802	LAMP.SEGN.3 SPIE VERDI 230VCA 5M 1UM	1	SIEMENS
8GF7158	PIASTRA DI MONTAGGIO B900 H200	2	SIEMENS
8GF7160	PIASTRA DI MONTAGGIO B900 H400	1	SIEMENS
8GF9653	SUPP.CANAL/SBARRE ORIZZB900(COPPIA)	4	SIEMENS
8GF9683	SUPPORTO MORSETTIERA VERTIC.H900	1	SIEMENS
8GF9876	MORSETTIERA TETRAPOL DI DISTRIB.125A 8UM	2	SIEMENS
8GK24207KK14	ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B300	1	SIEMENS
8GK24207KK34	ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B900	1	SIEMENS
8GK63522KK33	KIT APP. MODULARI 1X36UM H200 B900	6	SIEMENS
8GK68500KK01	ALPHA AS P400 TRAVERSA LATERALE	2	SIEMENS
8GK68500KK04	ALPHA AS P400 MONTANTI LATERALI H2000	1	SIEMENS
8GK91200KK11	CERNIERE PER COPERTURE CONF. 10 PZ.	1	SIEMENS
8GK92008KK05	ALPHA AS H2000 PAR LAT RAL7035 (COPPIA)	1	SIEMENS
8GK95058KK32	PORTA TRASPARENTE IP43/IP55 B900 H2000	1	SIEMENS
8GK95158KK12	PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B300 H2000	1	SIEMENS
8GK96222KK30	COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H400 B900	1	SIEMENS
8GK96231KK30	COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H200 B900	2	SIEMENS
8GK99100KK00	MOSTRINE CIECHE RAL7035 12UM	11	SIEMENS
8GK99200KK33	SQUADRETTA X FISSAGGIO A MURO (4PZ)	1	SIEMENS
8WA746	ANGOLARE FISSAGGIO	2	SIEMENS
IT28GF5751	SBARRA RAME 15X5, L=2000 FOR. E FILETT.	2	

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE
DI
COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**341**
Date of document: *Data del documento:*	**10/07/2026**

Customer/*Cliente*:	**Elettrocampania S.p.A.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**Alpha 630 / Siemens S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**10/07/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**085 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**341/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**QCT**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	125	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	6	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	9	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	341/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	341/26 QCT
Schematic dwg. *Schema funzionale*	341/26 QCT
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	341/26 QCT

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit */Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit */Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit */Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function**
  Prove di funzionamento elettrico — CEI EN 61439-2 par. 11.10 — Satisfactory / *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove: COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE: Resp. Tecnico Sig. non presente

Technical Manager: COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI Via G. Porzio, Is. - 80125 NAPOLI WWW.COMECCAB.IT - P.IVA e C.F. 06414831211

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

DATI DI TARGA DEL QUADRO

DENOMINAZIONE	QUADRO CENTRALE TERMICA
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	125A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	10
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2 / EN60898
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	55
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	1353x2150x402mm
MATRICOLA	341/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	


COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 24/06/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE
Note :


Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA DATI DI TARGA

Matricola 341/26
Cliente HOTEL TRE FARINE
Nome File : QCT.DWG
Percorso File : QCT.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

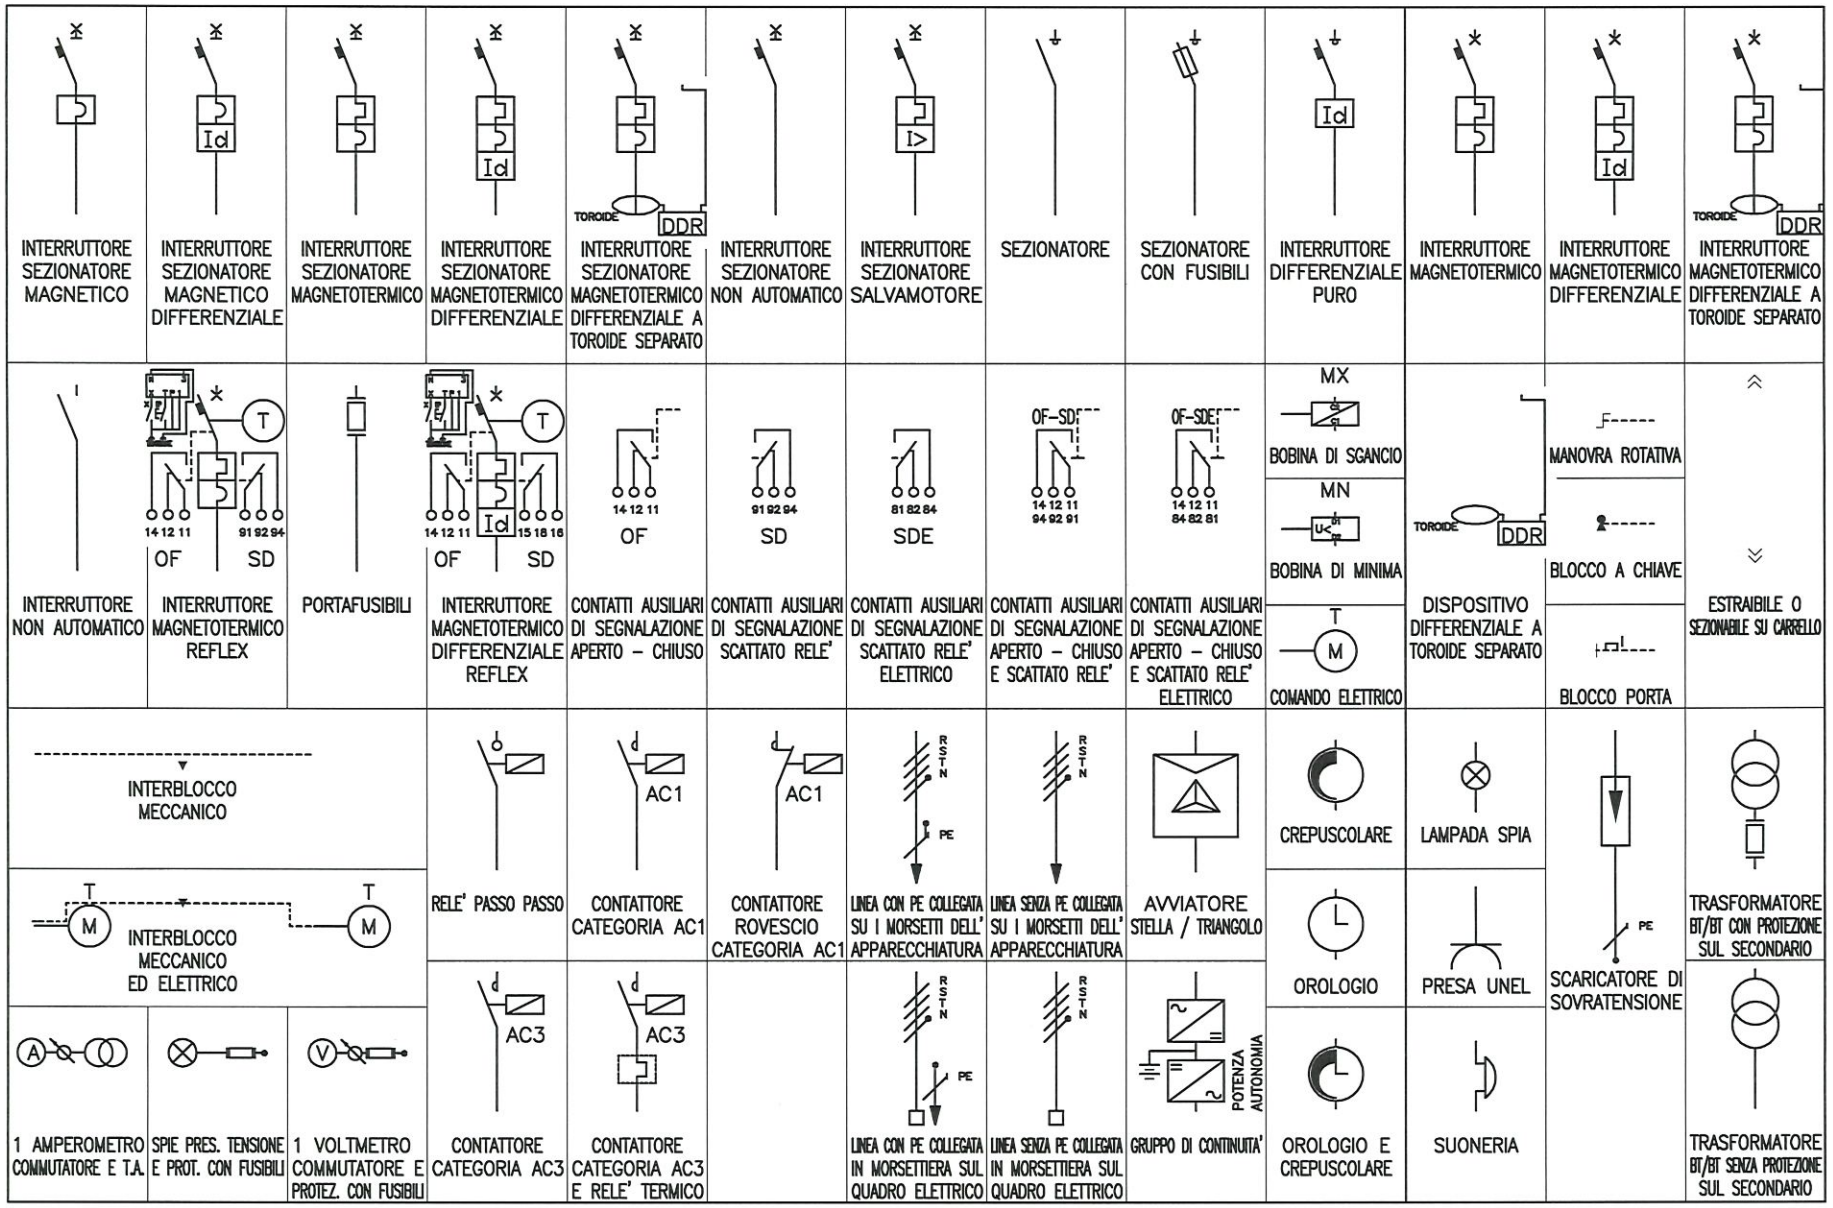

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	HOTEL TRE FARINE
Note :	
Descrizione:	QUADRO CENTRALE TERMICA LEGENDA QUADRO
Matricola	341/26
Cliente	HOTEL TRE FARINE
Nome File :	QCT.DWG
Percorso File :	QCT.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

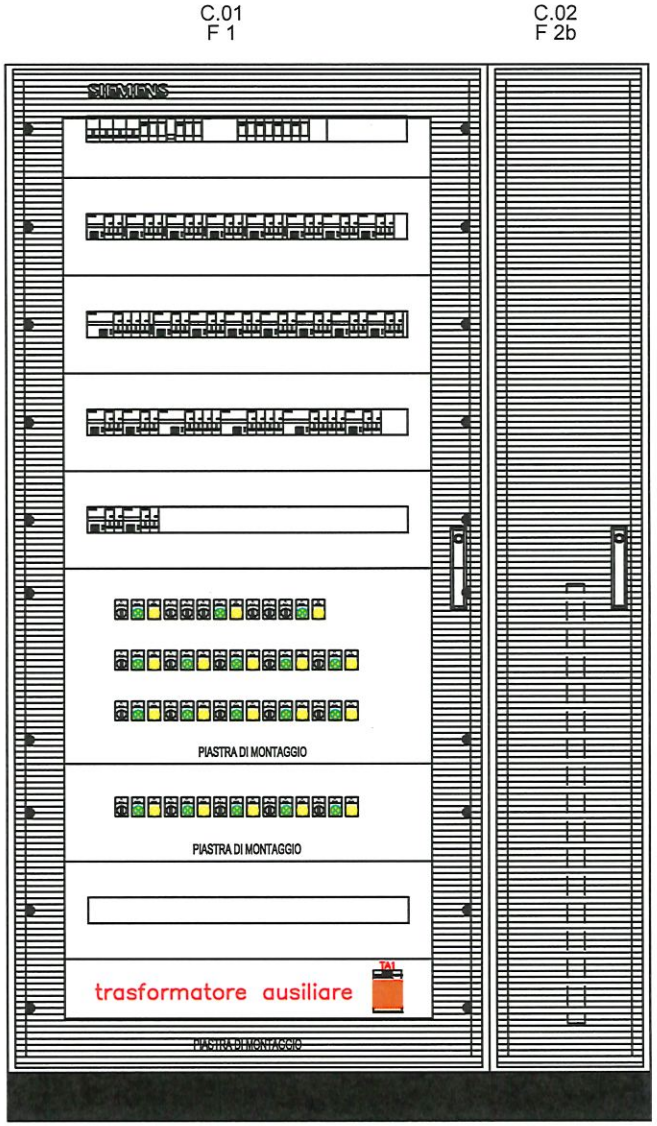

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

ALPHA AS

TIPO DI QUADRO:	CEI EN 61439-2
NORMA DI RIFERIMENTO:	400/230
TENSIONE NOMINALE (V):	0
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):	
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA):	35
CORRENTE DI PICCO (kA):	74
ALTEZZA (mm):	2.150
LARGHEZZA (mm):	1.353
PROFONDITA' (mm):	402
GRADO DI PROTEZIONE:	IP55 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA:	VEDI DISEGNO
COLORE INVOLUCRO:	RAL 7035
TIPO DI PORTA:	VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA':	ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 24/06/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
HOTEL TRE FARINE


Note :

Descrizione:
QUADRO CENTRALE TERMICA
FRONTE
QUADRO

Matricola 341/26
Cliente HOTEL TRE FARINE
Nome File : QCT.DWG
Percorso File : QCT.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	FP	QG		FS	FA1		FA2	FA3		Q1
NOME PROGETTO HOTEL TRE FARINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO CENTRALE TERMICA
IP 55 SIEMENS S.p.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 125 (A) Icc=10 (kA)

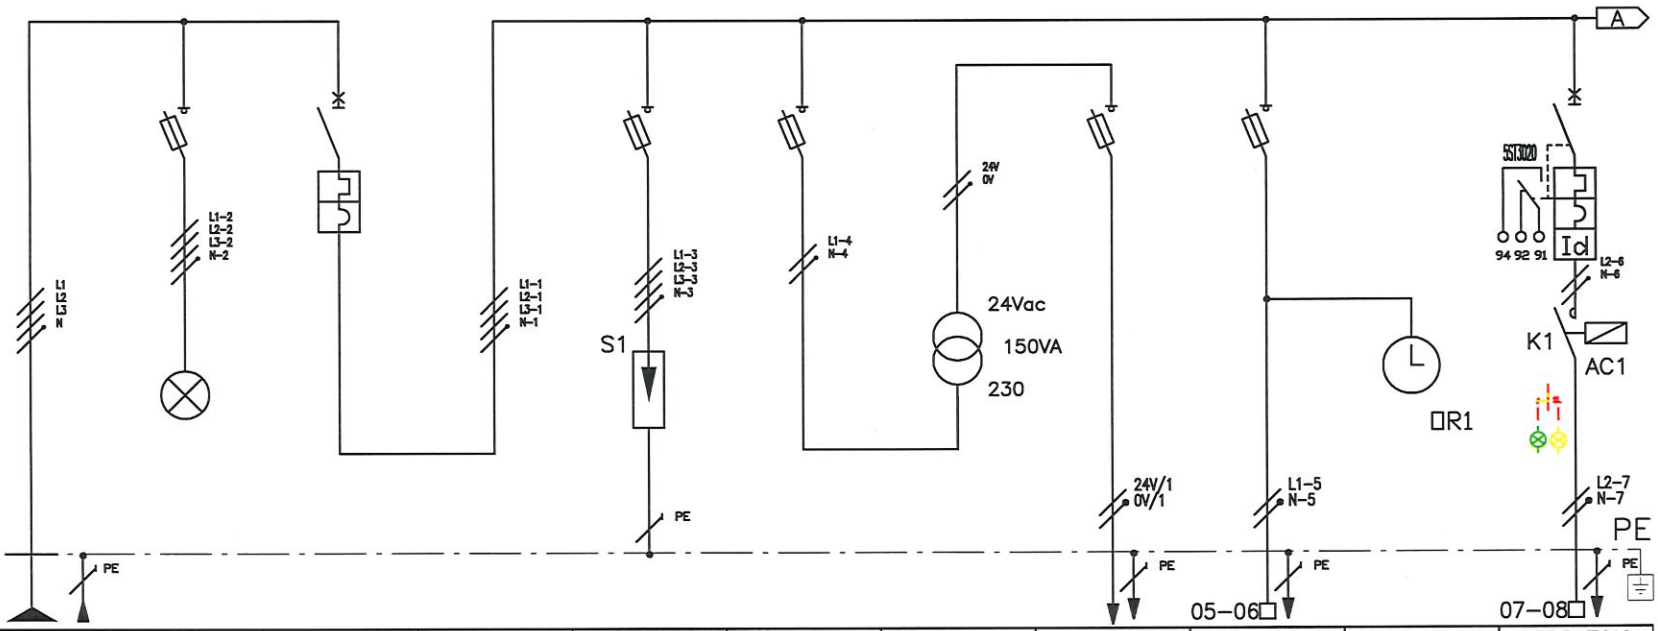

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO	PROTEZIONE PRESENZA RETE	INTERRUTTORE GENERALE		PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	TRASFORMATORE AUSILIARE 230/24Vac		USCITA TRASFORMATORE	PROTEZIONE CIRCUITO AUSILIARE	ALIMENTAZIONE OR1	SERBATOIO 1 RESISTENZA
INTERRUTTORE	TIPO		3NW	5SP44		3NW	3NW		3NW	3NW		5SL+5SM
	P.D.I. (kA)			10								6
	N. POLI x In (A)			4x125								2x16
	CURVA / SGANCIAT.			C								C
	SOGLIA Irth (A)			125								16
	SOGLIA Irm (A)			10Irth								10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											0,3
	RITARDO (ms)											ISTANTANEO
	CLASSE											A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											3RT2027 | 24
	N. POLI x In (A)											3x32
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		3x4+N			3x32+N	2x2		2x2	2x2		
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					5SD74640						
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400							24	230		230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												CONTATTO SCATTATO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5711774 - www.comeccabit - email@comeccabit

CLIENTE : *HOTEL TRE FARINE*


IMPIANTO : *ELETTRICO CENTRALE TERMICA – HOTEL TRE FARINE*

DATA 24/06/26 | PAG. 1 DI 4 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QCT.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q2				Q3	Q4				Q5	Q6
NOME PROGETTO HOTEL TRE FARINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

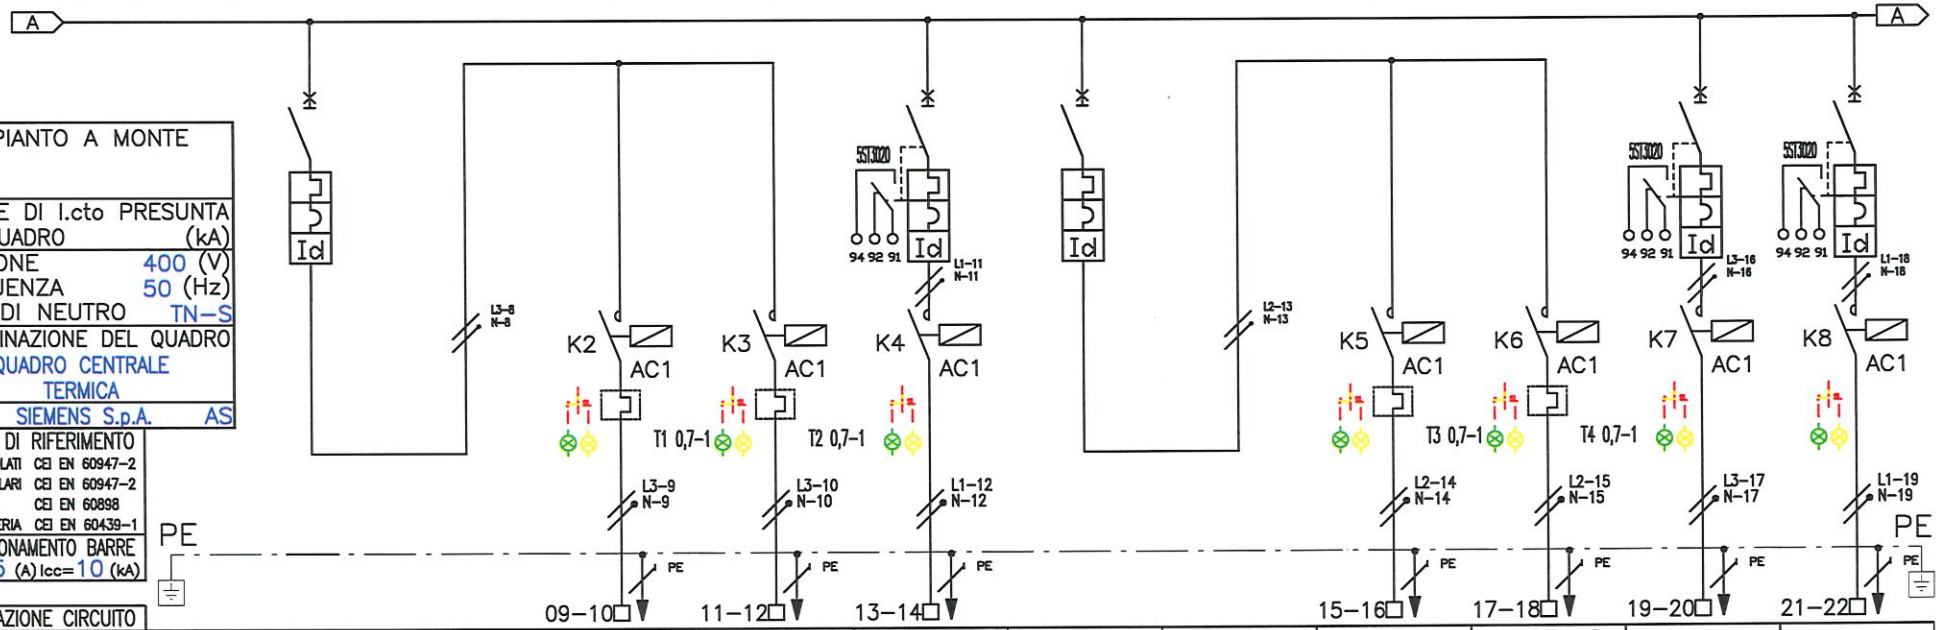

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO CENTRALE TERMICA
IP 55 SIEMENS S.p.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		SERB. 1		SERB. 1 P1	SERB. 1 P2	SERBATOIO 2 RESISTENZA	SERB. 2		SERB. 2 P3	SERB. 2 P4	SERBATOIO 3	SERBATOIO 4
INTERRUTTORE	TIPO	5SL+5SM				5SL+5SM	5SL+5SM				5SL+5SM	5SL+5SM
	P.D.I. (kA)	6				6	6				6	6
	N. POLI x In (A)	2x10				2x16	2x10				2x16	2x16
	CURVA / SGANCIAT.	C				C	C				C	C
	SOGLIA Irth (A)	10				16	10				16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth				10Irth	10Irth				10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3				0,3	0,3				0,3	0,3
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO				ISTANTANEO	ISTANTANEO				ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A				A	A				A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)			3RT2015 24	3RT2015 24	3RT2027 24			3RT2015 24	3RT2015 24	3RT2027 24	3RT2027 24
	N. POLI x In (A)			3x7	3x7	3x32			3x7	3x7	3x32	3x32
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)			230	230	230			230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO RELE' TERMICO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC				CONTATTO SCATTATO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC				CONTATTO SCATTATO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO SCATTATO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80129-NAPOLI-Via G. Palatella n. 19 - 081/5511774 - www.comecnaples.it - email@comecnaples.it

CLIENTE : *HOTEL TRE FARINE*


IMPIANTO : *ELETTRICO CENTRALE TERMICA – HOTEL TRE FARINE*

DATA 24/06/26 | PAG. 2 DI 4 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QCT.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
NOME PROGETTO HOTEL TRE FARINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

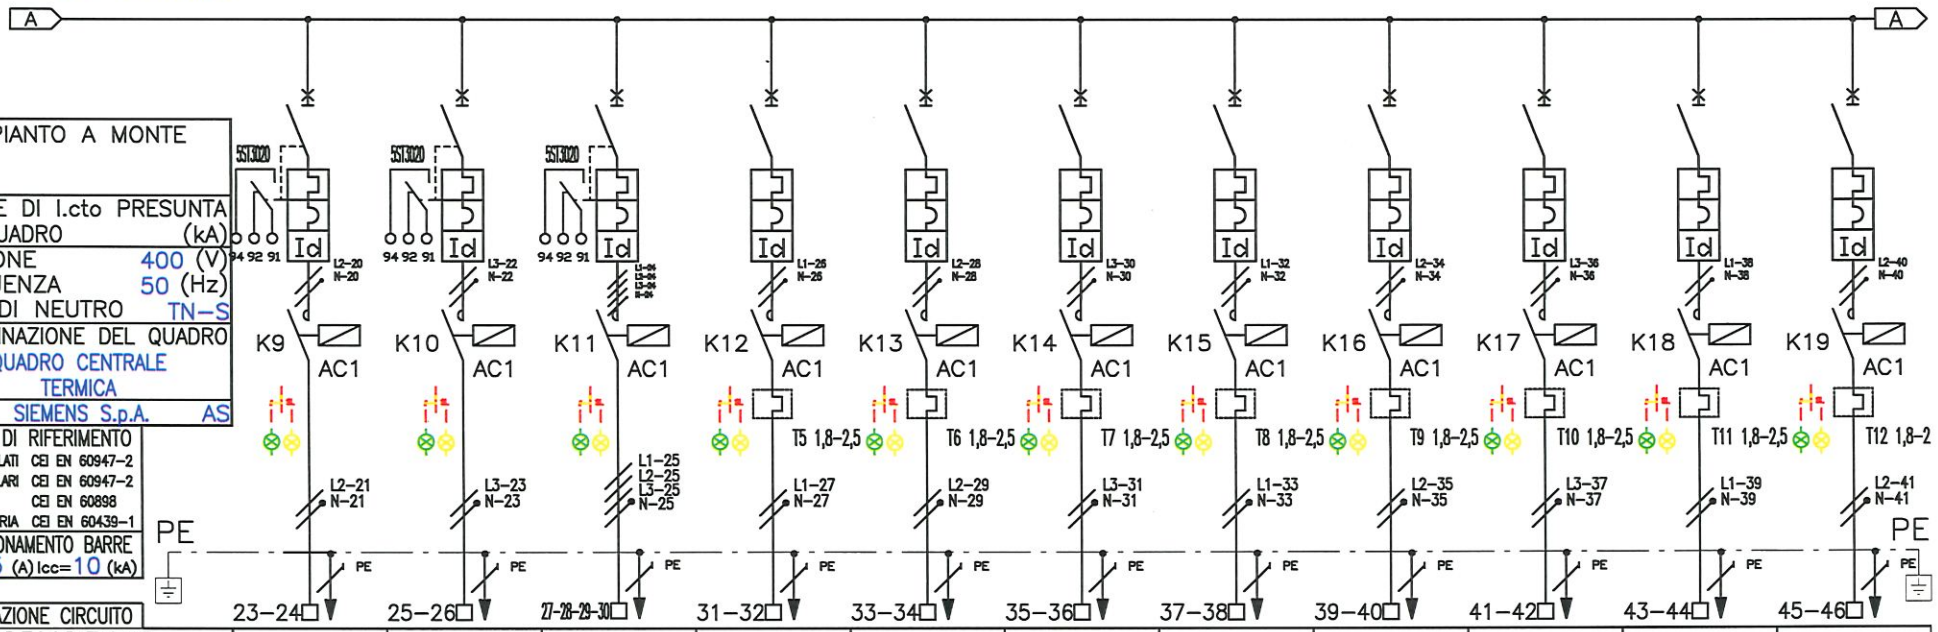

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO CENTRALE TERMICA
IP 55 SIEMENS S.p.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	SERBATOIO 5	SERBATOIO 6	IDROBOX	CIRCOLATORE 1	CIRCOLATORE 2	CIRCOLATORE 3	CIRCOLATORE 4	CIRCOLATORE 5	CIRCOLATORE 6	CIRCOLATORE 7	CIRCOLATORE 8
INTERRUTTORE	TIPO	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM
	P.D.I. (kA)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	4x16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)	3RT2027 | 24	3RT2027 | 24	AF164 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24	3RT2015 | 24
	N. POLI x In (A)	3x32	3x32	4x30	3x7	3x7	3x7	3x7	3x7	3x7	3x7	3x7
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	400	230	230	230	230	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO SCATTATO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO SCATTATO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO SCATTATO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC	CONTATTO RELE' TERMICO CONTATO CONTATTORI 2NO+2NC
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081/5711774 - www.comecsrl.it - email@comecsrl.it


CLIENTE : *HOTEL TRE FARINE*

IMPIANTO : *ELETTRICO CENTRALE TERMICA - HOTEL TRE FARINE*

DATA 24/06/26	PAG. 3 DI 4	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QCT.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24				
NOME PROGETTO HOTEL TRE FARINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

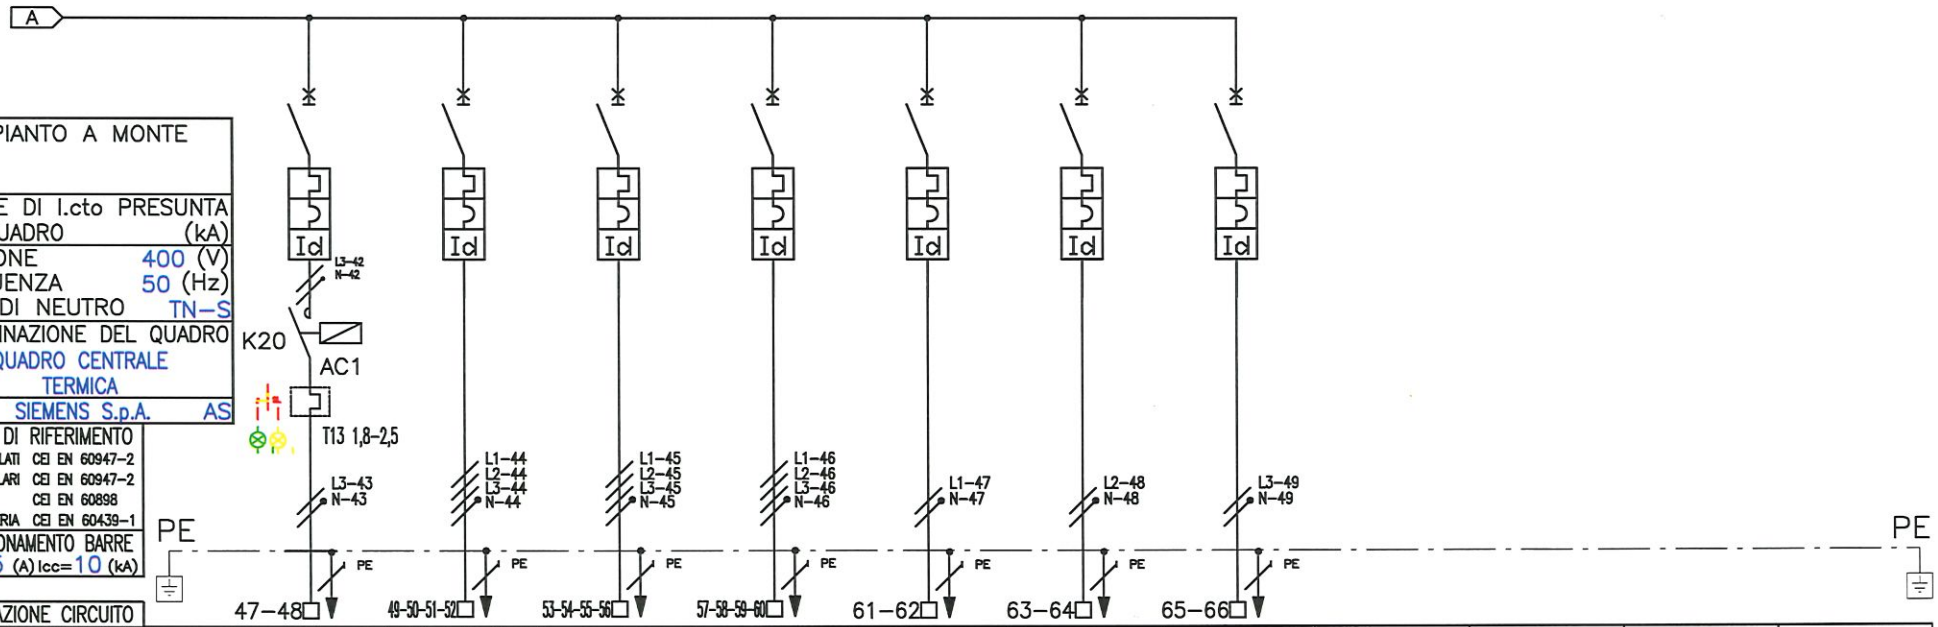

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO CENTRALE TERMICA
IP 55 SIEMENS S.p.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 125 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		47-48	49-50-51-52	53-54-55-56	57-58-59-60	61-62	63-64	65-66				
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		CIRCOLATORE 9	AUTOCLAVE BOOSTER	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA				
INTERRUTTORE	TIPO	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM				
	P.D.I. (kA)	6	6	6	6	6	6	6				
	N. POLI x In (A)	2x10	4x16	4x16	4x16	1x16+N	1x16+N	1x16+N				
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C				
	SOGLIA Irth (A)	10	16	16	16	16	16	16				
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth				
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3	0,3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03				
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO				
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A				
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)	3RT2015 24										
	N. POLI x In (A)	3x7										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	400	400	400	230	230	230				
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO RELE' TERMICO CONTATTO CONTATTORI 2NO+2NC										
NOTE												

COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80129-NAPOLI-Via G. Palatella n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - e-mail:info@comecsrl.it

CLIENTE : *HOTEL TRE FARINE*

IMPIANTO : *ELETTRICO CENTRALE TERMICA - HOTEL TRE FARINE*

DATA 24/06/26 | PAG. 4 DI 4 | Ed. 0
Disegnatore : A. Z. | File: QCT.DWG

TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	SUONERIA
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774


Data 24/06/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
HOTEL TRE FARINE
Note :

Descrizione:
QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 341/26
Cliente HOTEL TRE FARINE
Nome File : QCT.DWG
Percorso File : QCT.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 12
Rev. 0

PROTEZ. CIRCUITO AUSILIARE 24V	COMANDO RELE' R-OR1		SERBATOIO 1 RESISTENZA			
			COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

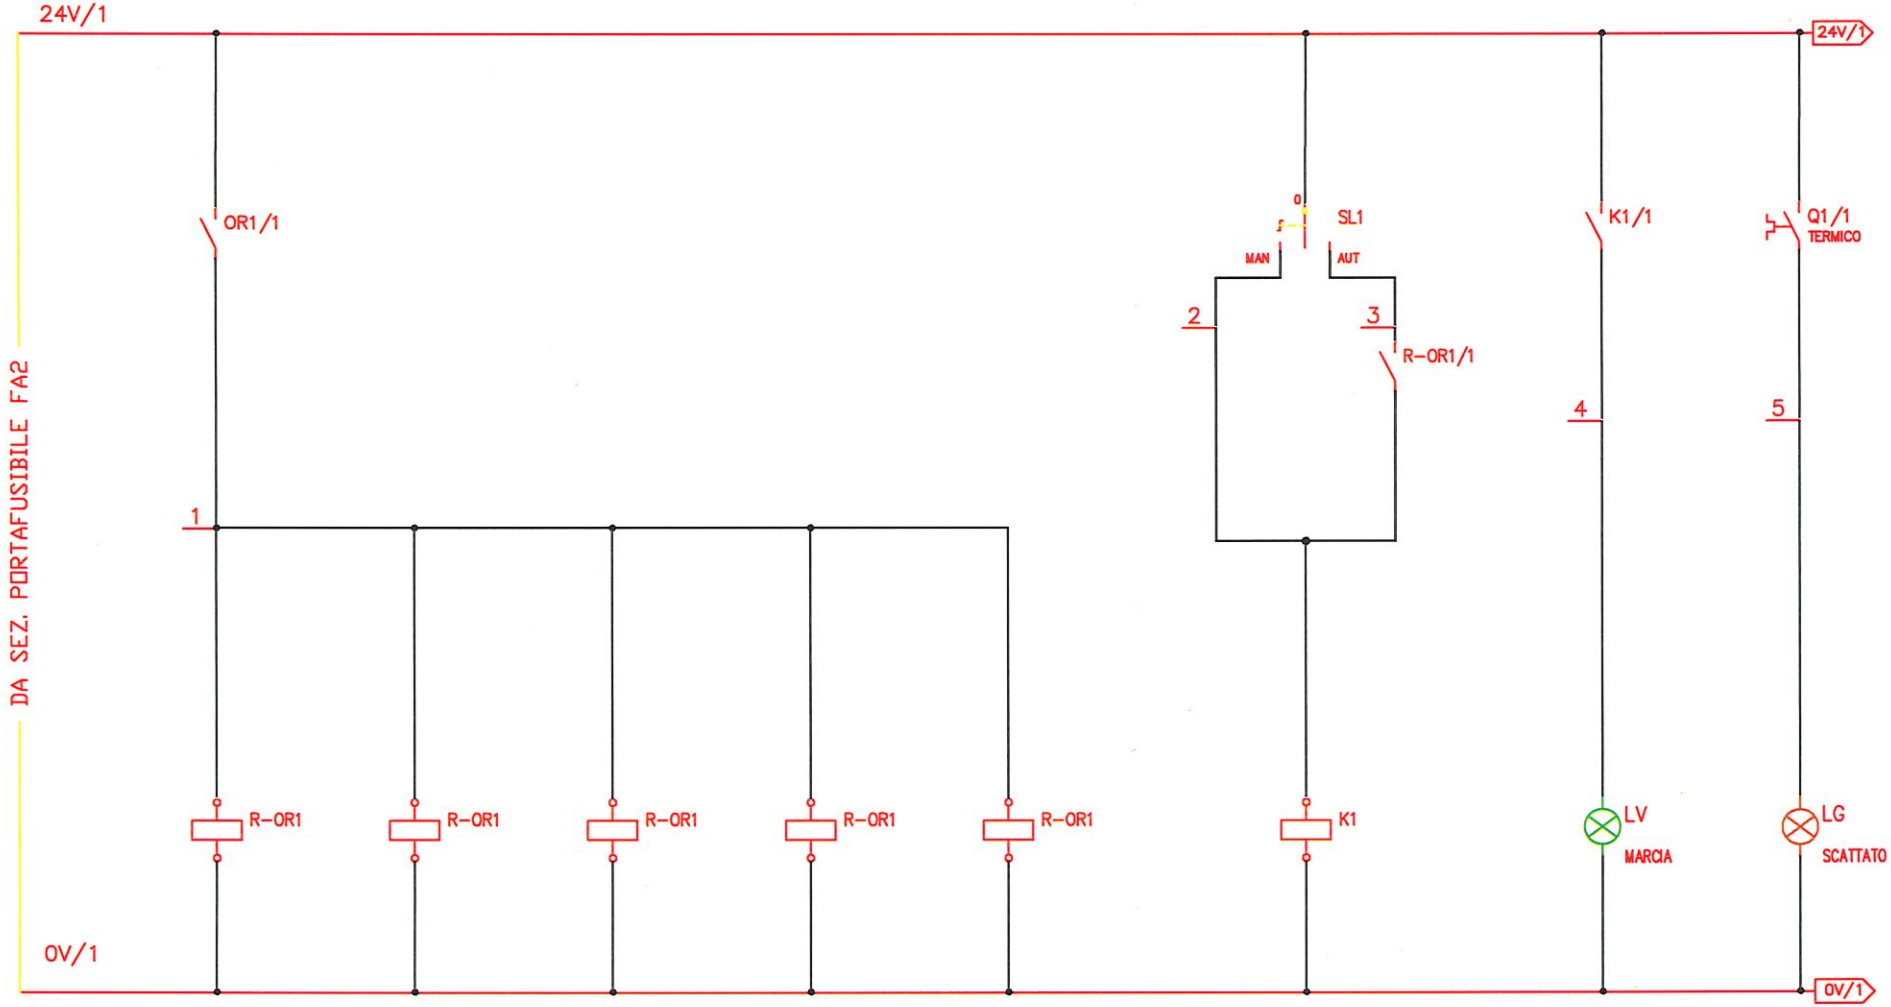


COMEC
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	341/26		
Disegn. A. Z.	HOTEL TRE FARINE	QUADRO CENTRALE TERMICA	Cliente	HOTEL TRE FARINE		
Proget.	Note :	SCHEMA AUSILIARE	Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 12	Rev. 0
visto						

SERBATOIO 1

POMPA 1		POMPA 1	POMPA 2	POMPA 2				
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	POMPA 1	POMPA 2	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

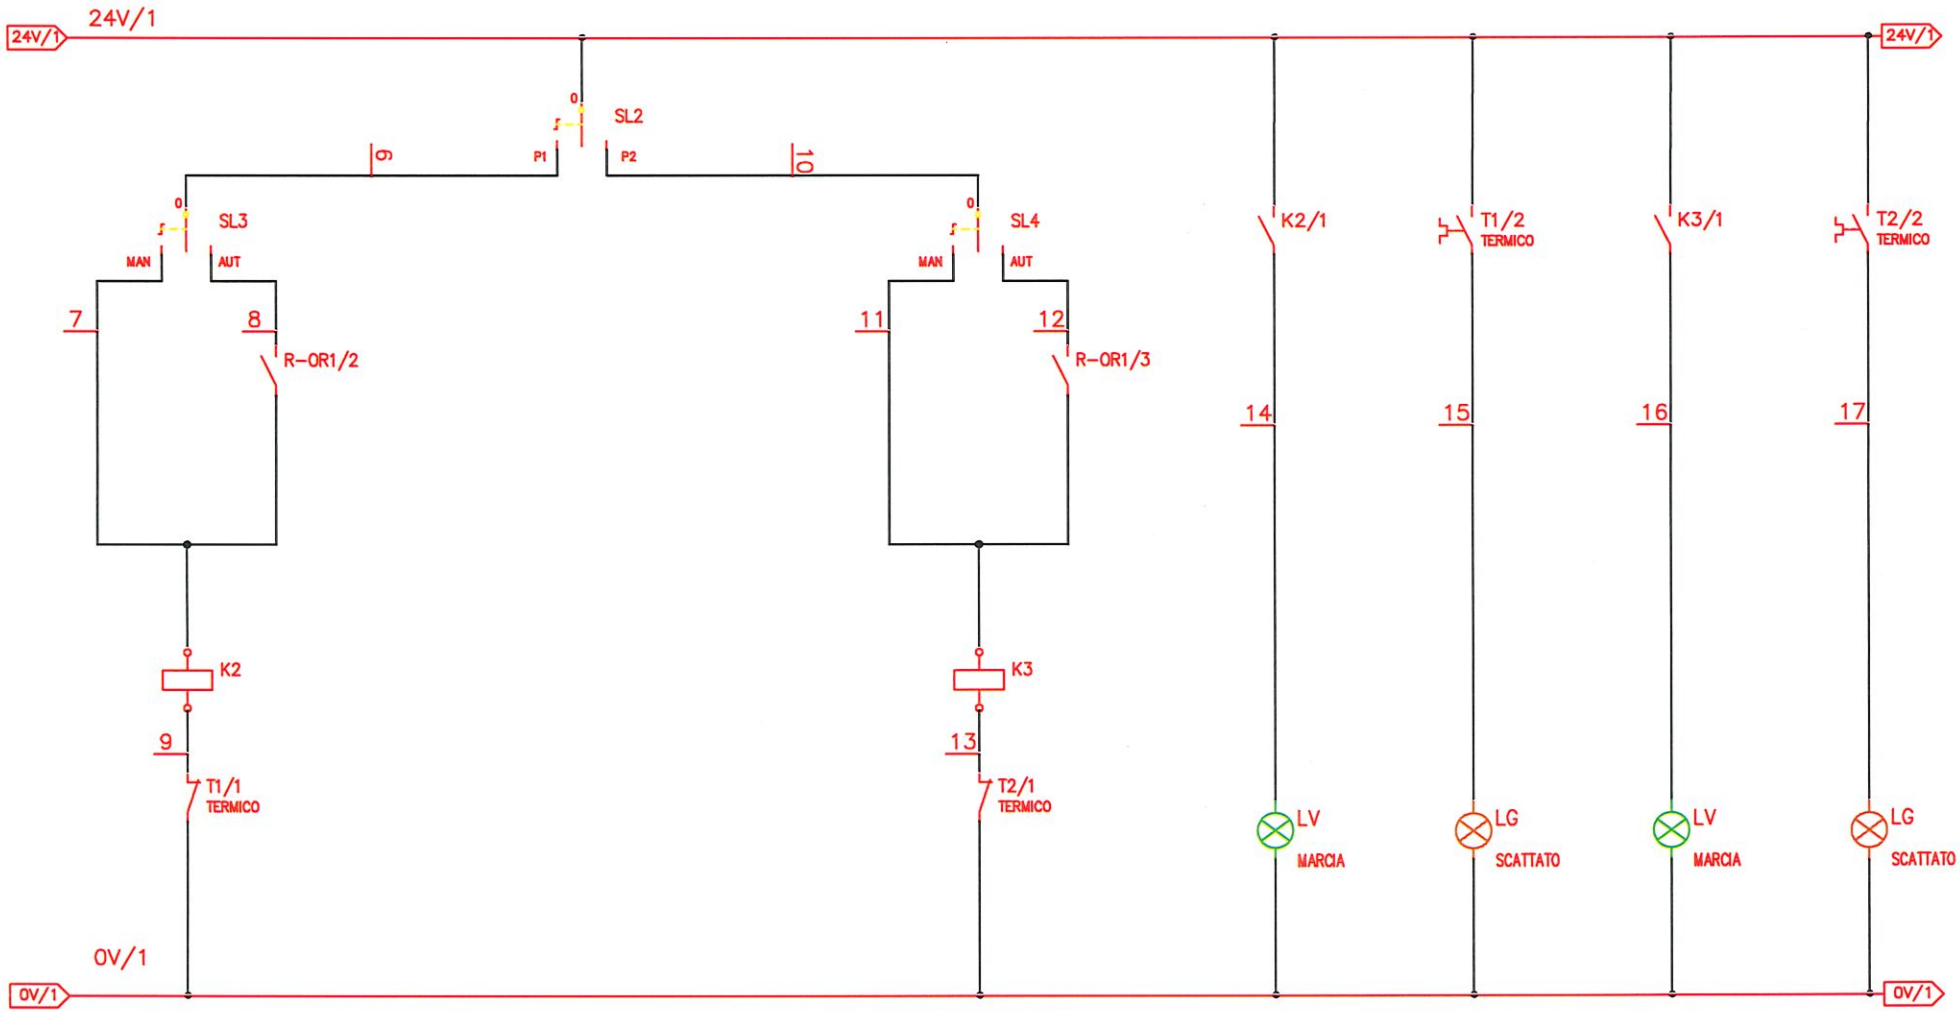

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :

Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE


Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QCT.DWG	QCT.DWG	3	12	0

SERBATOIO 2 RESISTENZA

COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

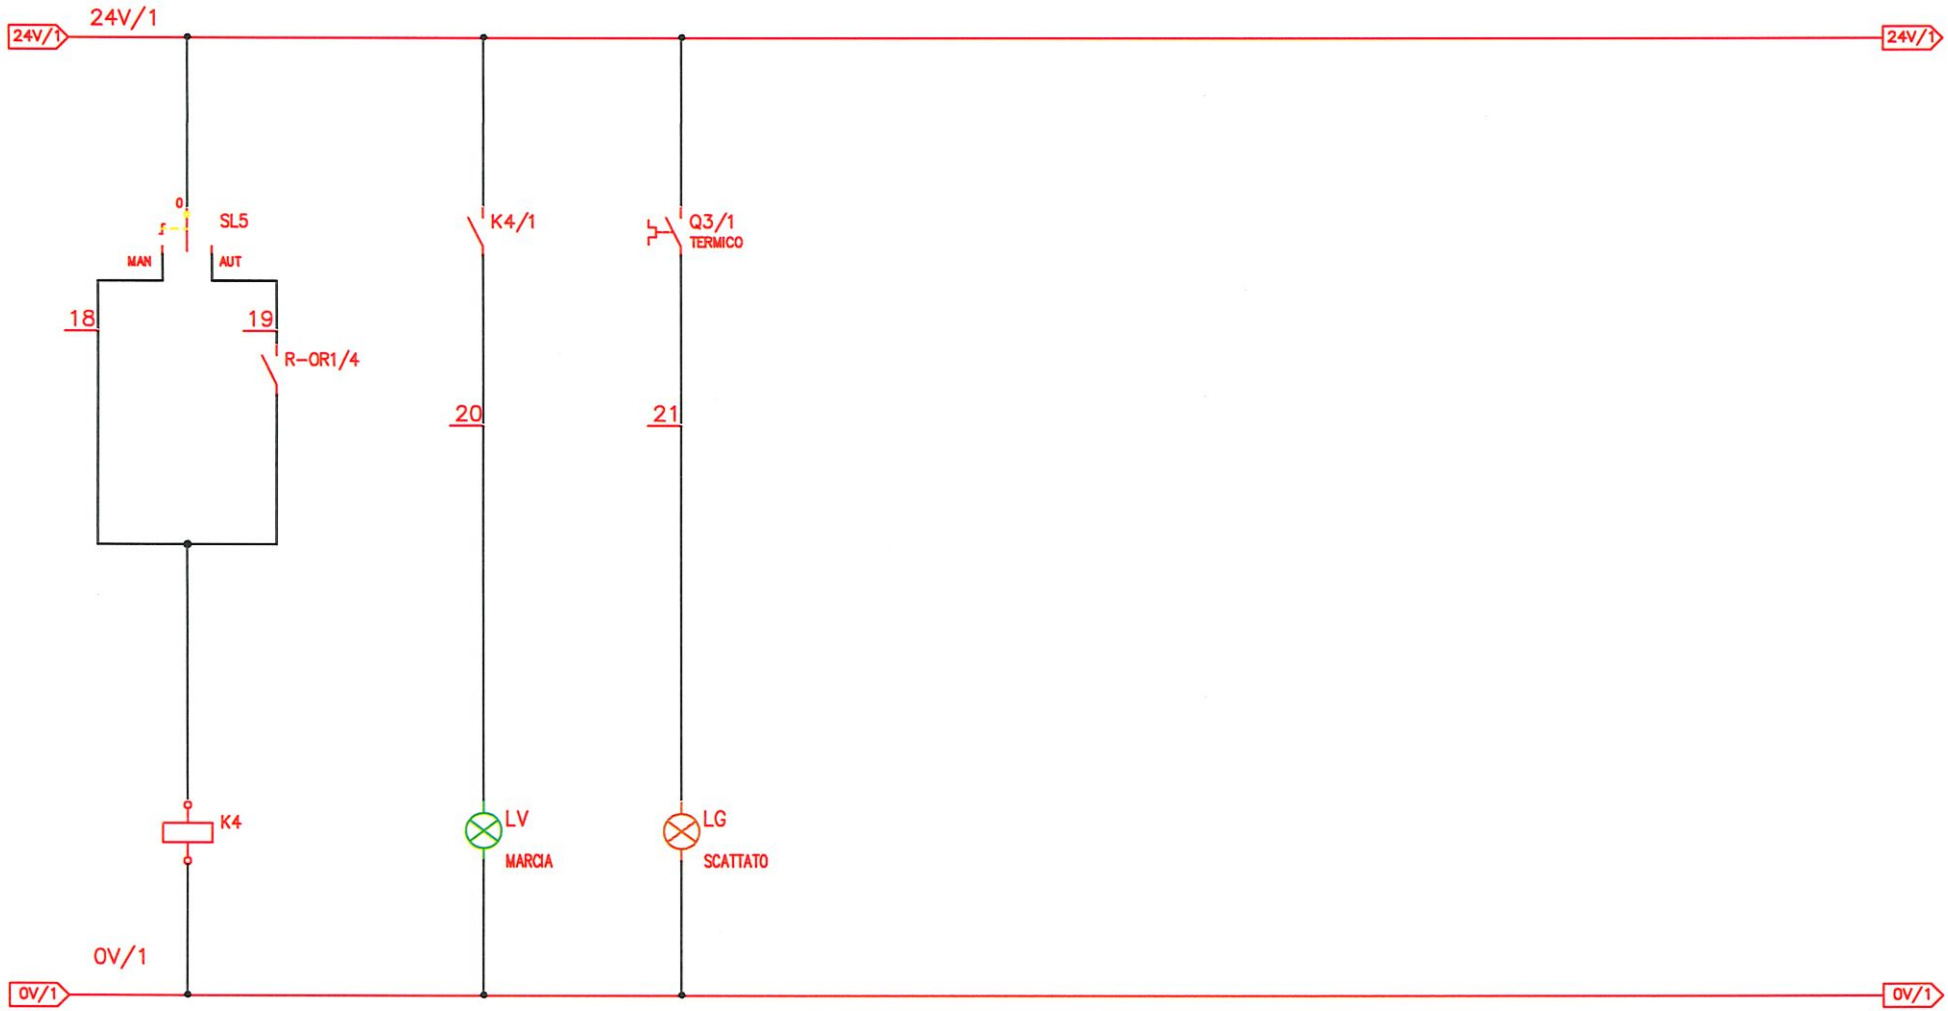


COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE	Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 341/26				
Disegn. A. Z.			Cliente HOTEL TRE FARINE				
Proget.	Note :		Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 12	Rev. 0
visto							

SERBATOIO 2

POMPA 3		POMPA 3	POMPA 4	POMPA 4				
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO			COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

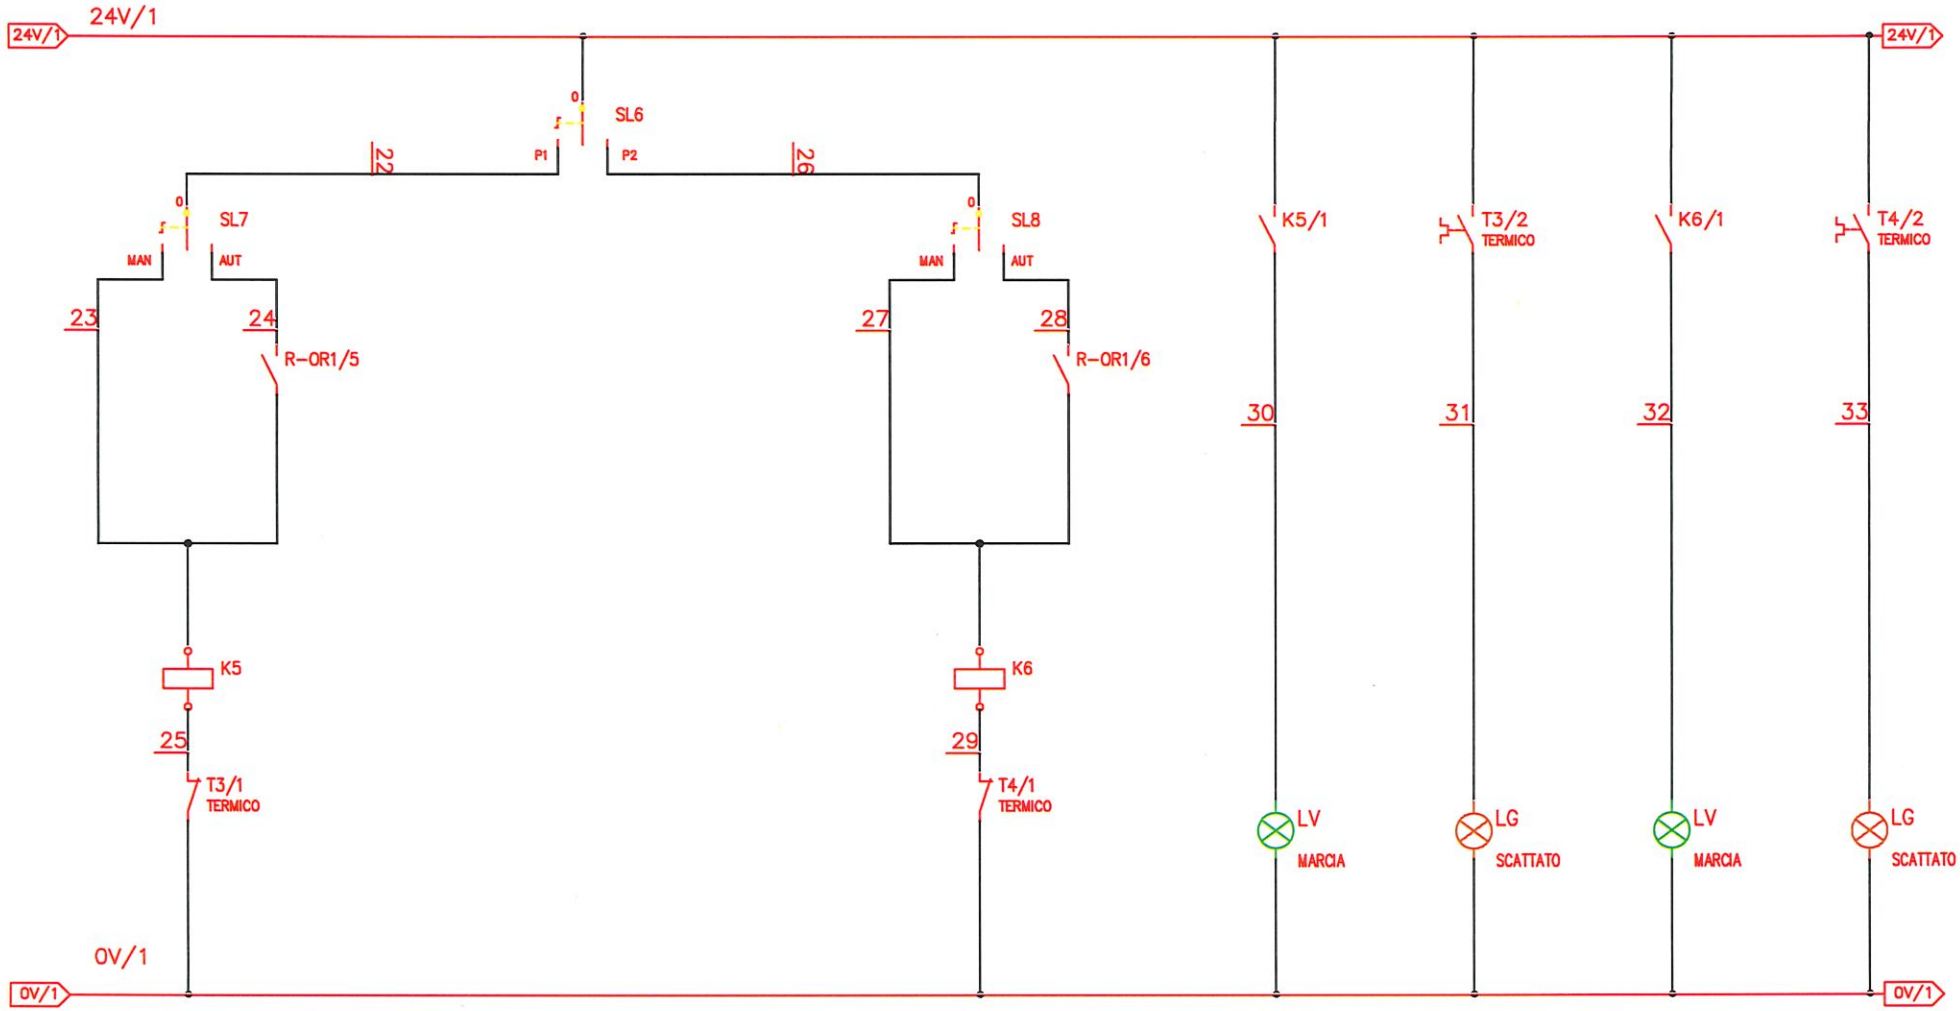

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
HOTEL TRE FARINE

Note :

Descrizione:
QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 341/26
Cliente HOTEL TRE FARINE
Nome File : QCT.DWG
Percorso File : QCT.DWG
Nr. Foglio 5
Nr. Fogli 12
Rev. 0


SERBATOIO 3				SERBATOIO 4			
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

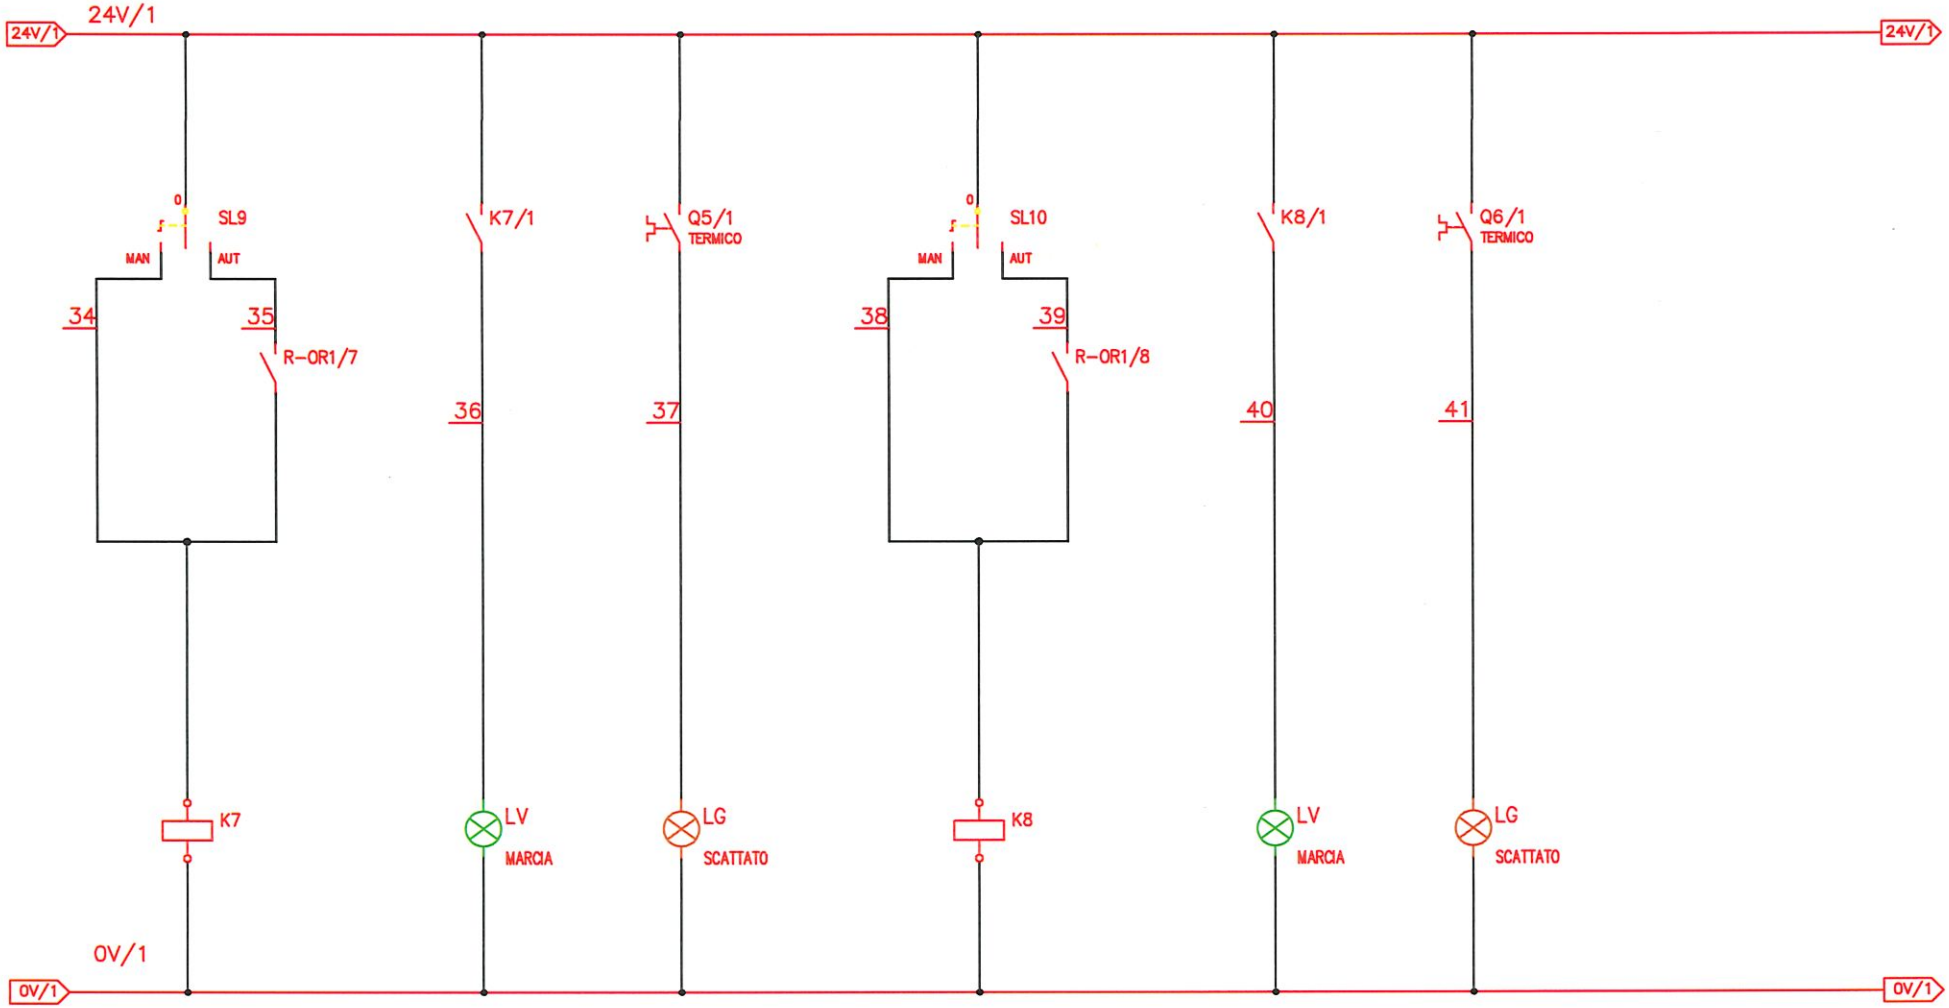

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE	Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 341/26				
Disegn. A. Z.			Cliente HOTEL TRE FARINE				
Proget.	Note :		Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 12	Rev. 0
visto							

SERBATOIO 5				SERBATOIO 6			
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

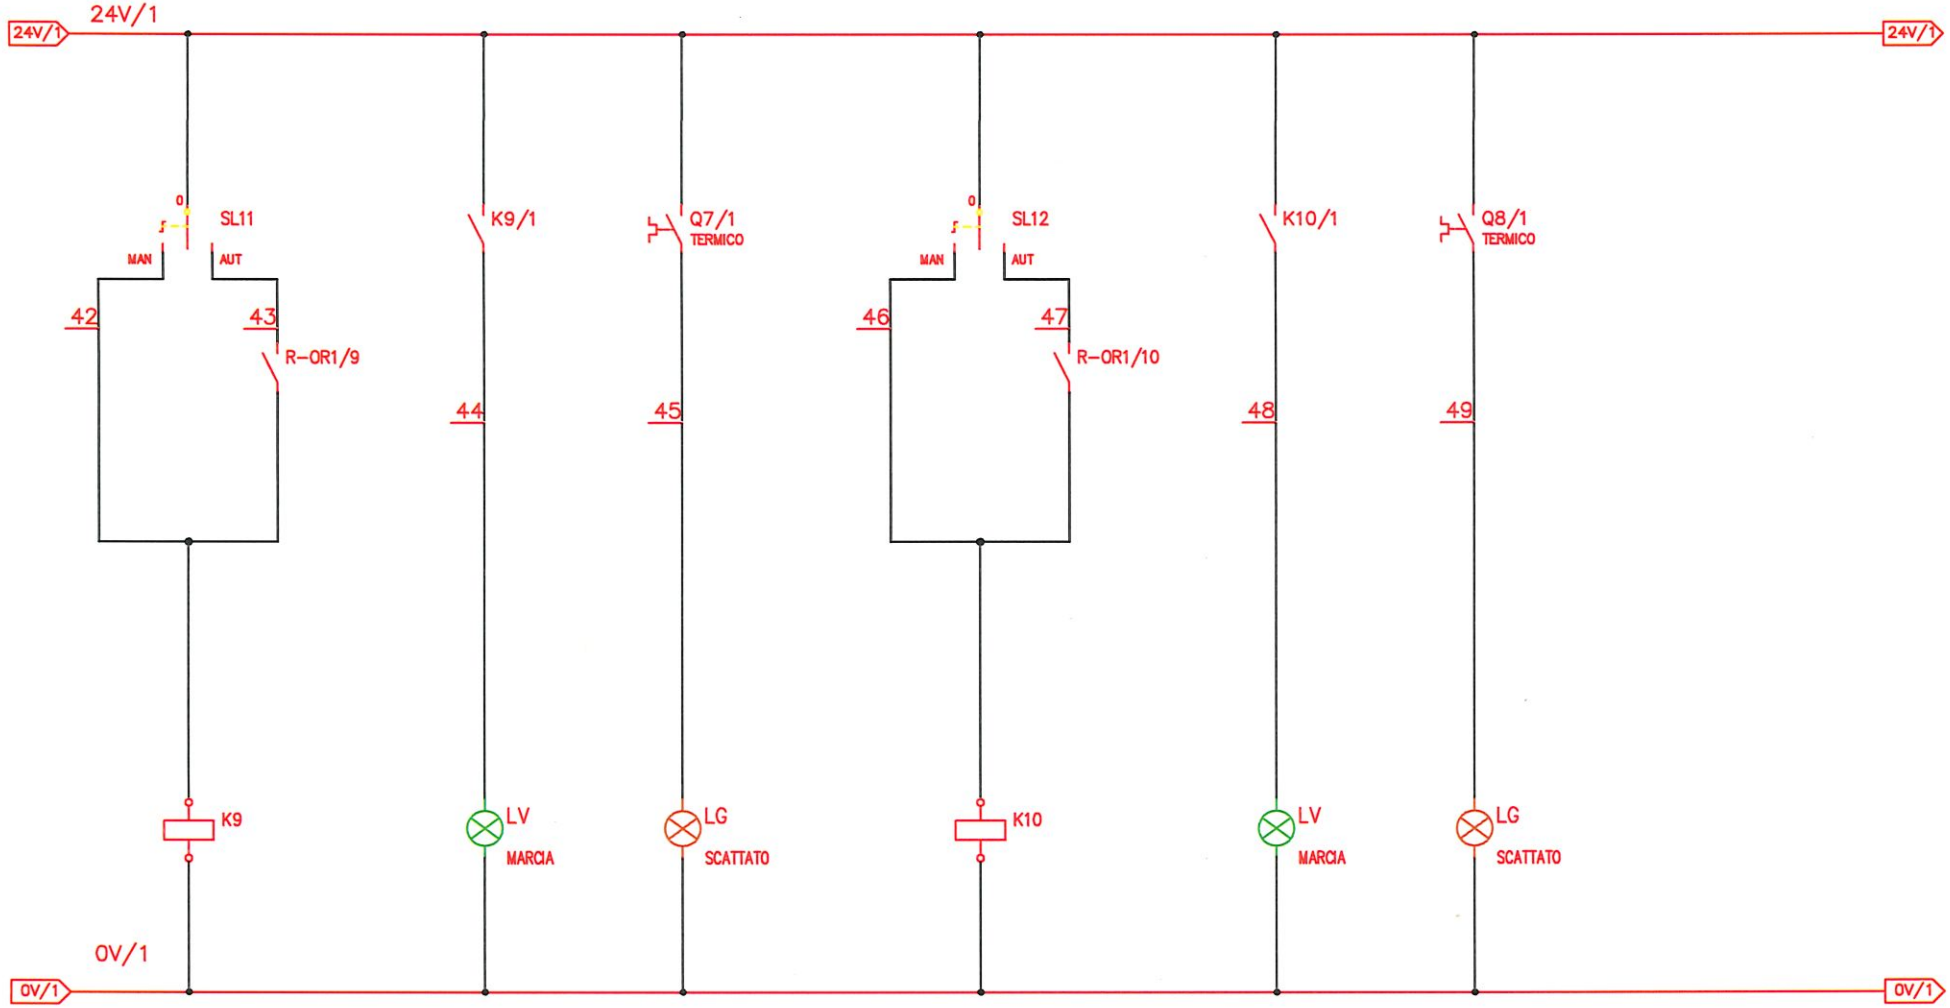

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :


Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QCT.DWG	QCT.DWG	7	12	0

IDROBOX				CIRCOLATORE 1				
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	

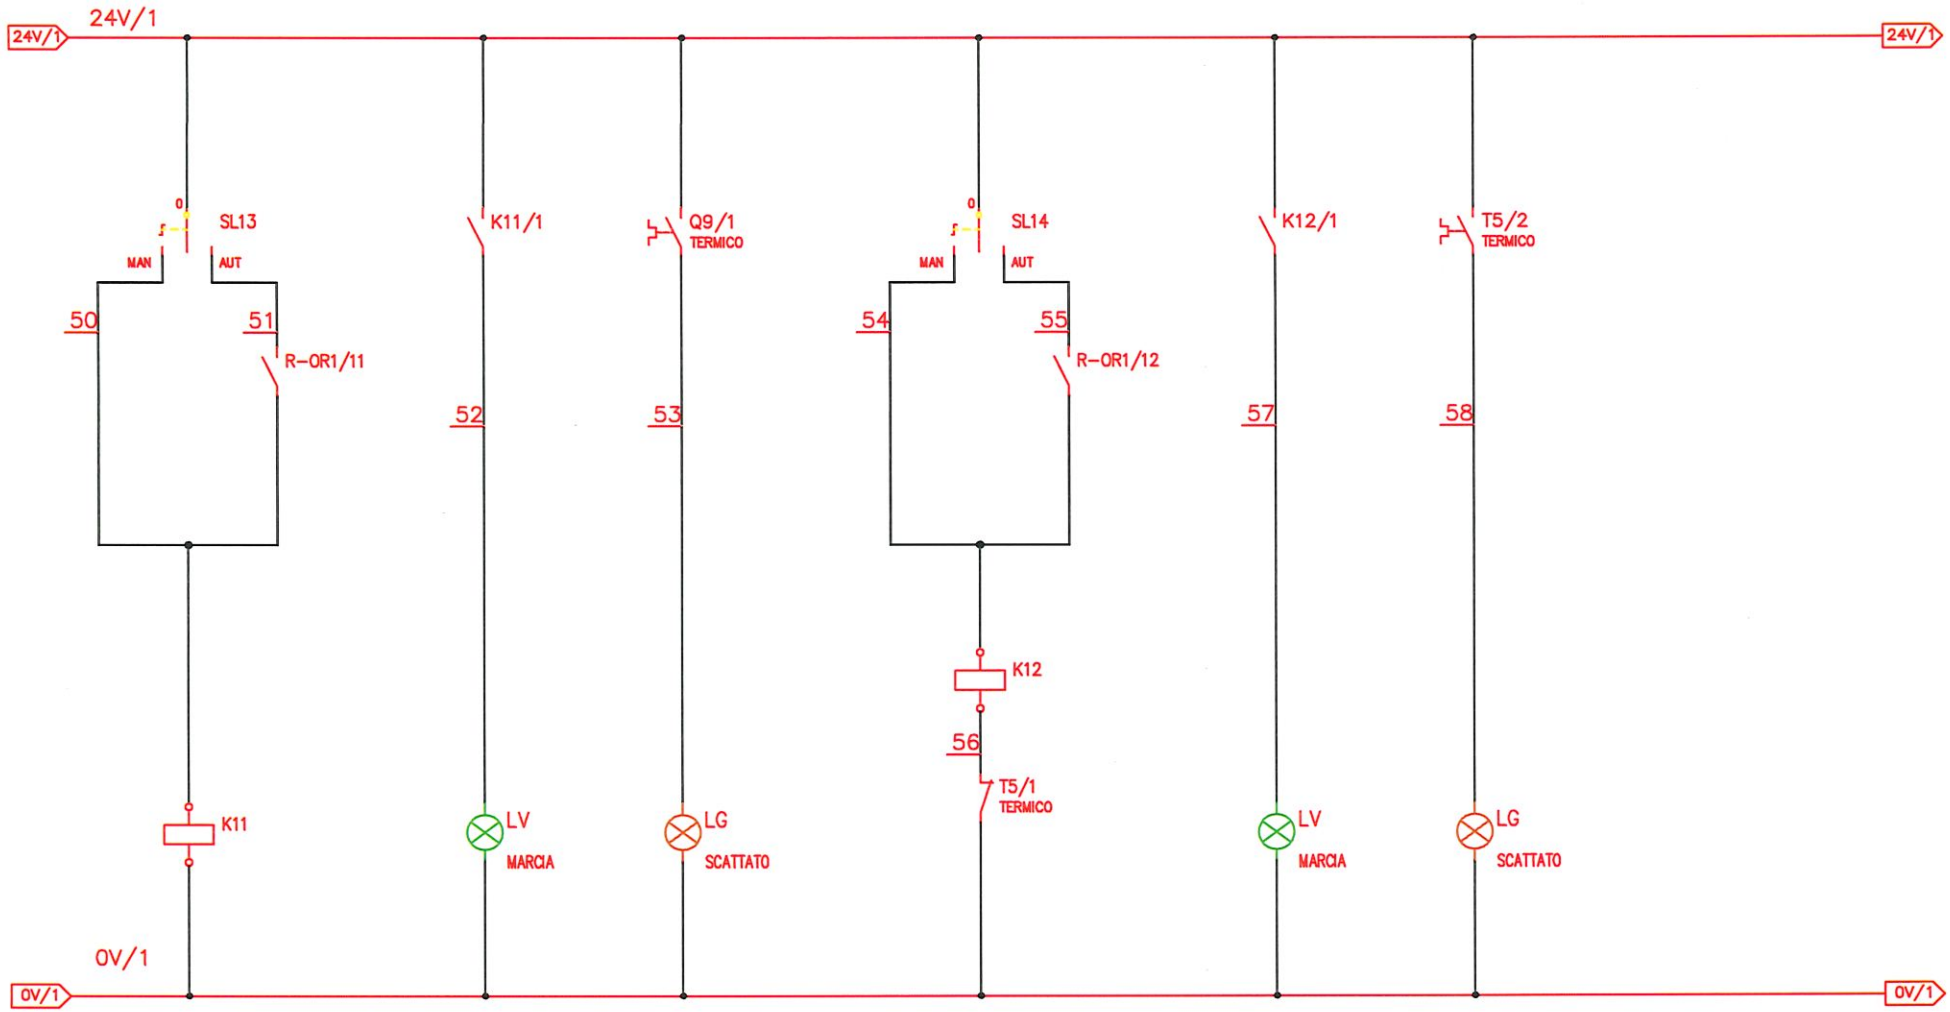

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :


Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QCT.DWG	QCT.DWG	8	12	0

CIRCOLATORE 2				CIRCOLATORE 3			
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

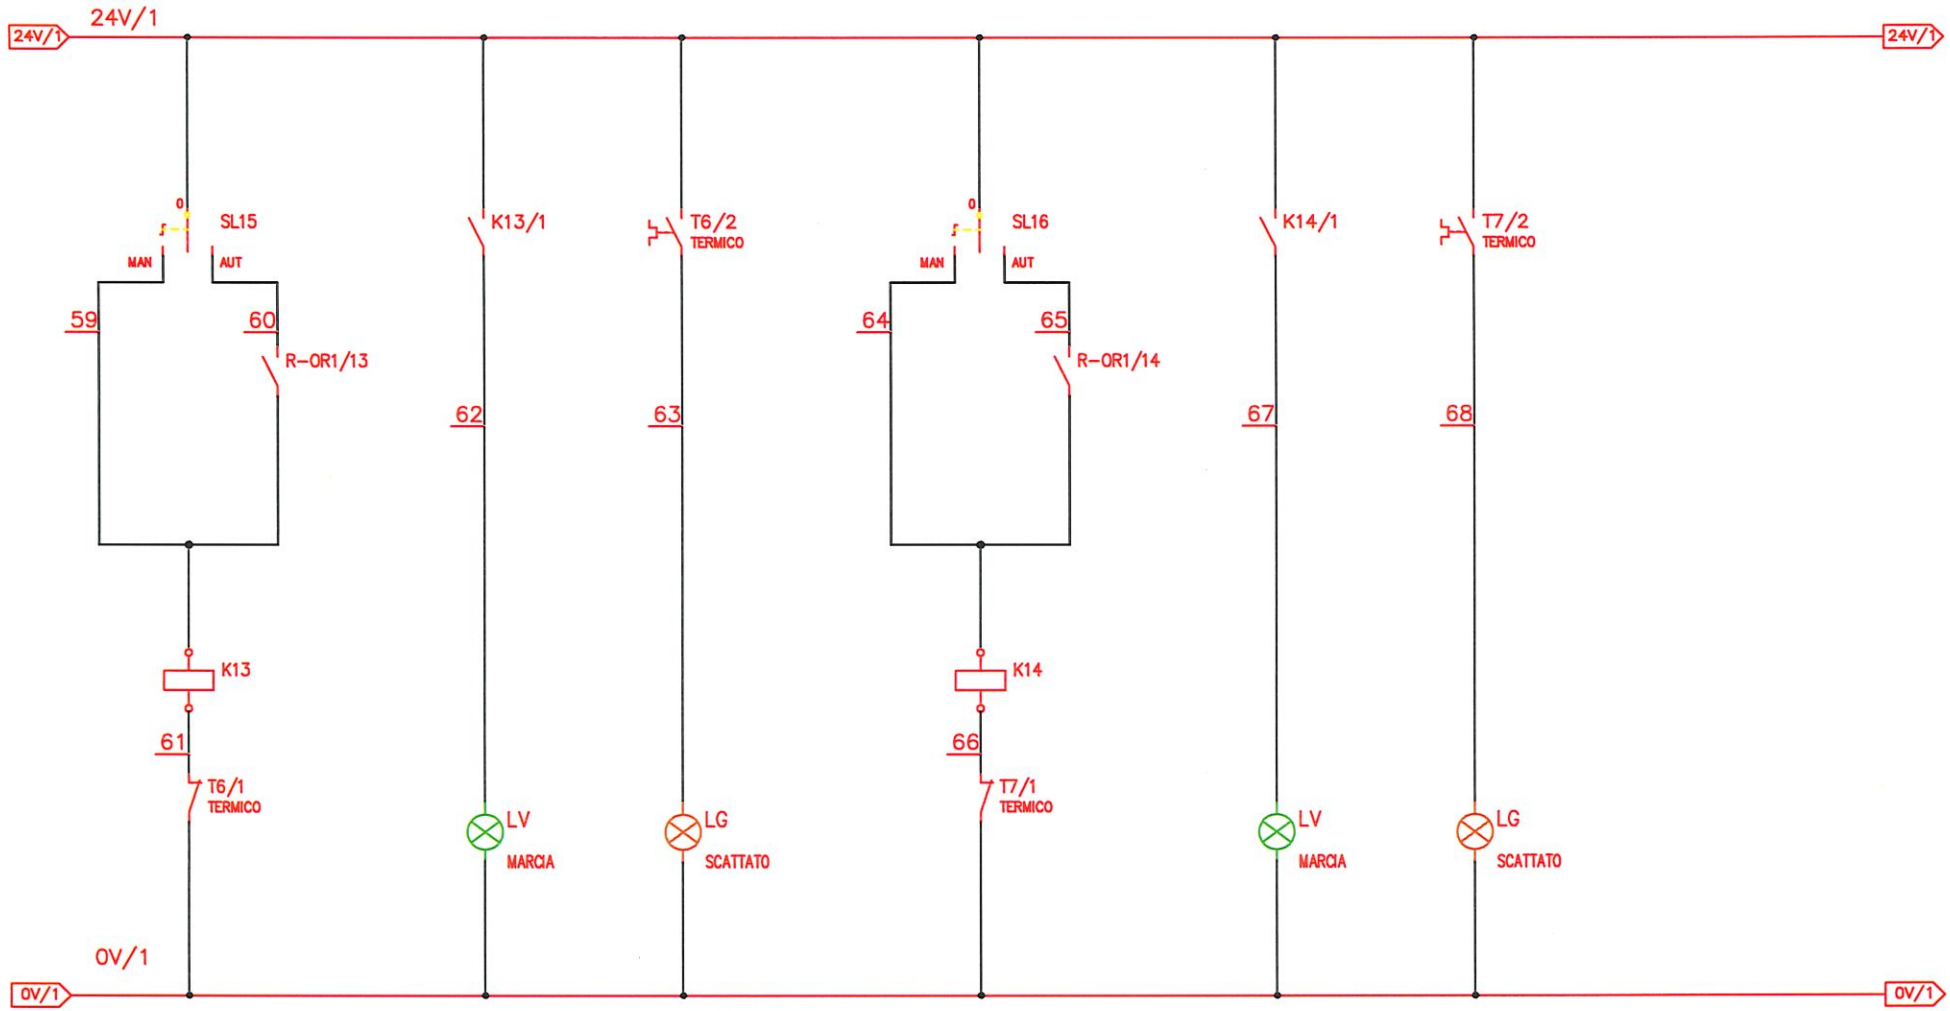

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :


Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QCT.DWG	QCT.DWG	9	12	0


CIRCOLATORE 4				CIRCOLATORE 5			
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

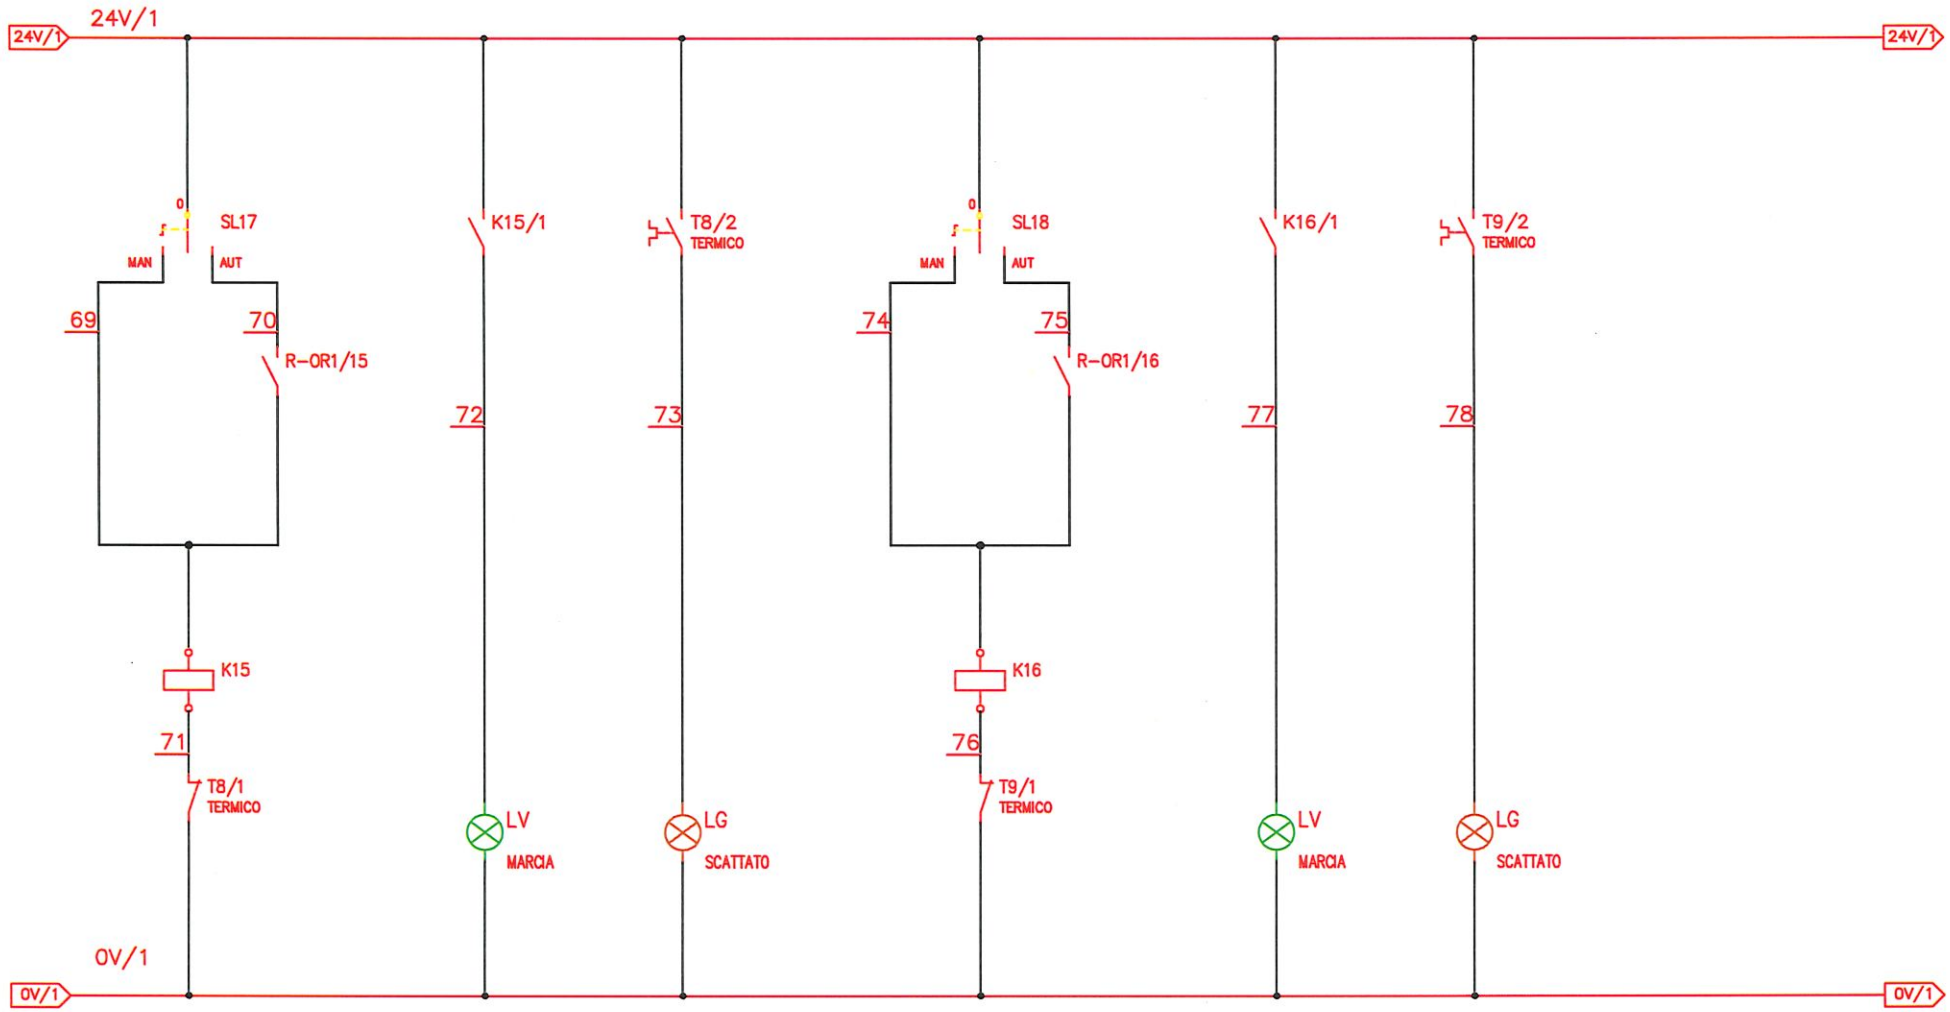

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE	Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 341/26		
Disegn. A. Z.			Cliente HOTEL TRE FARINE		
Proget.	Note :		Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 10 / Nr. Fogli 12 / Rev. 0
visto					

CIRCOLATORE 6				CIRCOLATORE 7			
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

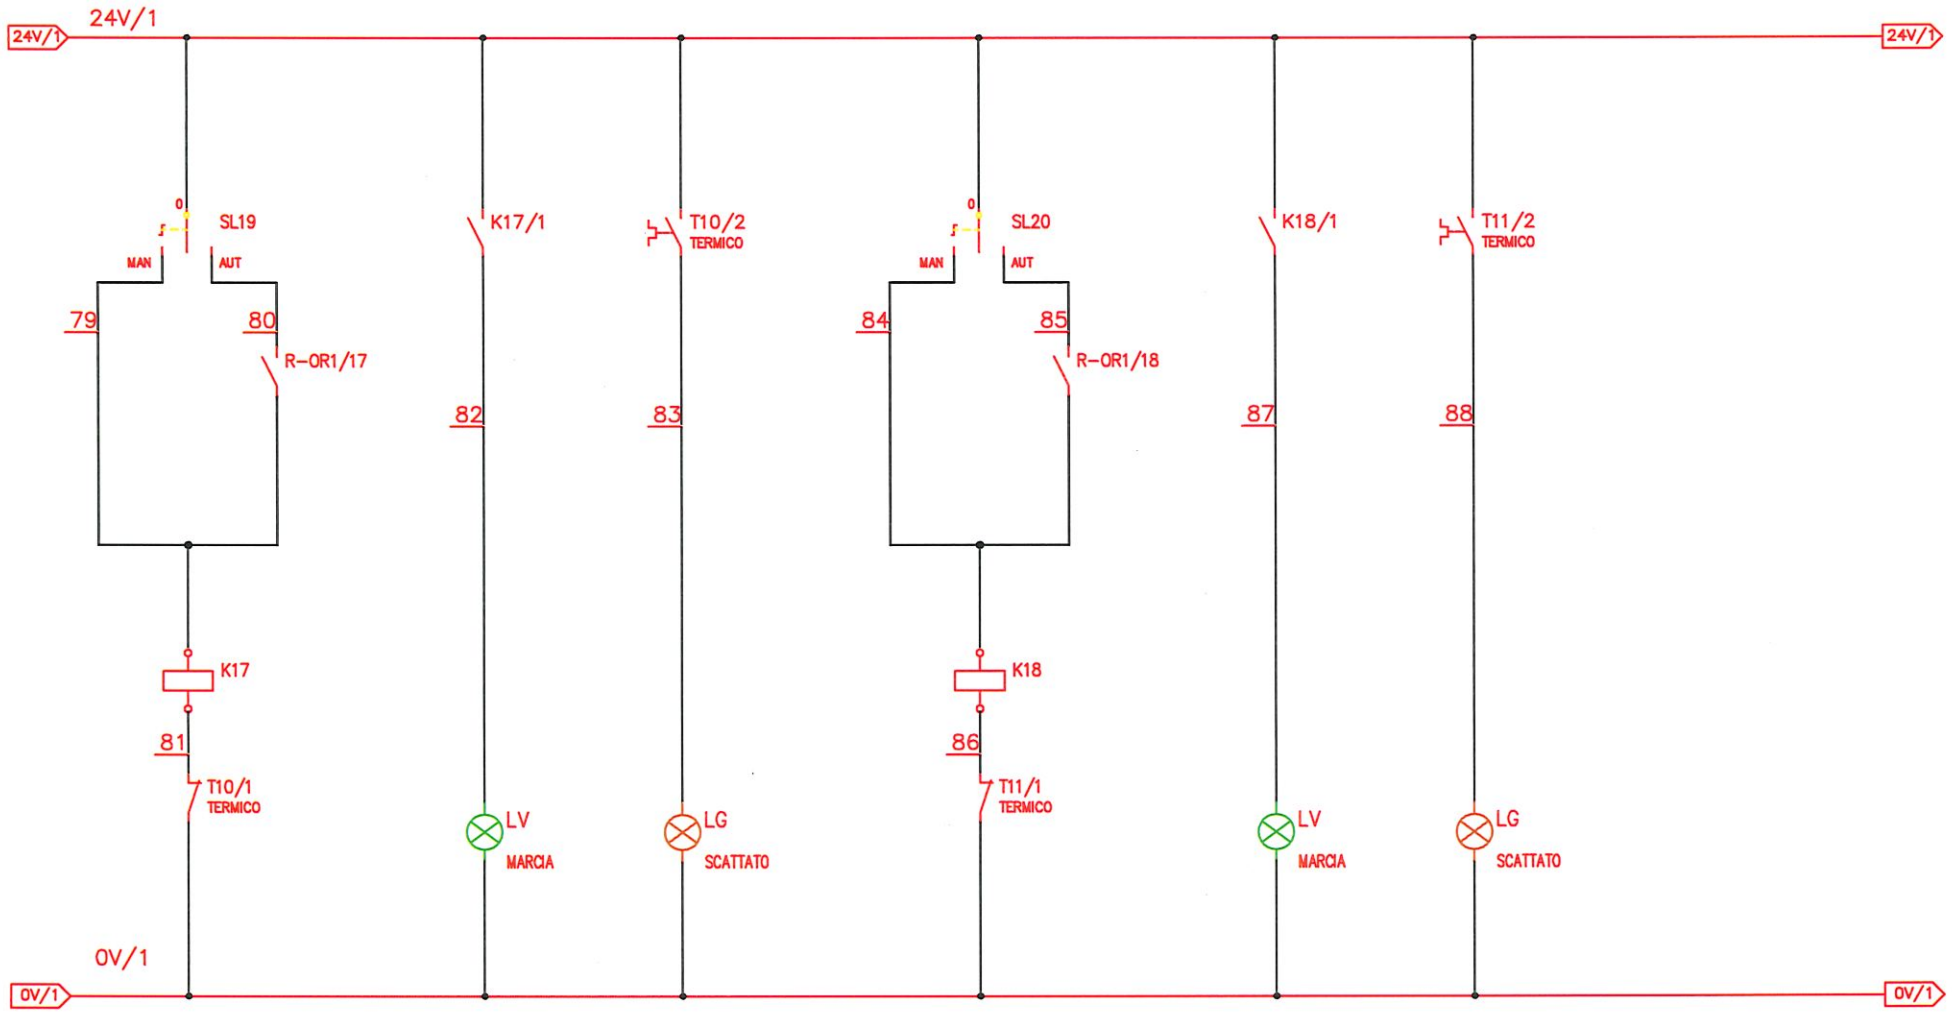

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :


Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QCT.DWG	QCT.DWG	11	12	0

CIRCOLATORE 8				CIRCOLATORE 9			
COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO	COMANDO MANUALE	COMANDO AUTOMATICO	MARCIA	SCATTATO TERMICO

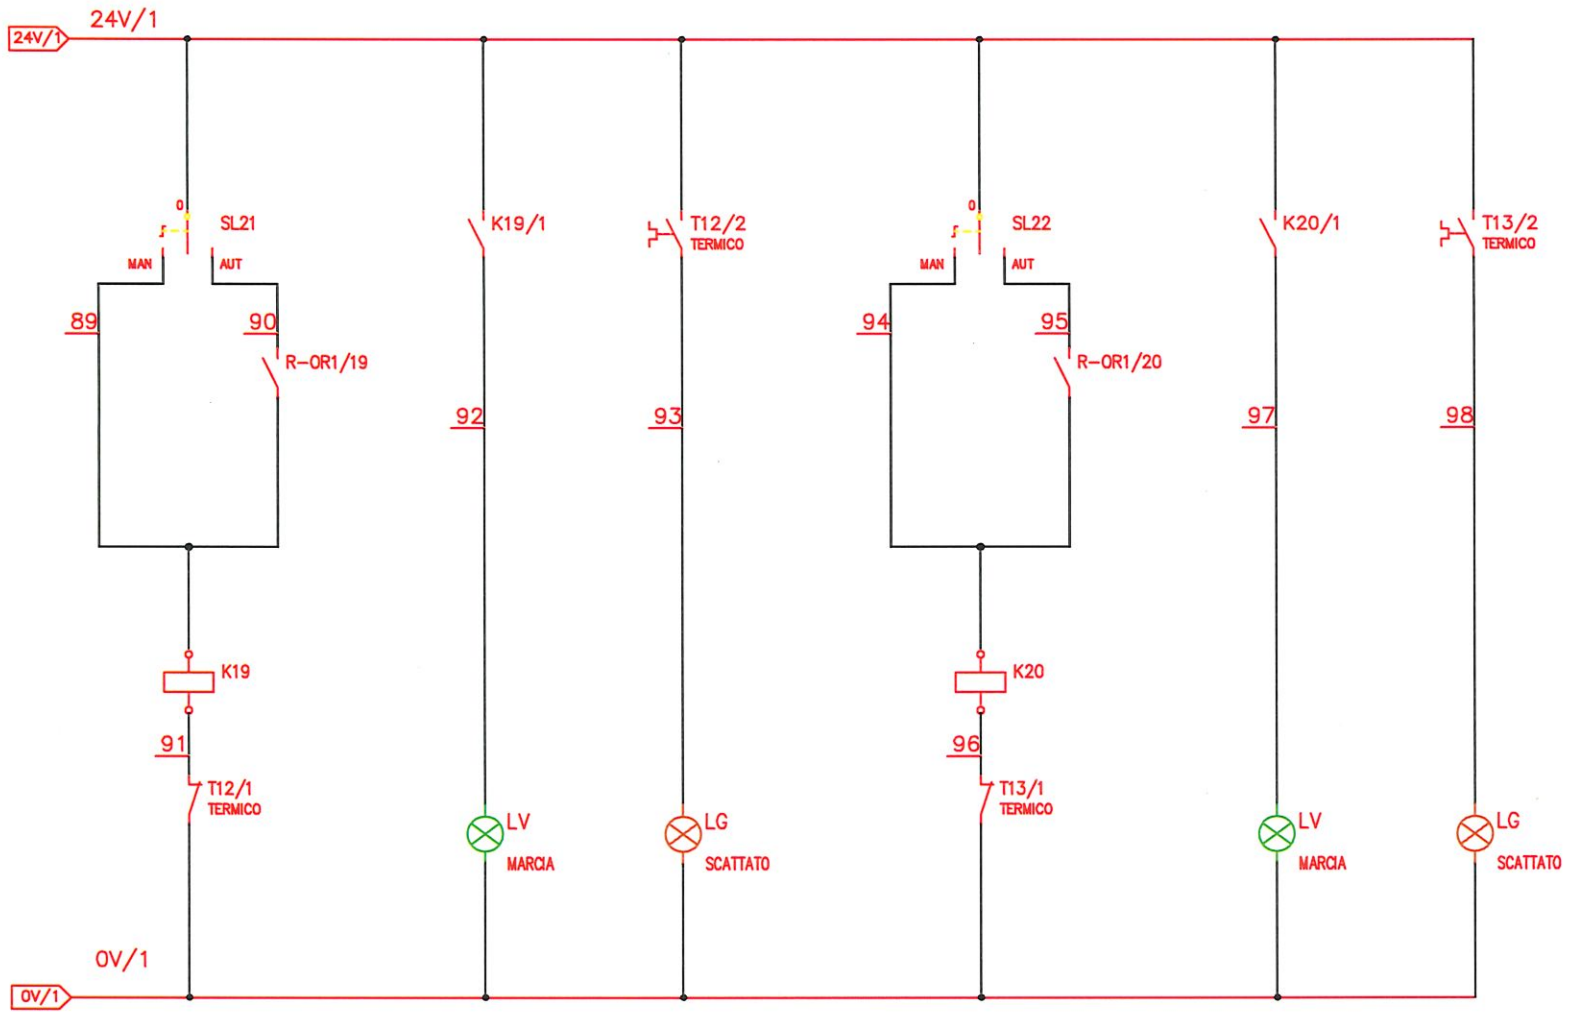

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :

Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QCT.DWG	QCT.DWG	12	12	0

LEGENDA MORSETTIERA

X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	24/06/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE

Note :

Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 341/26

Cliente HOTEL TRE FARINE

Nome File : QCT.DWG


Percorso File : QCT.DWG

Nr. Foglio 1

Nr. Fogli 4

Rev. 0

MORSETTIERA X1

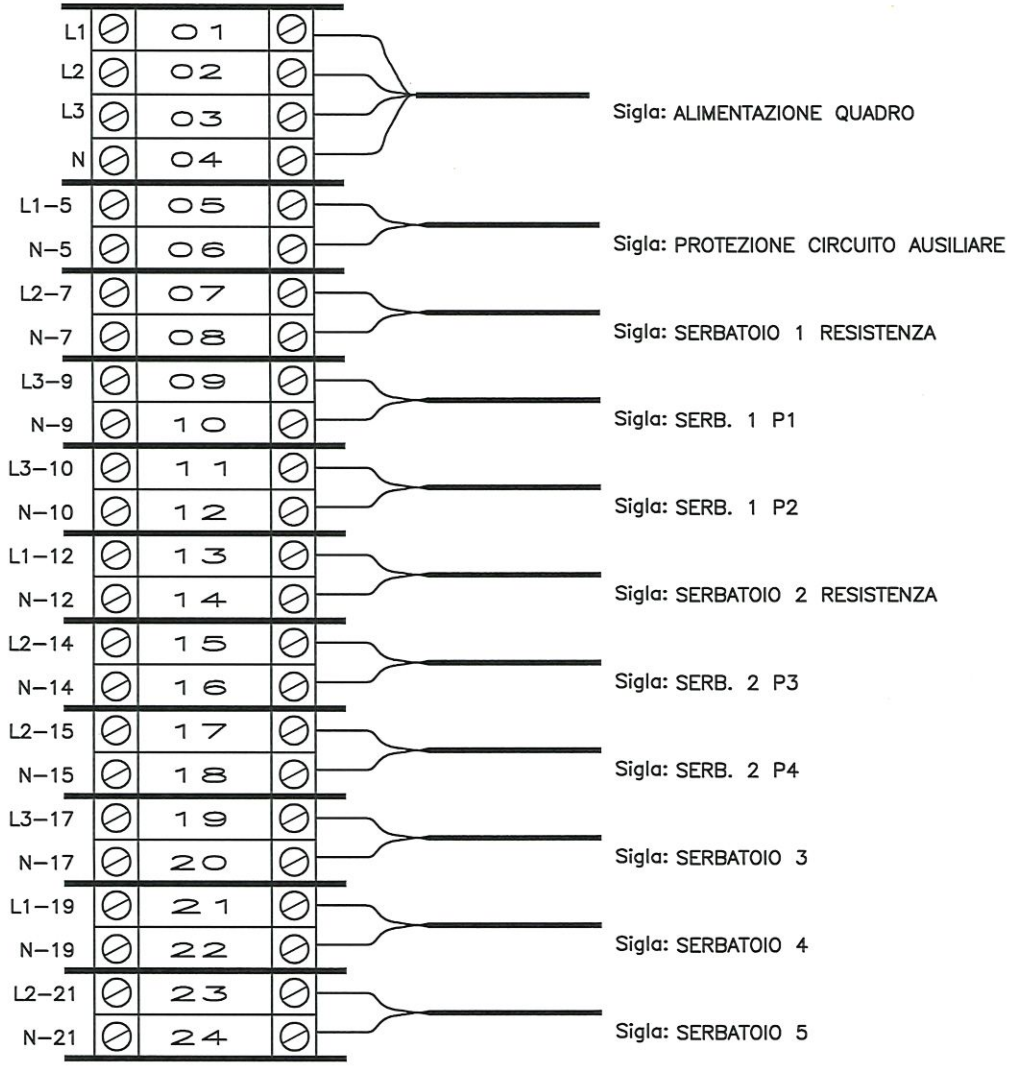


MORSETTIERA X1

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 341/26				
Disegn. A. Z.	HOTEL TRE FARINE	QUADRO CENTRALE TERMICA	Cliente HOTEL TRE FARINE				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 4	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1

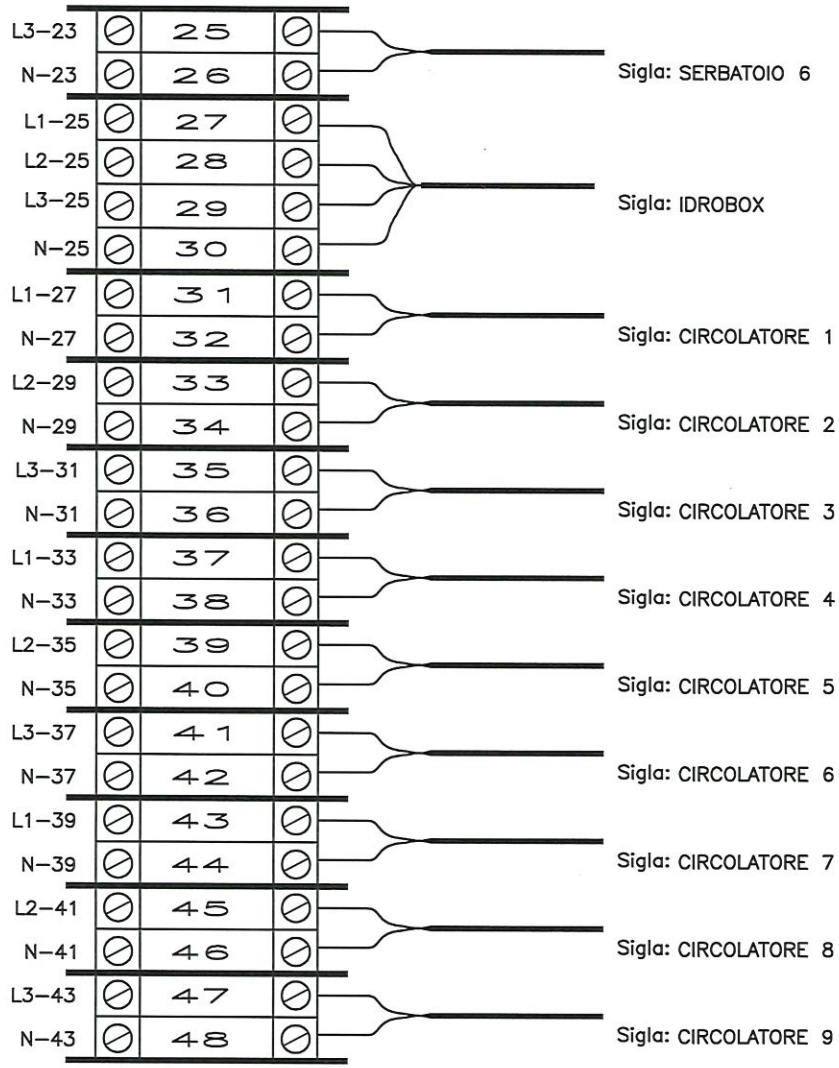


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo : HOTEL TRE FARINE	Descrizione: QUADRO CENTRALE TERMICA SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 341/26		
Disegn. A. Z.			Cliente HOTEL TRE FARINE		
Proget.	Note :		Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 3 / Nr. Fogli 4 / Rev. 0
visto					

MORSETTIERA X1

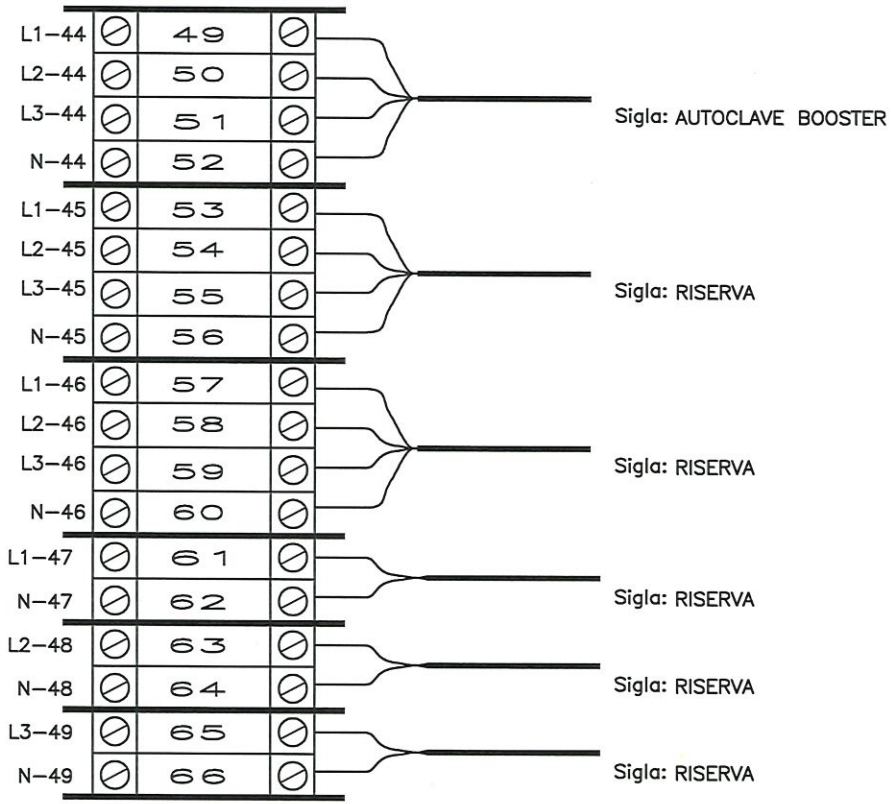

MORSETTIERA X1

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 24/06/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 341/26				
Disegn. A. Z.	HOTEL TRE FARINE	QUADRO CENTRALE TERMICA	Cliente HOTEL TRE FARINE				
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QCT.DWG	Percorso File : QCT.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 4	Rev. 0
visto							
