COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO GENERALE Q.E.G.



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	VERBALE COLLAUDO
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DI TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DI POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 13 / 04 / 2026 **Firma**

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI Via G. Paisiello, 19 - 80128 NAPOLI www.comeccab.it - P.Iva e C.F. 06414831211

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**ALFIERI S.p.A.** **S.S. 265 KM – 27.400 81025 Marcianise (CE)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico Generale**
Locazione del quadro:	**Ristorante Bellavista** **Via Monaca n.18 – Montesarchio (Bn)**
Quadro:	**QEG**
Identificazione del quadro:	**156 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	80 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	55
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	45
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	700x2010x260 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	Quadro 5 Hager Lume S.p.A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9010
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Hager Lume S.p.A.** serie **Quadro 5** in materiale metallico con trattamento della superfice zincato;

Colore Bianco Puro RAL9010;

Grado di Robustezza IK10

Classe di isolamento I

Specifiche Generiche:

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA BENEFICIO CARPENTERIA MONOBLOCCO METALLICA. 10 DIMENSIONI IN ALTEZZA, 3 IN LARGHEZZA E 2 IN PROFONDITÀ. Robusto e facilmente trasportabile. Possibilità di avere una singola struttura in 25 dimensioni diverse. IK10 CON PORTA PIENA O IN VETRO. DIVERSI GRADI DI PROTEZIONE. Porta esterna robusta. Soluzione IP55 – IP30 con la stessa struttura. FINO A 630 A, UE 415 V, ICW 35 KA/1S. Soddisfare la maggior parte delle richieste in distribuzione secondaria. SUPPORTI SBARRE PREASSEMBLATI FINO A 630A. Facili e veloci da montare. KIT EQUIPAGGIAMENTO PROVVISTI DI PANNELLI FRONTALI. Meno referenze per le configurazioni. KIT ISOLATI Tutti i kit possono essere isolati montando un singolo accessorio. 36 KIT DISPONIBILI FINO A 630 A. POSSIBILITÀ DI INSTALLARE PIASTRA INTERNA DI FONDO E CONTROPORTA PER APPLICAZIONI DI AUTOMAZIONE. Soluzioni per ogni possibile richiesta. Entrambe le soluzioni applicative in particolare per configurazioni miste. CONFIGURAZIONI VERIFICATE SECONDO CEI EN 61439-2. Fornire un prodotto testato e verificato secondo la normativa vigente.

Struttura per la protezione ai contatti diretti mediante quadri di distribuzione secondari e terminali realizzati secondo la norma CEI EN 61439-2 e CEI EN 62280. Quadro.5 a questo scopo propone un prodotto metallico monoblocco per applicazione indoor, realizzato in 25 diverse dimensioni, che può essere equipaggiato per avere diverse tipologie di gradi di protezione IP55 - IP30, mentre il grado di protezione contro gli impatti meccanici è IK10 con porte piene e in vetro. È possibile affiancare in orizzontale e in verticale le strutture per installazioni in locali tecnici particolari. Colorazione standard RAL9010.

La distribuzione interna primaria avviene mediante sbarre preassemblate che supportano fino a 630A. I kit di distribuzione sono utilizzati per funzionamento diretto/indiretto e tramite un accessorio per il sezionamento. Sono disponibili 36 kit di equipaggiamento fino a 630A, per svariate configurazioni, e compatibili con le dimensioni standard di quadro.5. I pannelli frontali in metallo sono inclusi nei kit di equipaggiamento. Il quadro raggiunge 630A (InA) a 35 kA/1s (Icw), con 415V (Ue). Temperatura di esercizio da -5°C a +40°C. Molteplici configurazioni progettuali verificate, in conformità alla norma CEI EN 61439-2 e CEI EN 62280, previste dalla dichiarazione CE.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
ADC916H	DIFF MAGN 1PN 30MA AC 16A 6KA C 2M	1	HAGER
ADC920H	DIFF MAGN 1PN 30MA AC 20A 6KA C 2M	1	HAGER
ADP466H	MTD 4P 16A AC 30MA	1	HAGER
BF226N	B. DIFF. 2P 300MA <25A AC 2M	2	HAGER
BF426N	B. DIFF. 4P 300MA <25A AC 2M	4	HAGER
BG464N	B. DIFF. 4P 500MA <63A AC 3M	1	HAGER
CDC724H	INT. DIFF. 2P 30 MA 25A 2M	1	HAGER
CDC740H	INT. DIFF. 2P 30 MA 40A 2M	1	HAGER
CDC742H	INT. DIFF. 4P 30 MA 40A 4M	1	HAGER
CFC225H	INT. DIFF. ACC. 2P 300 MA 25A 2M	4	HAGER
CFC440H	INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A 4M	1	HAGER
FM209	STRUTT QUADRO 5 H2010 L685 P260 (EX 18209)	1	HAGER
FM409	DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P260 (EX 18409)	1	HAGER
FM549	PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L685 (EX 18549)	1	HAGER
JP024	COPRIFORO A BANDA 24M	1	HAGER
KJ01CN	RIPARTITORE 4X125A	1	HAGER
LS504	PORTAFUSIBILE 10.3X38 3P + N 4M	3	HAGER
MCA410	INTERR. AUTOM.4P 10A 6 KA C 4M	4	HAGER
MCA416	INTERR. AUTOM.4P 16A 6 KA C 4M	3	HAGER
MCA420	INTERR. AUTOM.4P 20A 6 KA C 4M	1	HAGER
MCA425	INTERR. AUTOM.4P 25A 6 KA C 4M	1	HAGER
MCA463	INTERR. AUTOM.4P 63A 6 KA C 4M	1	HAGER
MCA510	INTERR. AUTOM 1P+N 10A 6 KA C 2M	2	HAGER
MJN510A	INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA C 1M	20	HAGER
MYN520	INTERR. AUTOM.1P+N 20A 4.5KA C 2M	2	HAGER
SBN480	SEZ 4P 80A	1	HAGER
SM101E	MULTIMETRO DIGITALE	1	HAGER
SPB440D	SPD 4P	1	HAGER
SRA01505	TA 150/5A	3	HAGER
SVN127	3 SEGNALATORI LUMINOSI ROSSI 1M	1	HAGER
UC205	KIT X APP MODULARI 24M H200 L600 (EX 18905)	8	HAGER
UC233	PANNELLO CIECO H200 L600 (EX 18933)	1	HAGER

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**156**
Date of document: *Data del documento:*	**13/04/2026**

Customer/*Cliente*:	**Alfieri S.p.A.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**QEG / Siemens S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**13/04/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**043 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**156/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**QEG**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS / *CARATTERISTICHE NOMINALI*

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**U*imp***	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	80	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	6	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	9	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS / *DOCUMENTI*

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	156/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	156/26 QEG
Schematic dwg. *Schema funzionale*	156/26 QEG
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	156/26 QEG

ROUTINE TESTS / *PROVE INDIVIDUALI*	STANDARD / *NORME*	TEST RESULTS / *ESITO*	MEASUREMENT INSTRUMENTS / *STRUMENTI DI MISURA*
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function** *Prove di funzionamento elettrico*	CEI EN 61439-2 par. 11.10	Satisfactory *Conforme*	

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE:

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI Via G. Palatiello, 19 - 80021 NAPOLI www.comeccab.it - P.Iva e C.F. 08142211213

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

QUADRO ELETTRICO

DATI DI TARGA DEL QUADRO

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	80
TENSIONE NOMINALE V(V)	400
FREQUENZA F(Hz)	50
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	6
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2 / EN60898
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	55
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	700x2010x260
MATRICOLA	156/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113/2	


COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 26/03/26
Disegn. F.C.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RISTORANTE BELLAVISTA(BN)
Note :


Descrizione:
Q.E.GENERALE
DATI DI
TARGA

Matricola 156/26
Cliente RISTORANTE BELLAVISTA-VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Nome File : QEG.DWG
Percorso File : QEG.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

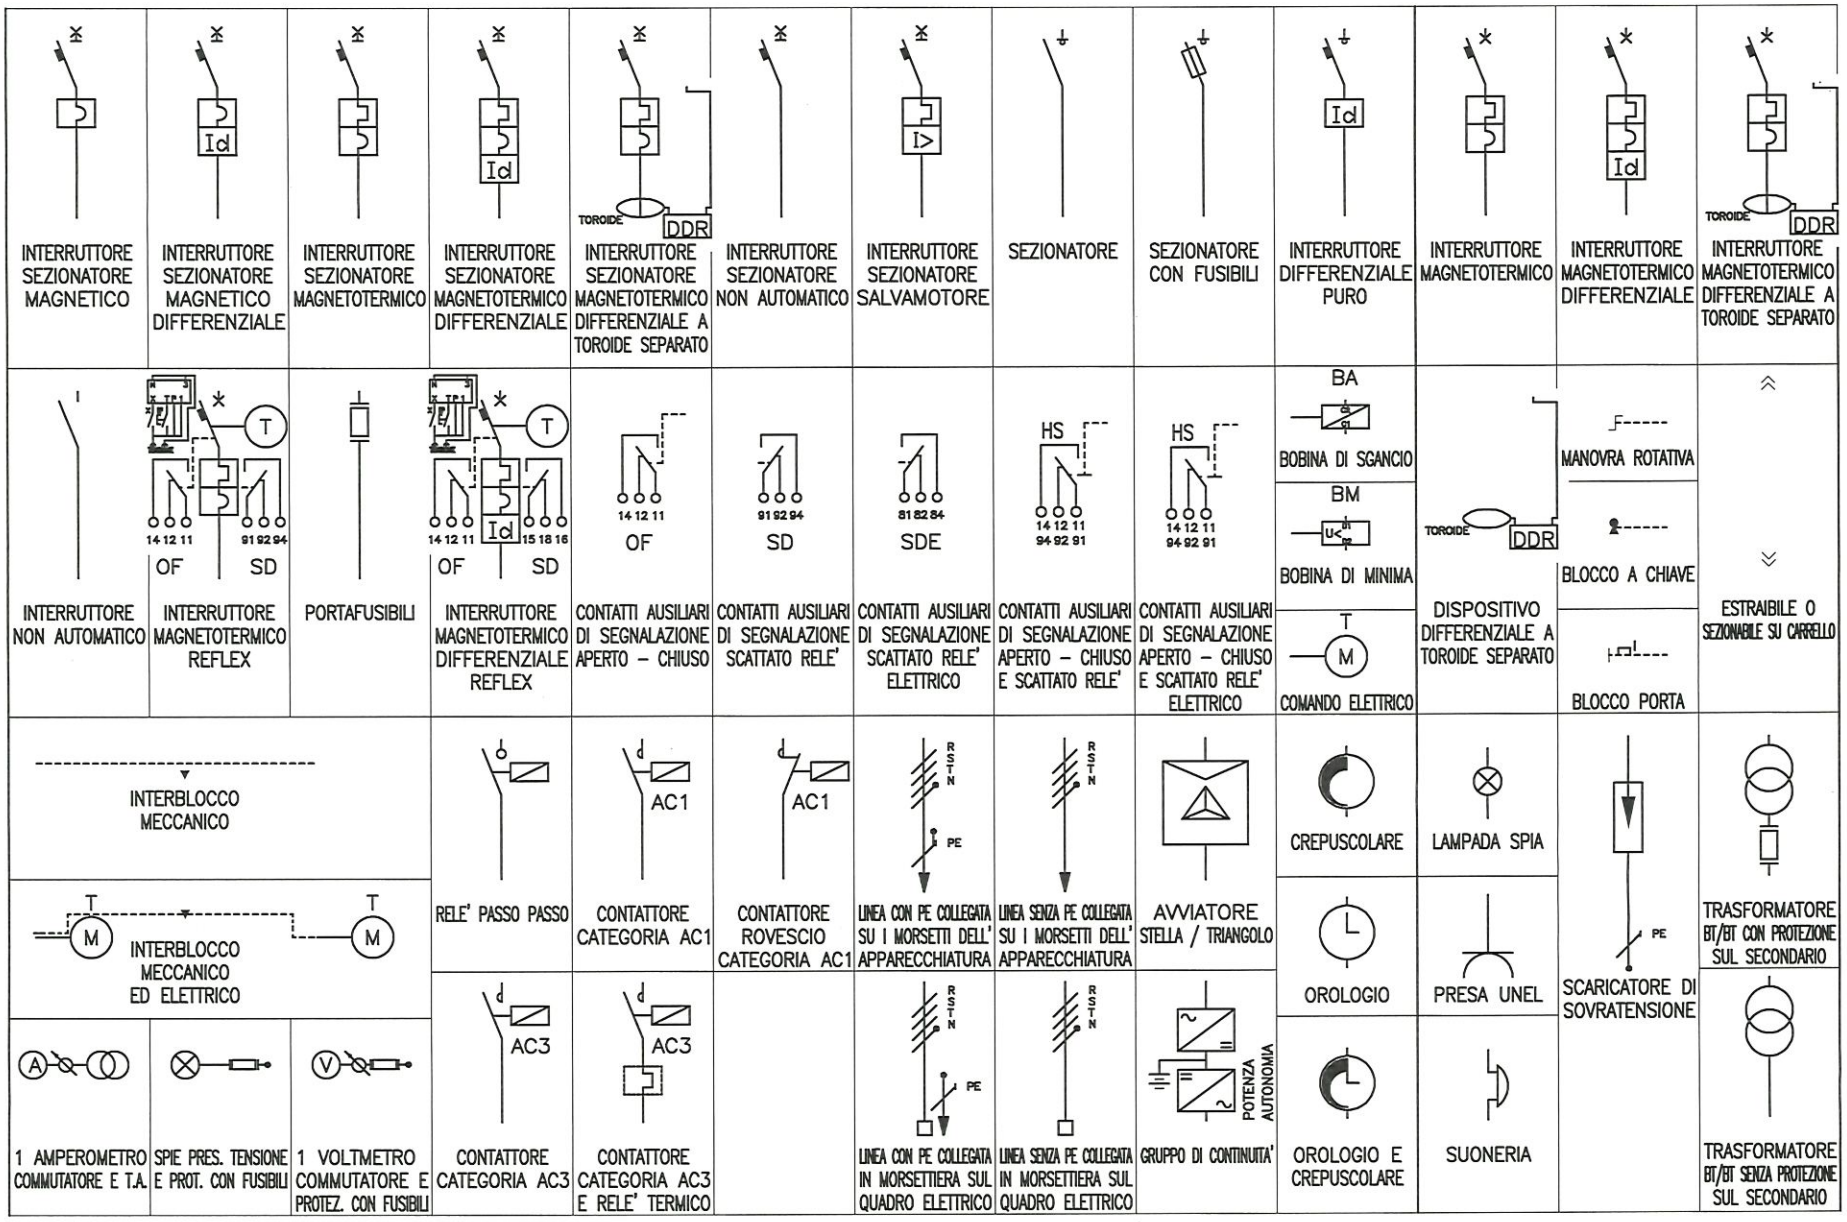

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	26/03/26
Disegn.	F.C.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	RISTORANTE BELLAVISTA(BN)
Note :	
Descrizione:	Q.E.GENERALE LEGENDA QUADRO
Matricola	156/26
Cliente	RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Nome File :	QEG.DWG
Percorso File :	QEG.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

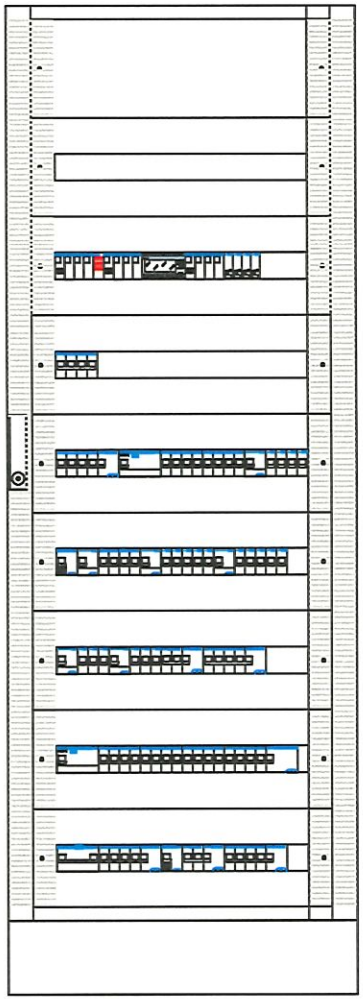

STRUTTURA QUADRO	HAGER
MODELLO	QUADRO 5
GRADO IP	55
DIMENSIONE (BxHxP)	700x2010x260mm

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 26/03/26
Disegn. F.C.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RISTORANTE BELLAVISTA(BN)

Note :

Descrizione:
Q.E.GENERALE
FRONTE
QUADRO

Matricola 156/26

Cliente RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

Nome File : QEG.DWG


Percorso File : QEG.DWG

Nr. Foglio 1

Nr. Fogli 1

Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		FP	FM	FS	Q1	Q2		Q3	Q4
NOME PROGETTO RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

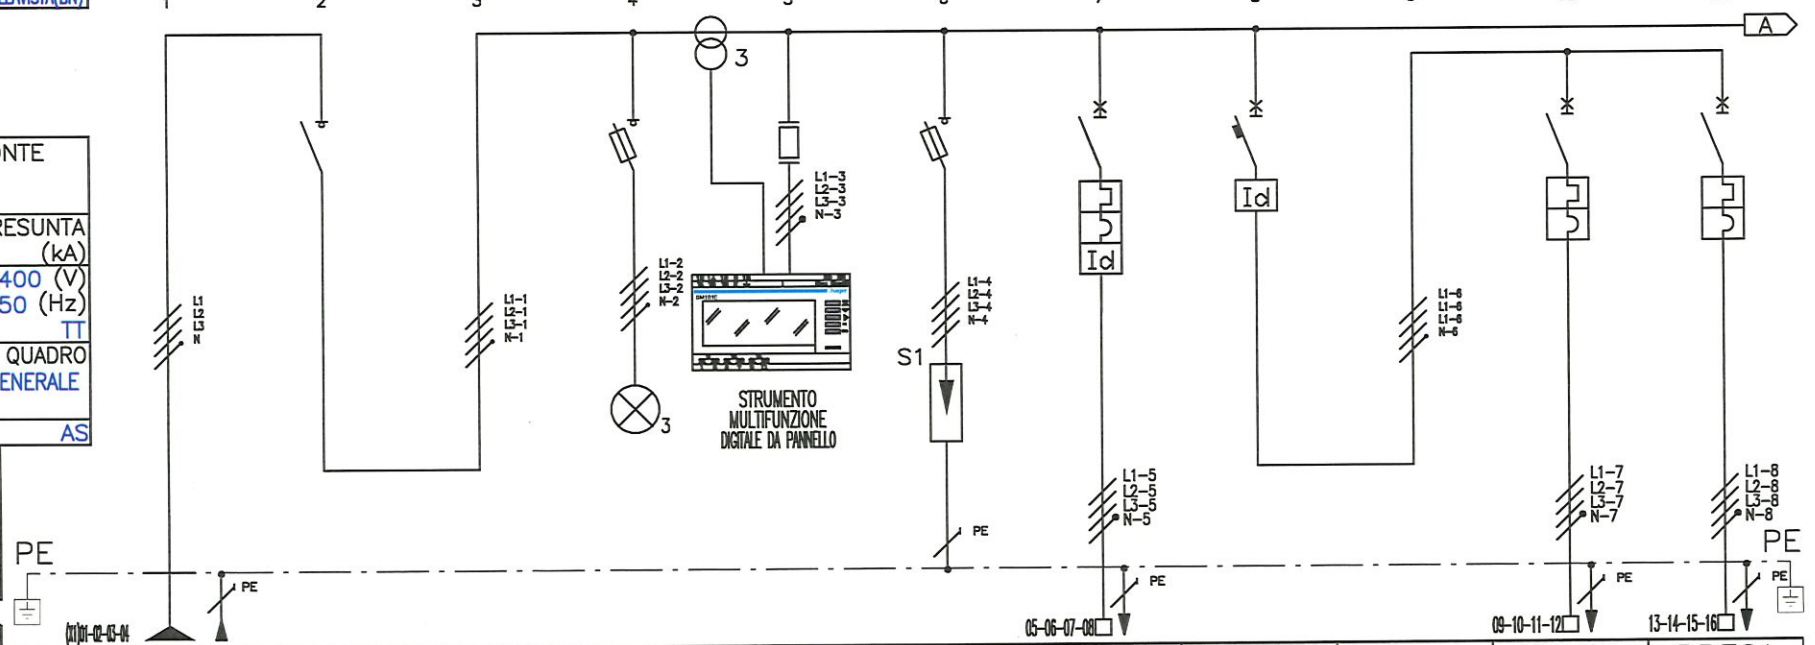

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55 HAGER	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 80 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO	INTERRUTTORE GENERALE		PROTEZIONE PRESENZA RETE	PROTEZIONE MULTIMETRO	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	CELLA FRIGO	GENERALE PRESE CUCINA		PRESA CUCINA DX	PRESA CUCINA SX
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO												
INTERRUTTORE	TIPO		SBN		LSN		LSN	MCA+BF	CDC		MCA	MCA
	P.D.I. (kA)							6			6	6
	N. POLI x In (A)		4x80					4x25	4x40		4x16	4x16
	CURVA / SGANCIAT.							C			C	C
	SOGLIA Irth (A)							25	40		16	16
	SOGLIA Irm (A)							10Irth	10Irth		10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)							0,3	0,03			
	RITARDO (ms)							ISTANTANEO	ISTANTANEO			
	CLASSE							AC	AC			
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				3x1+N	3x1 + N	4x50					
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					SM101E	SPD T2 4P 20kA					
CONDUTTORE	TIPO					FS17						
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)					4x2,5						
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400						400			400	400
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE						T.A. – 150/5A						

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - email:info@comecsrl.it


CLIENTE : *RISTORANTE BELLAVISTA*
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : *ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)*

DATA 26/03/26 | PAG. 1 DI 7 | Ed. 0
Disegnatore : F.C. | File: QEG.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q5		Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11		Q12	Q13
NOME PROGETTO RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

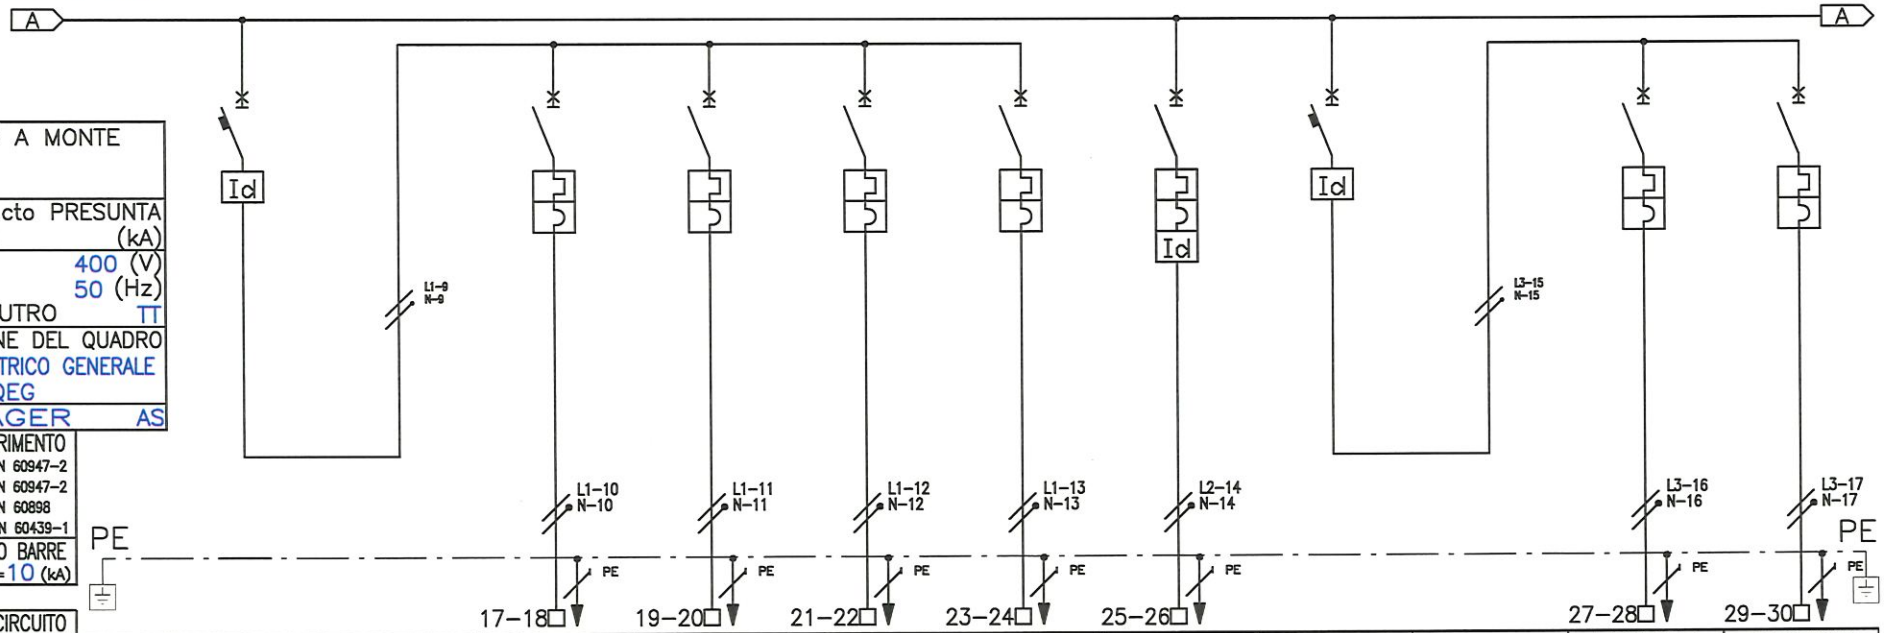

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55	HAGER AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 80 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI CUCINA		ACCENSIONE 1	ACCENSIONE 2	ACCENSIONE 3	ACCENSIONE 4	WC	GENERALE PRESE SALA		PRESE SALA DX	PRESE SALA SX
INTERRUTTORE	TIPO	CDC		MJN	MJN	MJN	MJN	ADC	CDC		MYN	MYN
	P.D.I. (kA)			4,5	4,5	4,5	4,5	6			4,5	4,5
	N. POLI x In (A)	2x25		1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x20+N	2x40		1x20+N	1x20+N
	CURVA / SGANCIAT.			C	C	C	C	C			C	C
	SOGLIA Irth (A)	25		10	10	10	10	20	40		20	20
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth		10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03						0,03	0,03			
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO						ISTANTANEO	ISTANTANEO			
	CLASSE	AC						AC	AC			
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)			230	230	230	230	230			230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081/5711774 - www.comecsrl.it - email@comecsrl.it


CLIENTE : *RISTORANTE BELLAVISTA*
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : *ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)*

DATA 26/03/26	PAG. 2 DI 7	Ed. 0
Disegnatore : F.C.	File: QEG.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q14		Q15	Q16	Q17	Q18	Q19				
NOME PROGETTO RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

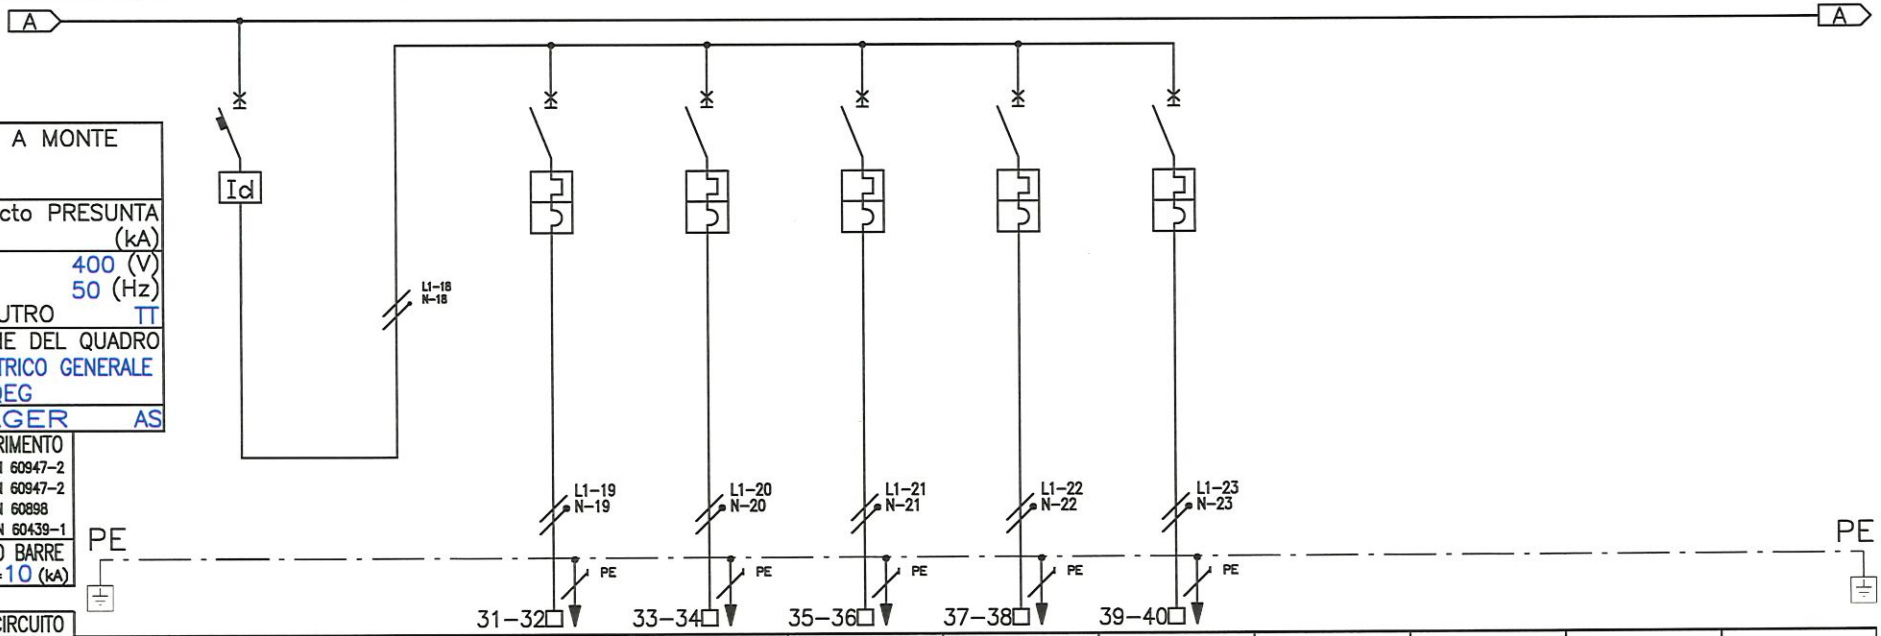

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO: QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55 HAGER AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 80 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI 1 SALA		ACCENSIONE 1	ACCENSIONE 2	ACCENSIONE 3	ACCENSIONE 4	ACCENSIONE 5				
INTERRUTTORE	TIPO	CFC		MJN	MJN	MJN	MJN	MJN				
	P.D.I. (kA)			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
	N. POLI x In (A)	2x25		1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N				
	CURVA / SGANCIAT.			C	C	C	C	C				
	SOGLIA Irth (A)	25		10	10	10	10	10				
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth				
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3										
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO										
	CLASSE	AC										
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)			230	230	230	230	230				
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081/5511774 - www.comecsrl.it - email@comecsrl.it


CLIENTE : *RISTORANTE BELLAVISTA*
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : *ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)*

DATA 26/03/26	PAG. 3 DI 7	Ed. 0
Disegnatore : F.C.	File: QEG.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q20		Q21	Q22	Q23	Q24	Q25				
NOME PROGETTO RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

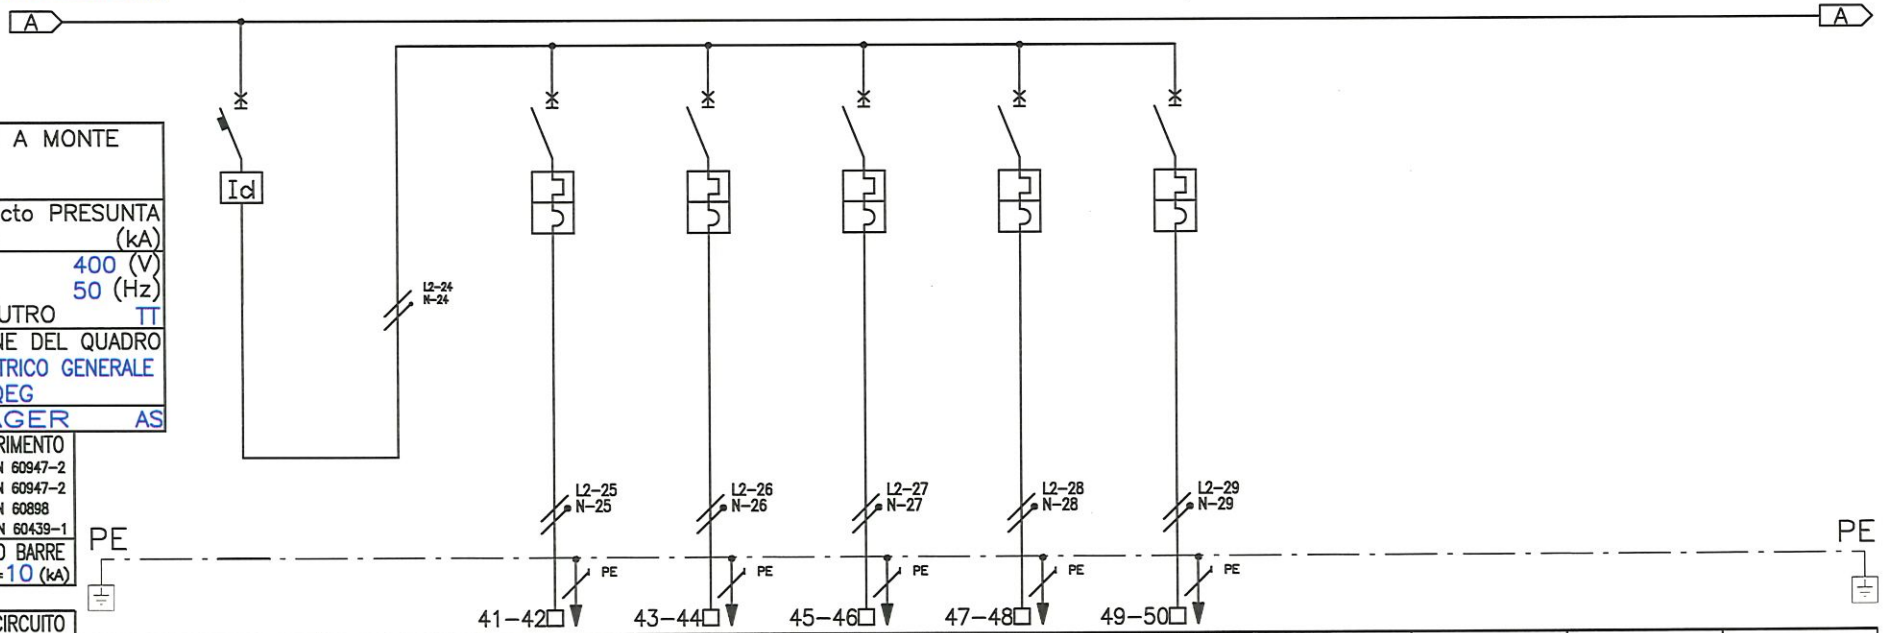

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55 HAGER AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 80 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI 2 SALA		ACCENSIONE 6	ACCENSIONE 7	ACCENSIONE 8	ACCENSIONE 9	ACCENSIONE 10				
INTERRUTTORE	TIPO	CFC		MJN	MJN	MJN	MJN	MJN				
	P.D.I. (kA)			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
	N. POLI x In (A)	2x25		1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N				
	CURVA / SGANCIAT.			C	C	C	C	C				
	SOGLIA Irth (A)	25		10	10	10	10	10				
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth				
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3										
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO										
	CLASSE	AC										
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)			230	230	230	230	230				
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5711774 - www.comecsrl.it - email@comecsrl.it


CLIENTE : RISTORANTE BELLAVISTA
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)

DATA 26/03/26 | PAG. 4 DI 7 | Ed. 0
Disegnatore : F.C. | File: QEG.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q26		Q27	Q28	Q29	Q30		Q31	Q32	Q33	Q34
NOME PROGETTO RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

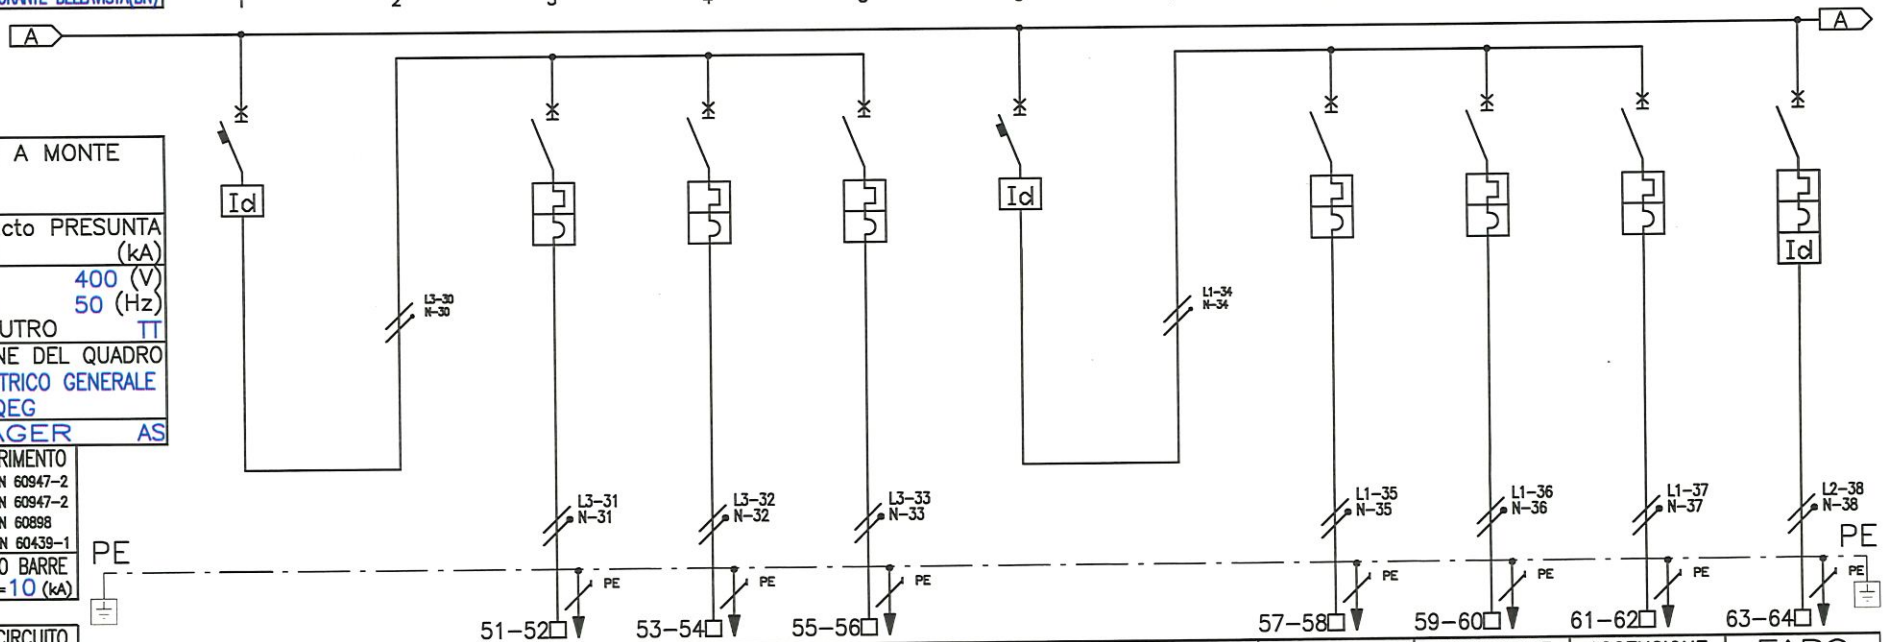

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55 HAGER AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 80 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI 3 SALA		ACCENSIONE 11	ACCENSIONE 12	ACCENSIONE 13	LUCI 4 SALA		ACCENSIONE 14	ACCENSIONE 15	ACCENSIONE 16	FARO ESTERNO
INTERRUTTORE	TIPO	CFC		MJN	MJN	MJN	CFC		MJN	MJN	MJN	MCA+BF
	P.D.I. (kA)			4,5	4,5	4,5			4,5	4,5	4,5	6
	N. POLI x In (A)	2x25		1x10+N	1x10+N	1x10+N	2x25		1x10+N	1x10+N	1x10+N	2x10
	CURVA / SGANCIAT.			C	C	C			C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	25		10	10	10	25		10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)	10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3					0,3					0,3
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO					ISTANTANEO					ISTANTANEO
	CLASSE	AC					AC					AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)			230	230	230			230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Palatio n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - emilio@comecsrl.it

CLIENTE : *RISTORANTE BELLAVISTA*
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : *ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)*

DATA 26/03/26 | PAG. 5 DI 7 | Ed. 0
Disegnatore : F.C. | File: QEG.DWG

TAVOLA

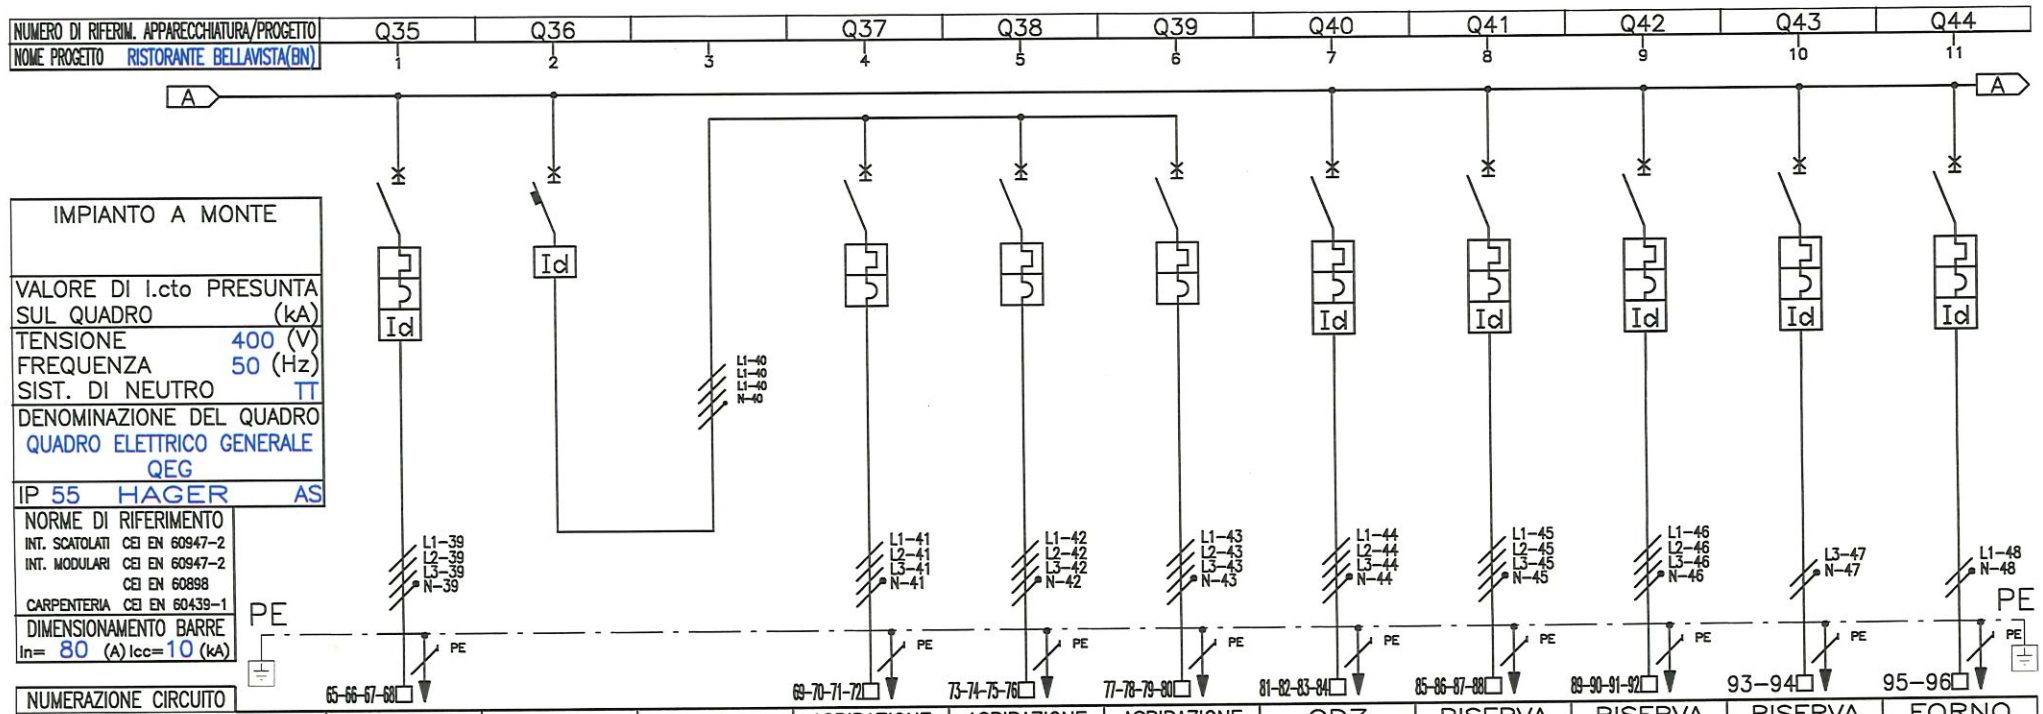

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55 HAGER	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 80 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		65-66-67-68	69-70-71-72	73-74-75-76	77-78-79-80	81-82-83-84	85-86-87-88	89-90-91-92	93-94	95-96
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LAVAGGIO	GENERALE ASPIRAZIONE	ASPIRAZIONE CUCINA	ASPIRAZIONE SALA	ASPIRAZIONE FORNI	CDZ	RISERVA	RISERVA	RISERVA	FORNO 1
INTERRUTTORE	TIPO	MCA+BF	CFC	MCA	MCA	MCA	MCA+BG	ADP	MCA+BF	ADC	MCA+BF
	P.D.I. (kA)	6		6	6	6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)	4x20	4x40	4x10	4x10	4x10	4x63	4x16	4x16	1x16+N	2x10
	CURVA / SGANCIAT.	C		C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	20	40	10	10	10	63	16	16	16	10
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3	0,3				0,5	0,03	0,3	0,03	0,3
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO				ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	AC	AC				AC	AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)										
	N. POLI x In (A)										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)										
FUSIBILE	N. POLI x In (A)										
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO										
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)										
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA										
	Ib (A) Iz (A)										
	Un (V) Pn (kW)	400		400	400	400	400	400	400	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%										
AUSILIARI ELETTRICI											
NOTE											

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - ewald@comecsrl.it


CLIENTE : RISTORANTE BELLAVISTA
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)

DATA 26/03/26 | PAG. 6 DI 7 | Ed. 0
Disegnatore : F.C. | File: QEG.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q45										
NOME PROGETTO RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

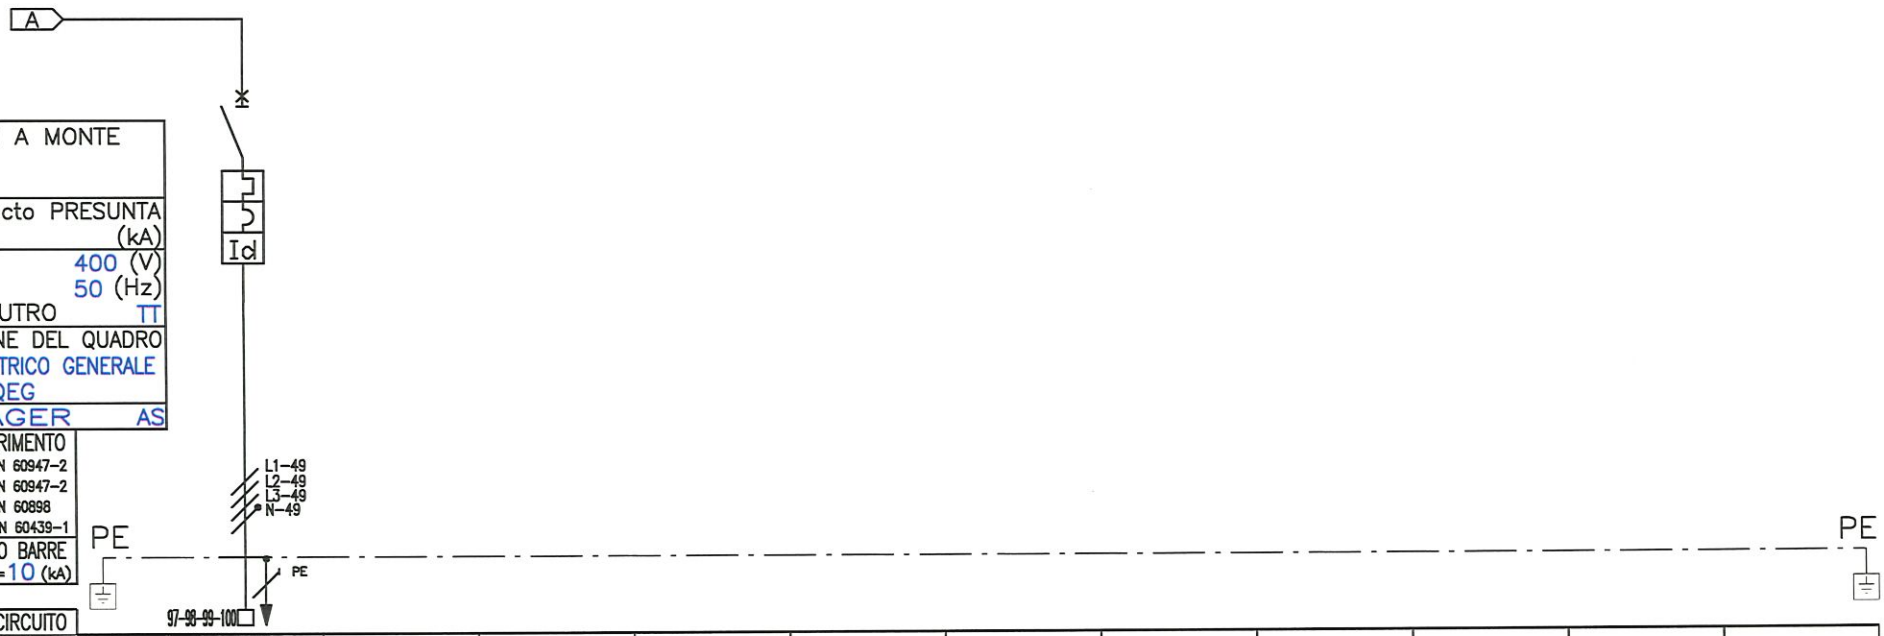

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
IP 55 HAGER AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 80 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		FORNO 2										
INTERRUTTORE	TIPO	MCA+BF										
	P.D.I. (kA)	6										
	N. POLI x In (A)	4x10										
	CURVA / SGANCIAT.	C										
	SOGLIA Irth (A)	10										
	SOGLIA Irm (A)	10Irth										
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3										
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO										
	CLASSE	AC										
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	400										
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.5511774 - www.comecsrl.it - email@comecsrl.it

CLIENTE : *RISTORANTE BELLAVISTA*
VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

IMPIANTO : *ELETTRICO RISTORANTE BELLAVISTA,MONTESARCHIO(BN)*

DATA 26/03/26	PAG. 7 DI 7	Ed. 0
Disegnatore : F.C.	File: QEG.DWG	



TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	BBNBMISSORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 26/03/26
Disegn. F.C.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
RISTORANTE BELLAVISTA(BN)
Note :

Descrizione:
Q.E.GENERALE
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 156/26
Cliente RISTORANTE BELLAVISTA-VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Nome File : QEG.DWG
Percorso File : QEG.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 2
Rev. 0

HAGER

SM101-E

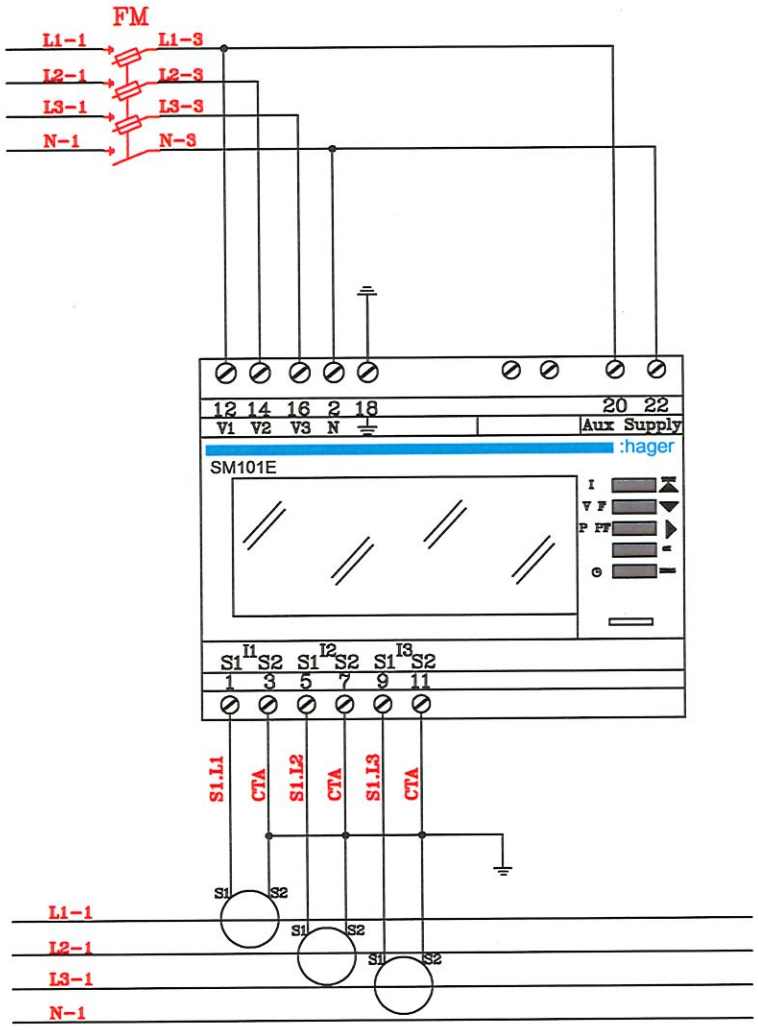

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 26/03/26 Disegn. F.C. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RISTORANTE BELLAVISTA(BN) Note :	Descrizione: Q.E.GENERALE SCHEMA AUSILIARE	Matricola 156/26 Cliente RISTORANTE BELLAVISTA-VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN) Nome File : QEG.DWG Percorso File : QEG.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 2	Rev. 0

LEGENDA MORSETTIERA

X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 26/03/26
Disegn. F.C.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RISTORANTE BELLAVISTA(BN)
Note :

Descrizione:
Q.E.GENERALE
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 156/26
Cliente RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Nome File : QEG.DWG
Percorso File : QEG.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 5
Rev. 0

MORSETTIERA X1

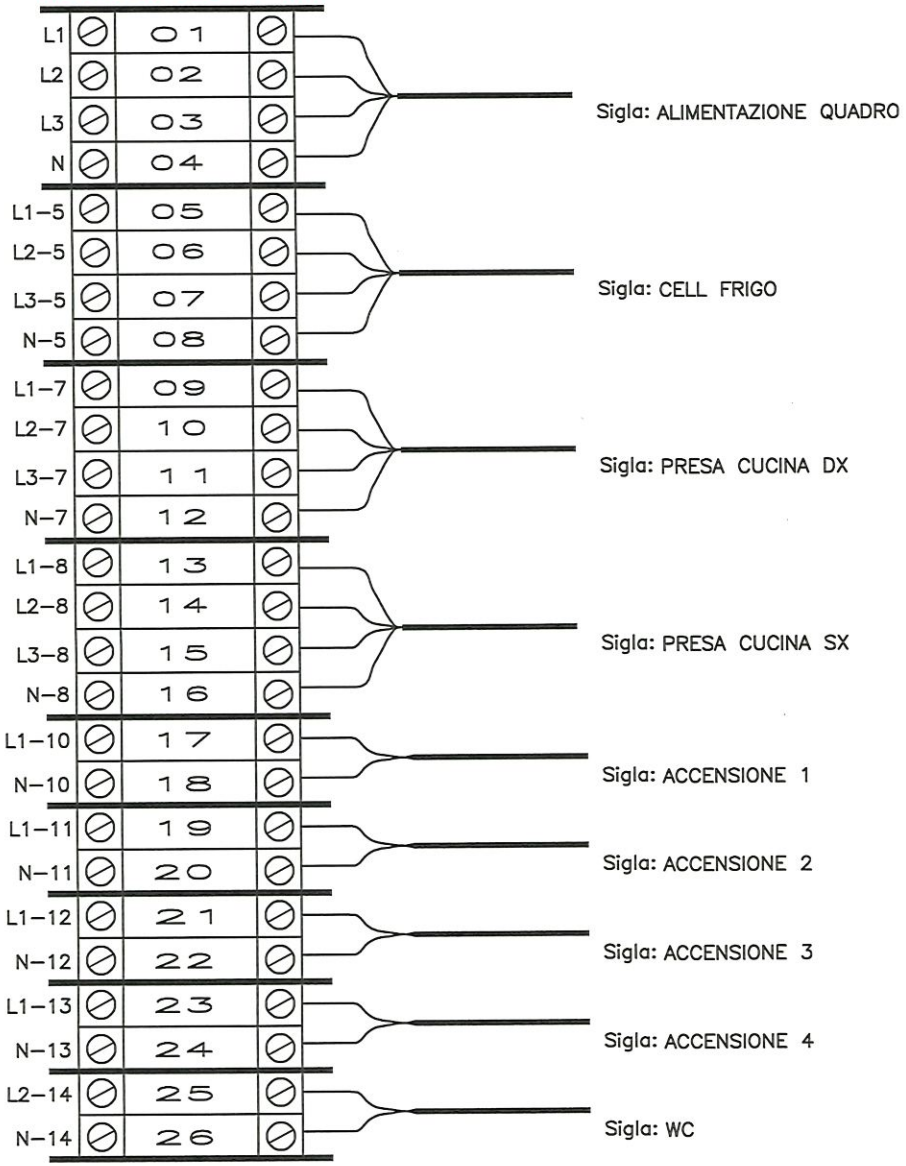

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO

Sigla: CELL FRIGO

Sigla: PRESA CUCINA DX

Sigla: PRESA CUCINA SX

Sigla: ACCENSIONE 1

Sigla: ACCENSIONE 2

Sigla: ACCENSIONE 3

Sigla: ACCENSIONE 4


Sigla: WC

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	26/03/26
Disegn.	F.C.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	RISTORANTE BELLAVISTA(BN)
Note :	
Descrizione:	Q.E.GENERALE SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	156/26
Cliente	RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Nome File :	QEG.DWG
Percorso File :	QEG.DWG
Nr. Foglio	2
Nr. Fogli	5
Rev.	0

MORSETTIERA X1

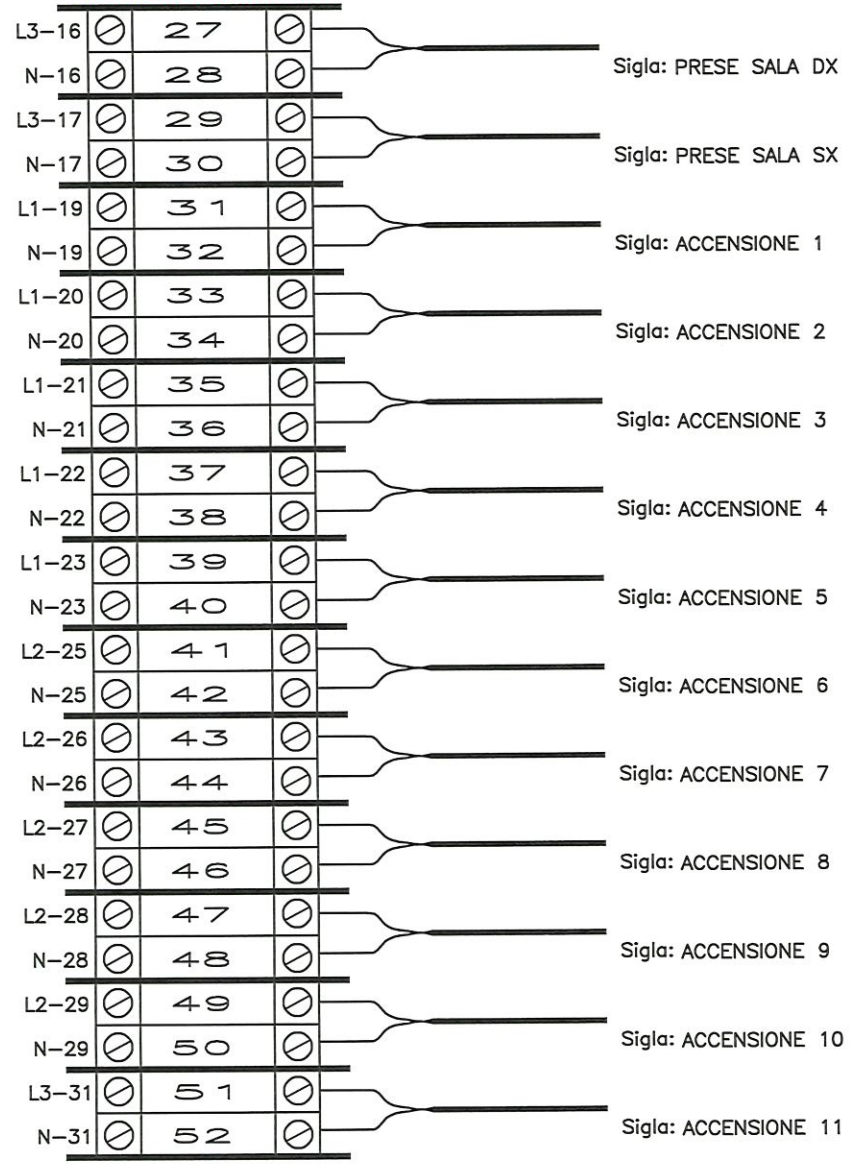


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 26/03/26	Progetto Esecutivo : RISTORANTE BELLAVISTA(BN)	Descrizione: Q.E.GENERALE SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 156/26
Disegn. F.C.			Cliente RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Proget.	Note :		Nome File : QEG.DWG — Percorso File : QEG.DWG — Nr. Foglio 3 — Nr. Fogli 5 — Rev. 0
visto			

MORSETTIERA X1

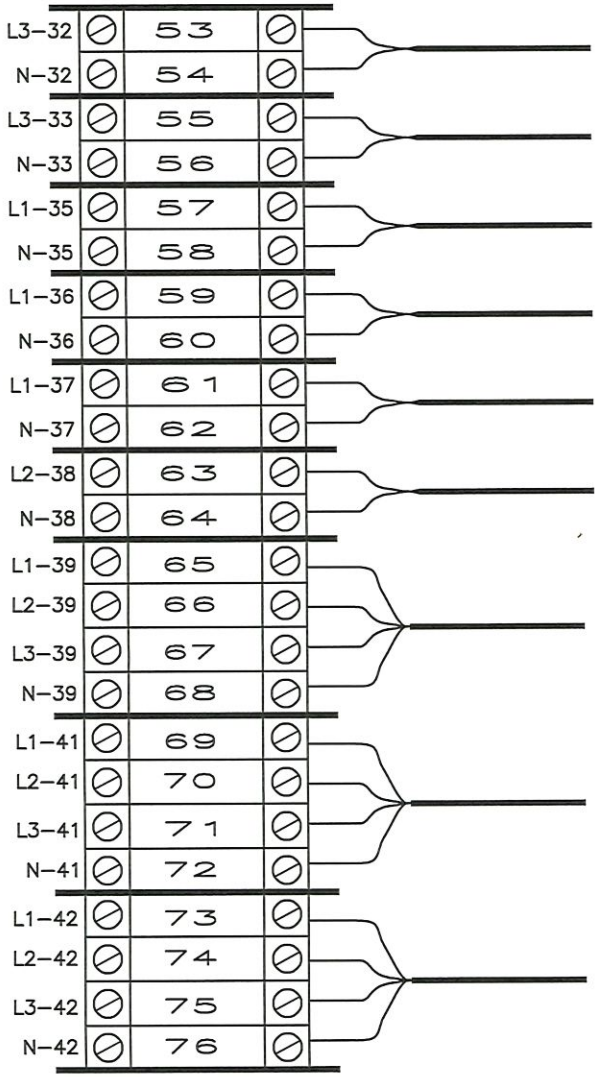

Sigla: ACCENSIONE 12

Sigla: ACCENSIONE 13

Sigla: ACCENSIONE 14

Sigla: ACCENSIONE 15

Sigla: ACCENSIONE 1

Sigla: FARO ESTERNO

Sigla: LAVAGGIO

Sigla: ASPIRAZIONE CUCINA

Sigla: ASPIRAZIONE SALA

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 26/03/26
Disegn. F.C.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : RISTORANTE BELLAVISTA(BN)
Note :

Descrizione: Q.E.GENERALE SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 156/26
Cliente RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)
Nome File : QEG.DWG
Percorso File : QEG.DWG
Nr. Foglio 4
Nr. Fogli 5
Rev. 0

MORSETTIERA X1

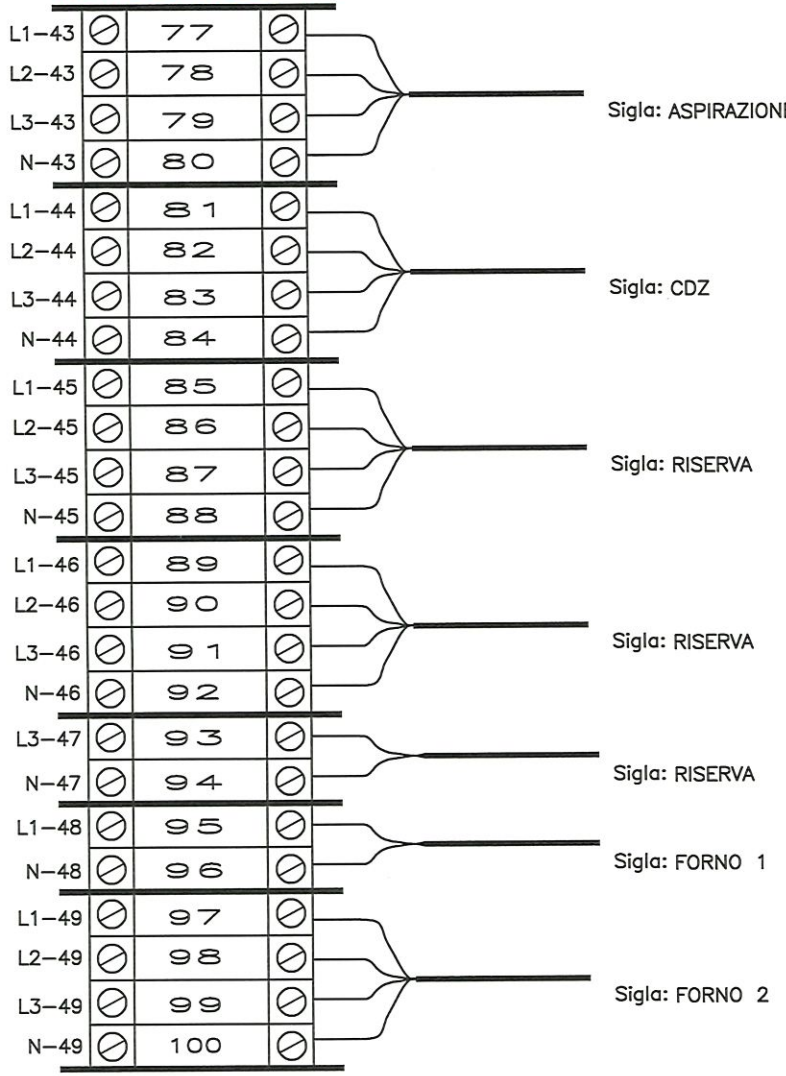

Sigla: ASPIRAZIONE FORNI

Sigla: CDZ

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: FORNO 1

Sigla: FORNO 2

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	26/03/26
Disegn.	F.C.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RISTORANTE BELLAVISTA(BN)

Note :

Descrizione: Q.E.GENERALE SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 156/26

Cliente RISTORANTE BELLAVISTA–VIA MONACA N.18,MONTESARCHIO(BN)

Nome File : QEG.DWG

Percorso File : QEG.DWG

Nr. Foglio 5

Nr. Fogli 5

Rev. 0
