COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

QUADRI DI BASSA TENSIONE

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

DENOMINAZIONE QUADRO	**CENTRALINO CAMERA – CC**

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**Elettrocampania S.p.A.** **S.S. 87 km 21,200, 81025 - Marcianise (CE)**

Descrizione Quadro:	**Centralino Camera**

Locazione del quadro:	**Radisson Hotels** **Riqualificazione dell'Ex Sede "Il Mattino" di Napoli – Via Chiatamone, 65 - Napoli**

Identificazione del quadro:	**346-379 / 26**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

Data 29 / 07 / 2026 **Firma**

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	240V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500V
Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	25 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	1,14KA
Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,70
Grado di protezione (IP)	40
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	Morsetto PE
Alimentazione	1F+N+PE
Partenze	12
Installazione	Parete a Incasso
Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	465x680x95 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	Serie 40CD Gewiss S.p.A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9016

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con centralino **Gewiss S.p.A.** serie **40 CDI** in plastica Halogen free Secondo Norma EN60754-2 da

54 moduli da incasso con portella cieca;

Verniciatura con Colore Bianco RAL9016.

Grado di protezione IP40

Grado di Protezione IK08

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
A9P52625	Int. magnetot. iC40a 1P+N C 25A 4500A	1	Schneider-electric S.p.A.
A9P52616	Int. magnetot. iC40a 1P+N C 16A 4500A	3	Schneider-electric S.p.A.
A9P52610	Int. magnetot. iC40a 1P+N C 10A 4500A	2	Schneider-electric S.p.A.
A9P52606	Int. magnetot. iC40a 1P+N C 6A 4500A	1	Schneider-electric S.p.A.
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	Schneider-electric S.p.A.
A9C20132	iCT 2NA 25A comando 24Vca	2	Schneider-electric S.p.A.
A9S60232	iSW 2P 32A	1	Schneider-electric S.p.A.
22.22.8.230.0000	Relè passo passo B.230Vac	2	Finder
13.62.8.230.0001	Relè passo passo comando centralizzato b.230Vac	3	Finder
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	2	Schneider-electric S.p.A.
GW40890	Centralino IP40 40CD	1	Gewiss

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

DATI DI TARGA DEL QUADRO

DENOMINAZIONE	CENTRALINO CAMERA
NATURA DELLA CORRENTE	1F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	25
TENSIONE NOMINALE V(V)	230
FREQUENZA F(Hz)	50
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	4.5
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2 / EN 60898
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	40
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	465x680x95
MATRICOLA	346 A 379/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113/2	


COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774


Data 03/07/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO
Note :

Descrizione: CENTRALINO CAMERA DATI DI TARGA

Matricola 346 A 379/26
Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI
Nome File : QCC.DWG
Percorso File : QCC.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

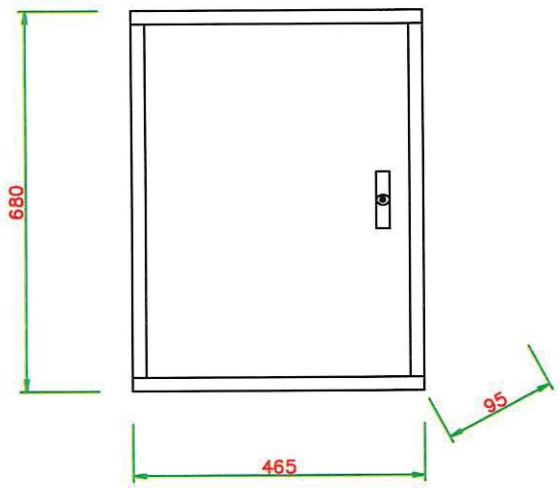

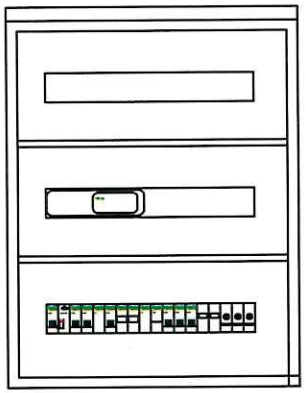

CARPENTERIA TIPO	GEWISS 40CDI
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
DIMENSIONE bxhxp(mm)	465x680x95mm

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 03/07/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO

Note :

Descrizione: CENTRALINO CAMERA FRONTE QUADRO

Matricola 346 A 379/26

Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI


Nome File : QCC.DWG

Percorso File : QCC.DWG

Nr. Foglio 1

Nr. Fogli 1


Rev. 0

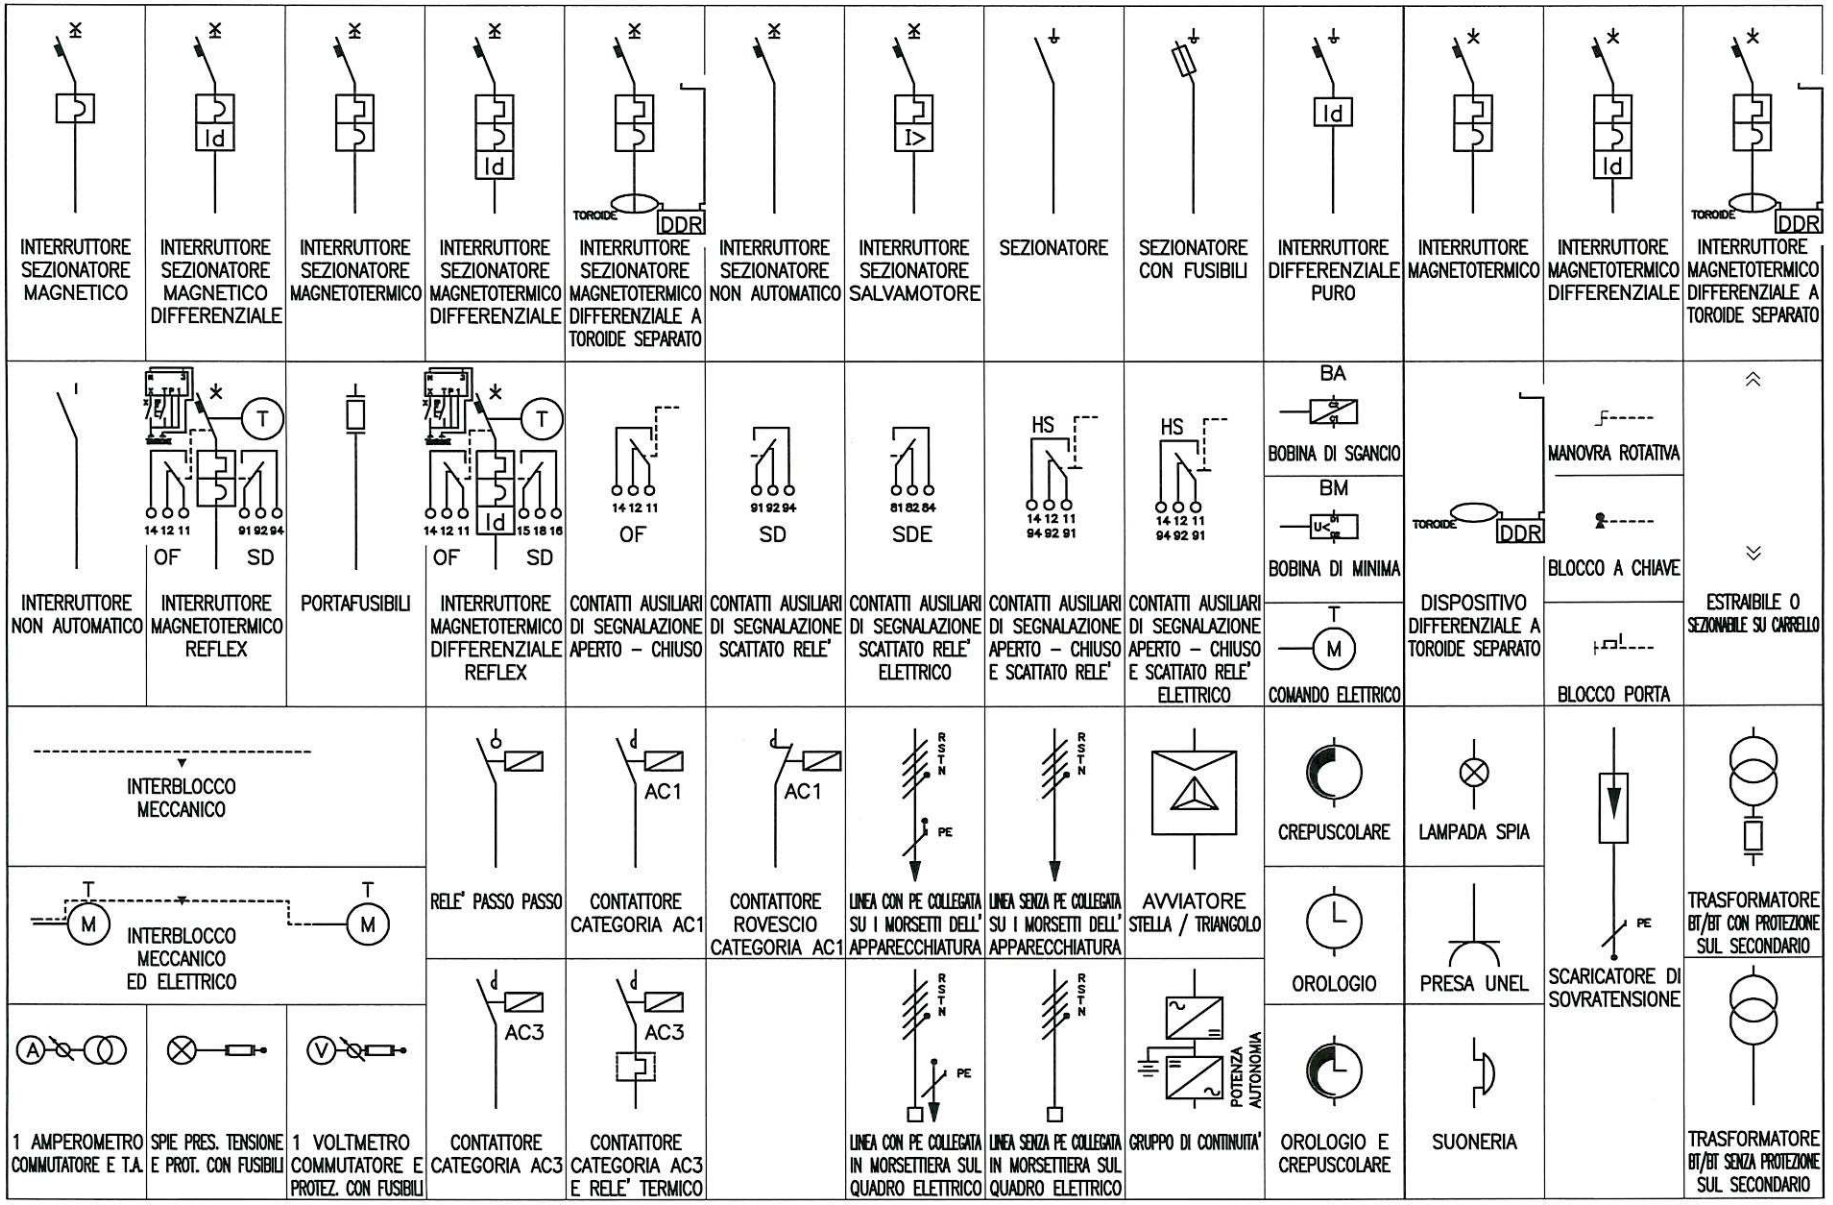

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	03/07/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	EX SEDE "IL MATTINO
Note :	
Descrizione:	CENTRALINO CAMERA LEGENDA QUADRO
Matricola	346 A 379/26
Cliente	RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI
Nome File :	QCC.DWG
Percorso File :	QCC.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		Q1	Q2		Q3	FA1	FA2		
NOME PROGETTO EX SEDE IL MATTINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

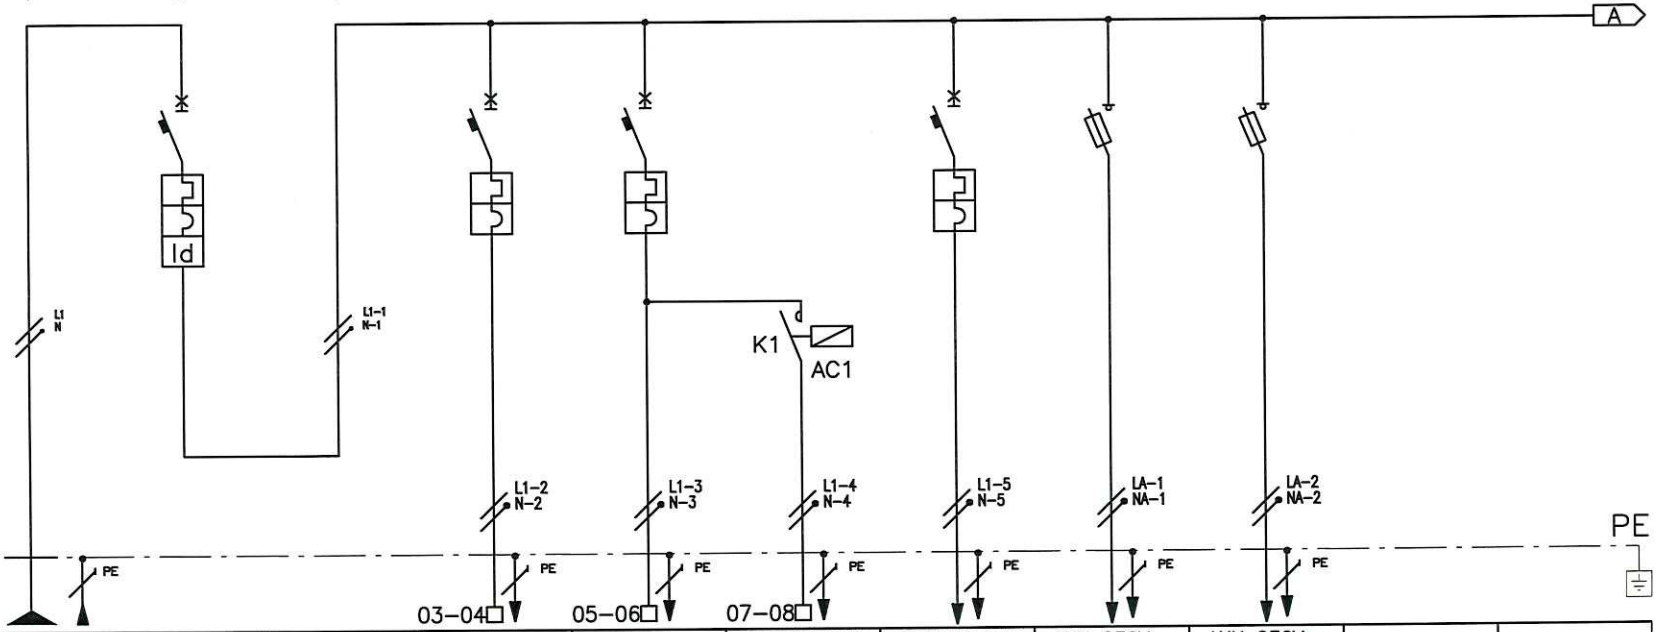

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 0.32 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
CENTRALINO CAMERA
TIPO S1 – QES1
IP 40 SCHNEIDER -ELECTRIC S.p.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 25 (A) Icc=10 (kA)


NUMERAZIONE CIRCUITO													
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO		INTERRUTTORE GENERALE		MACCHINA CAFFE' FRIGO BAR	FAN–COIL	CONTATTORE LUCE DI CORTESIA	CENTRALINA GESTIONE CAMERE	AUX 230Vac QUADRO	AUX 230Vac QUADRO		
INTERRUTTORE	TIPO			iC40a+Vigi		iC40a	iC40a		iC40a	STI	STI		
	P.D.I. (kA)			6		4.5	4.5		4.5				
	N. POLI x In (A)			1x25+N		1x16+N	1x10+N		1x6+N				
	CURVA / SGANCIAT.			C		C	C		C				
	SOGLIA Irth (A)			25		16	10		6				
	SOGLIA Irm (A)			10Irth		10Irth	10Irth		10Irth				
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)			0,03									
	RITARDO (ms)			ISTANTANEO									
	CLASSE			A									
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)							iCT 2NA 24V					
	N. POLI x In (A)							2x25					
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)												
FUSIBILE	N. POLI x In (A)									2x2	2x2		
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO												
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16				FG17	FG17	FG17					
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	2x6+PE				2x2,5+PE	2x1,5+PE	2x1,5+PE					
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	50				5	5	5					
	Ib (A) Iz (A)	18				4,8	0,5	0,1					
	Un (V) Pn (kW)	230	3.72			230 1	230 0,1	230 0,02					
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%												
AUSILIARI ELETTRICI								CONTATTO AUX NA					
NOTE													

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125–NAPOLI–Via G. Palatucci n. 19 – 081.2511774 – www.comecsrl.it – email:info@comecsrl.it

CLIENTE : *CHIATAMONE 65 S.r.l.*
VIA ORAZIO, 147/o – 80122 – NAPOLI
IMPIANTO : *RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI*

DATA 14/10/25 | PAG. 1 DI 3 | Ed. 0
Disegnatore : A. Z. | File: QCC.DWG
TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO		S1		Q4	Q5	Q6						
NOME PROGETTO EX SEDE IL MATTINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

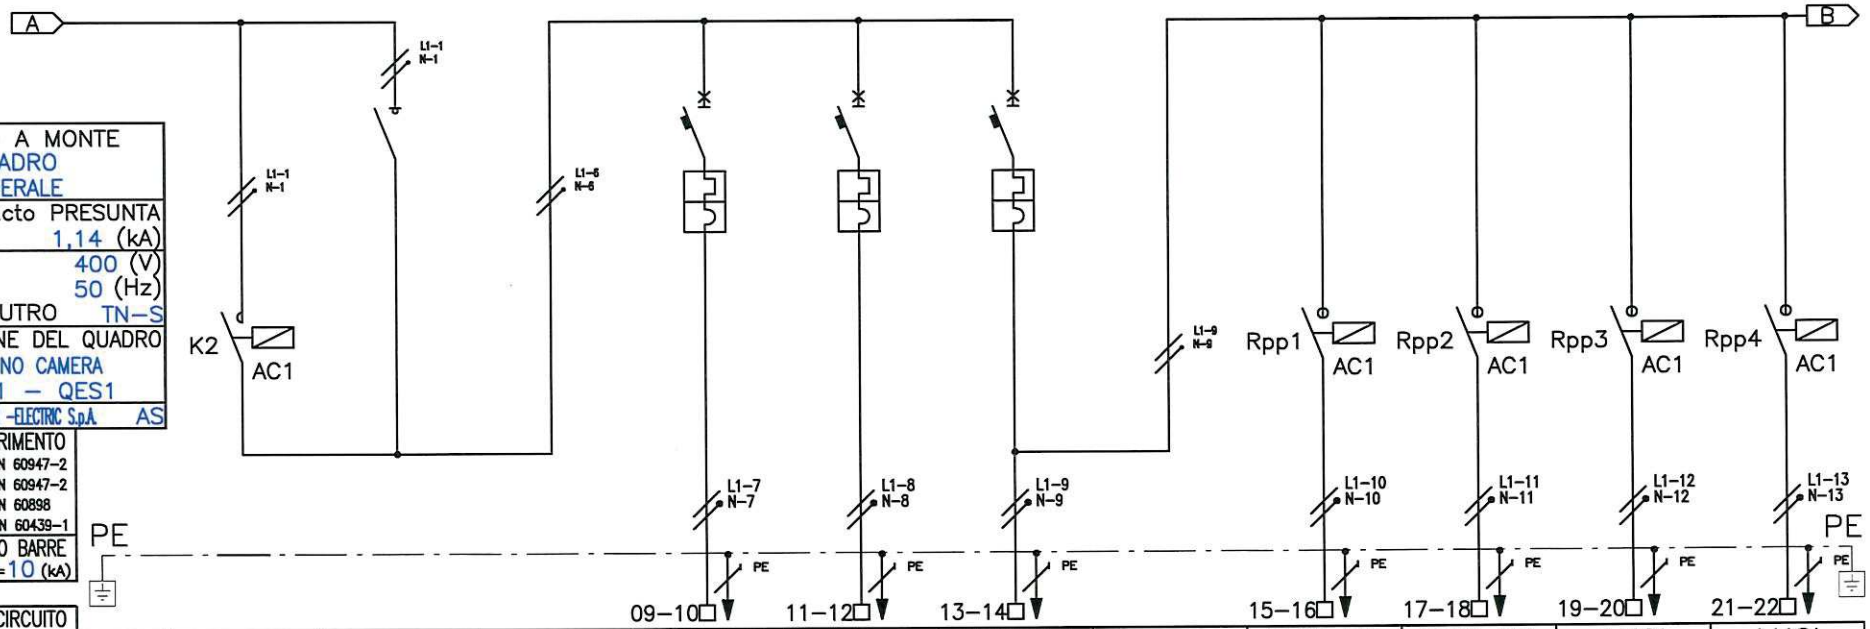


IMPIANTO A MONTE QUADRO GENERALE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 1,14 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO CENTRALINO CAMERA TIPO S1 – QES1
IP 30 SCHNEIDER -ELECTRIC S.p.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 25 (A) Icc=10 (kA)

| NUMERAZIONE CIRCUITO | | | | | |

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO											
NOME PROGETTO EX SEDE IL MATTINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

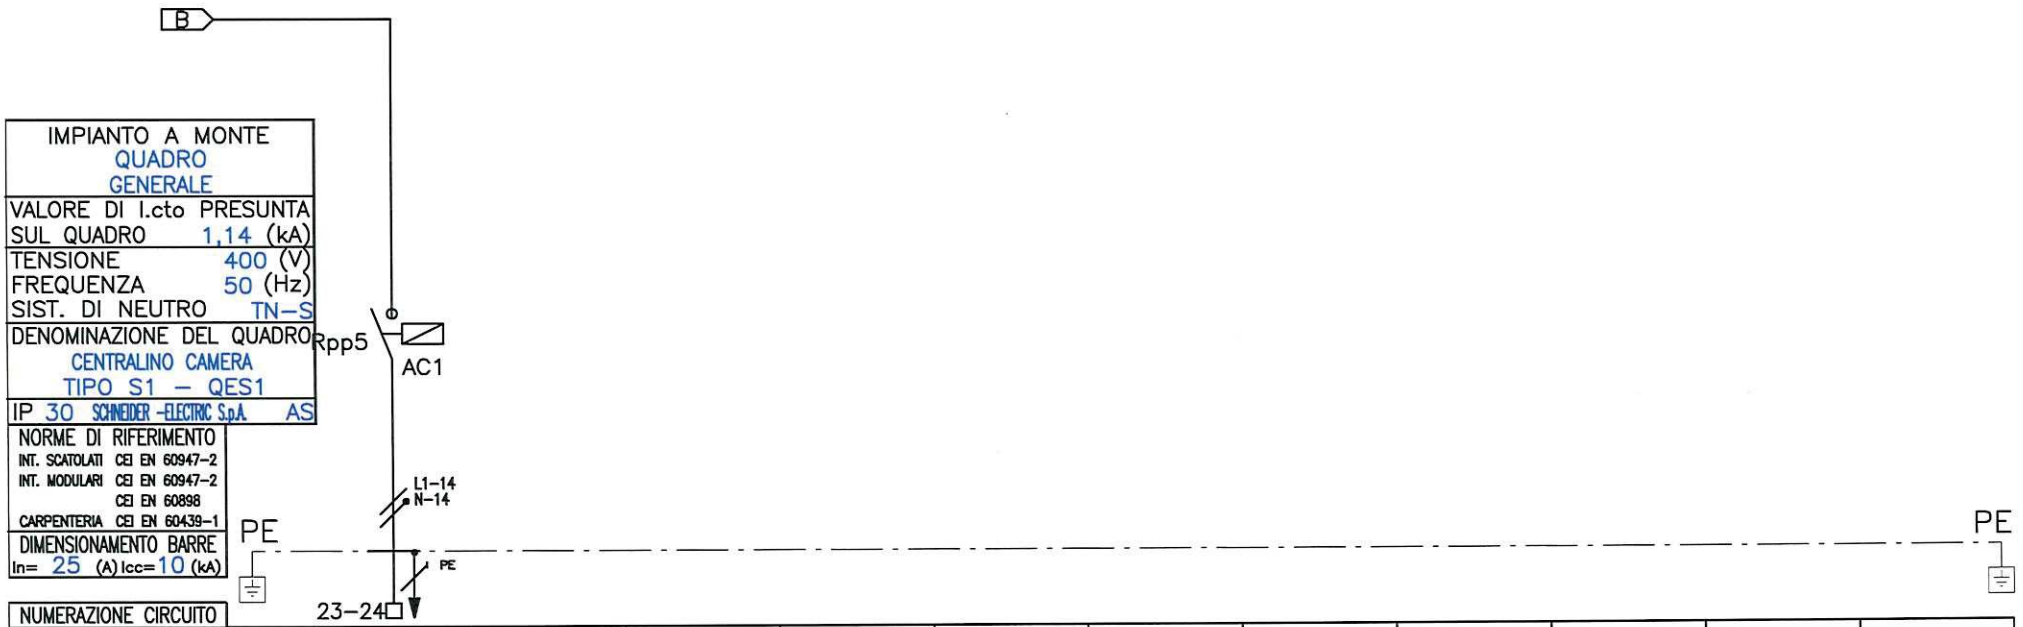

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 1,14 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO CENTRALINO CAMERA TIPO S1 – QES1
IP 30 SCHNEIDER -ELECTRIC S.p.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 25 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LUCI COMODINO DX E SCENARIO E LUCI COMODINO										
INTERRUTTORE	TIPO											
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)	13.62	230									
	N. POLI x In (A)	2x16										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG17										
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x1,5+PE										
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	5										
	Ib (A) Iz (A)	0,5										
	Un (V) Pn (kW)	230	0,1									
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Palatella n. 19 – 081.2511774 – www.comecnab.it – email: info@comecnab.it

CLIENTE : *CHIATAMONE 65 S.r.l.*
VIA ORAZIO, 147/o – 80122 – NAPOLI

IMPIANTO : *RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI*



DATA 01/10/22	PAG. 3 DI 3	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QCC.DWG	



TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	SEZIONATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 03/07/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
EX SEDE "IL MATTINO

Note :

Descrizione:
CENTRALINO CAMERA
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 346 A 379/26

Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI

Nome File : QCC.DWG


Percorso File : QCC.DWG

Nr. Foglio 1

Nr. Fogli 6

Rev. 0


PROTEZIONE CIRCUITO AUSILIARE	LUCI WC S. B1 FARETTI BAGNO	LUCI WC S. B2 LED SPECCHIO
	COMANDO RELE' P.P.	COMANDO RELE' P.P.

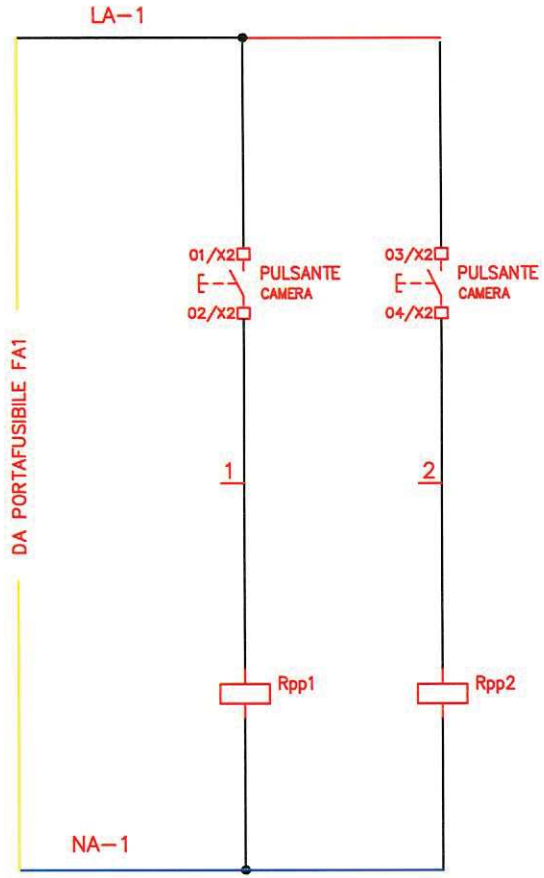

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data	03/07/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	EX SEDE "IL MATTINO
Note :	
Descrizione:	CENTRALINO CAMERA SCHEMA AUSILIARE
Matricola	346 A 379/26
Cliente	RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI
Nome File :	QCC.DWG
Percorso File :	QCC.DWG
Nr. Foglio	2
Nr. Fogli	6
Rev.	0

PROTEZIONE CIRCUITO AUSILIARE	LUCI WC S. B1 FARETTI BAGNO	LUCI WC S. B2 LED SPECCHIO	LUCI WC S. B1 FARETTI BAGNO		
	COMANDO RELE' P.P.	COMANDO RELE' P.P.	COMANDO RELE' P.P.		

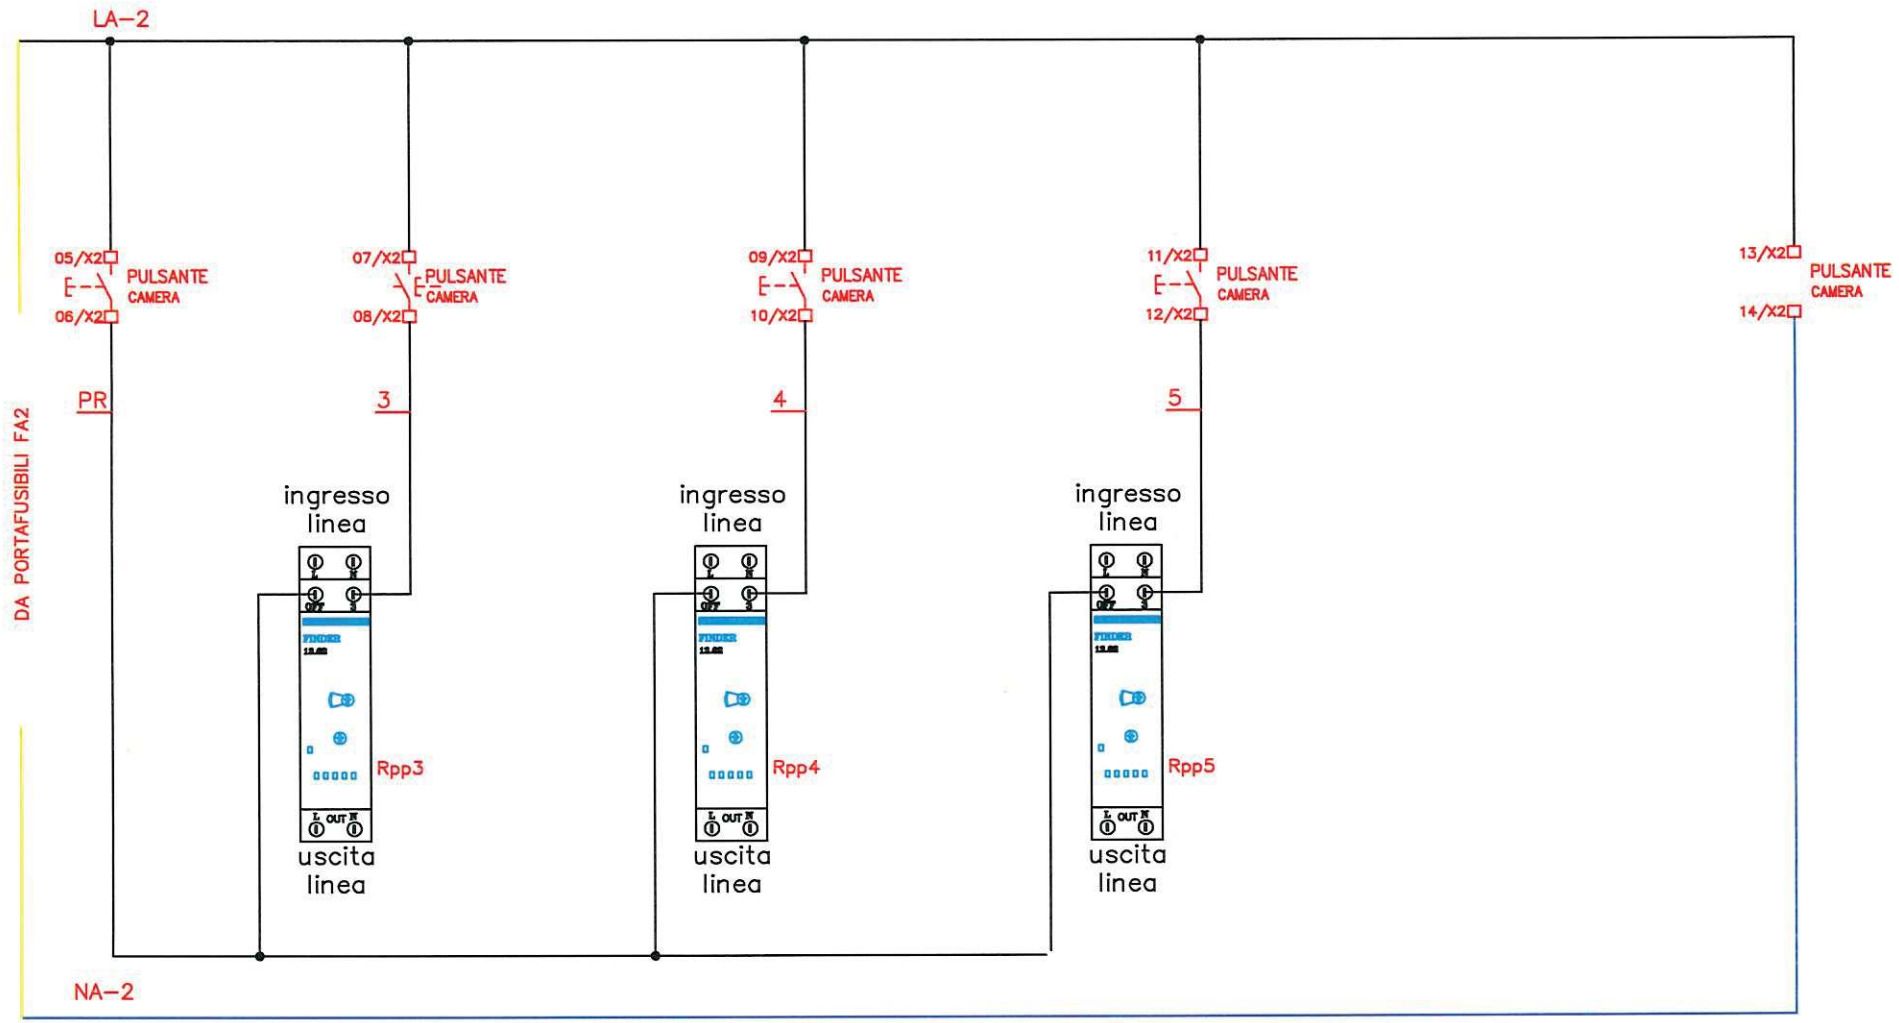


COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 03/07/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO Note :	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 346 A 379/26 Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI Nome File : QCC.DWG Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 6	Rev. 0

CENTRALINA GESTIONE CAMERA

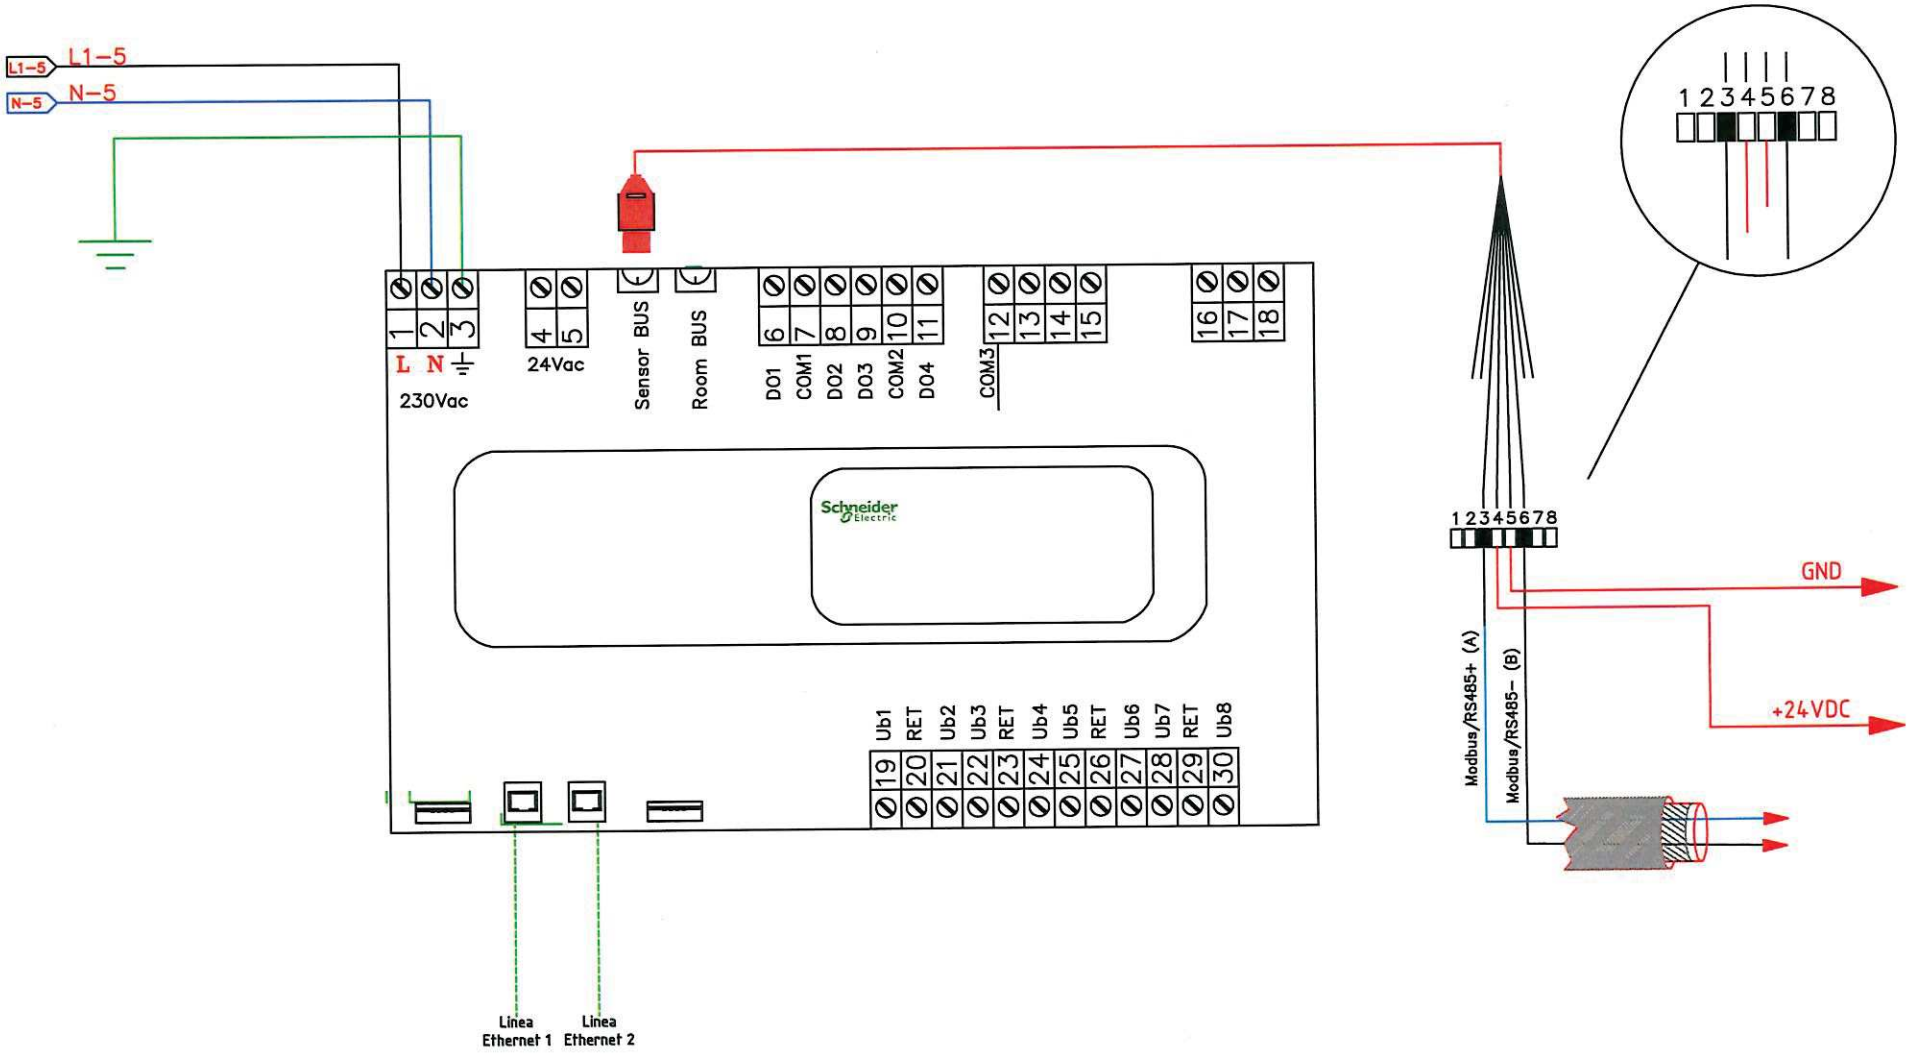


COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 03/07/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO Note :	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 346 A 379/26 Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI Nome File : QCC.DWG Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 6	Rev. 0

CENTRALINA GESTIONE CAMERA

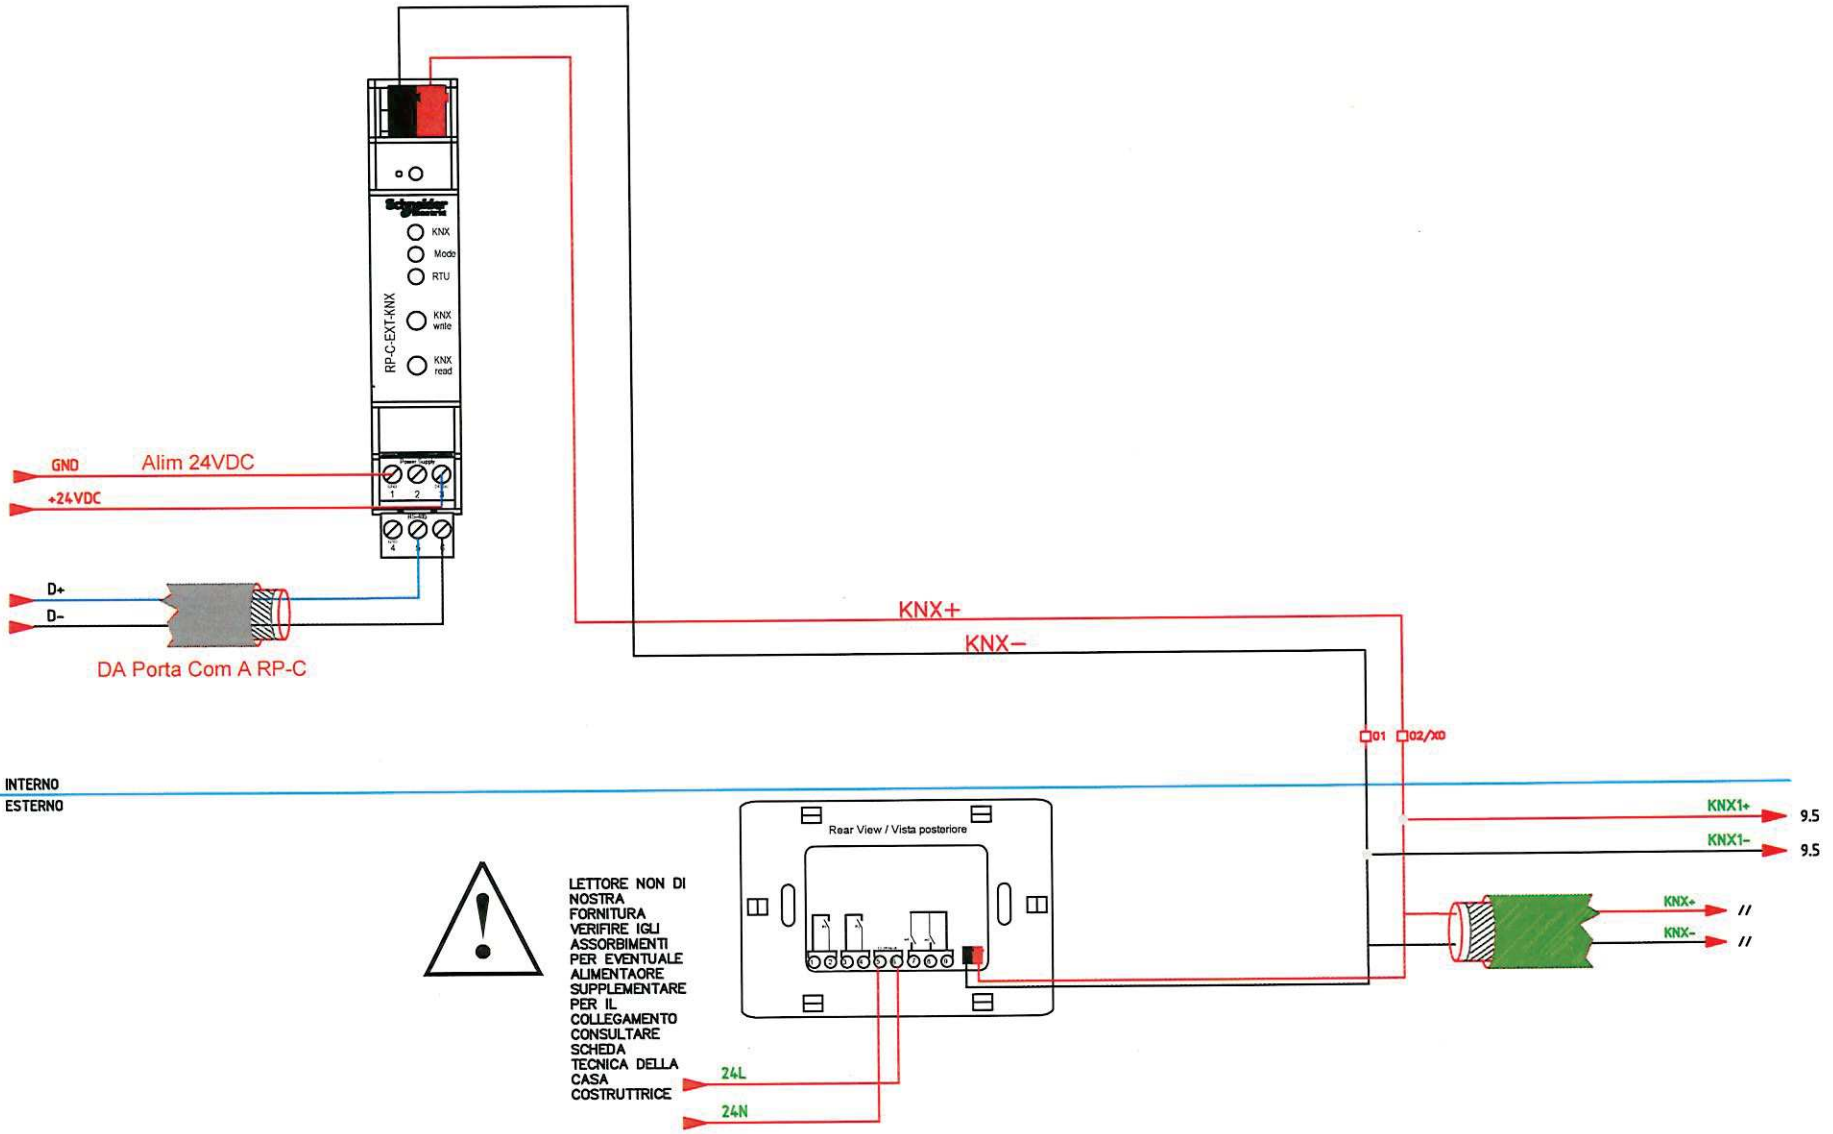

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 03/07/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO Note :	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 346 A 379/26 Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI Nome File : QCC.DWG Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 6	Rev. 0

CENTRALINA GESTIONE CAMERA

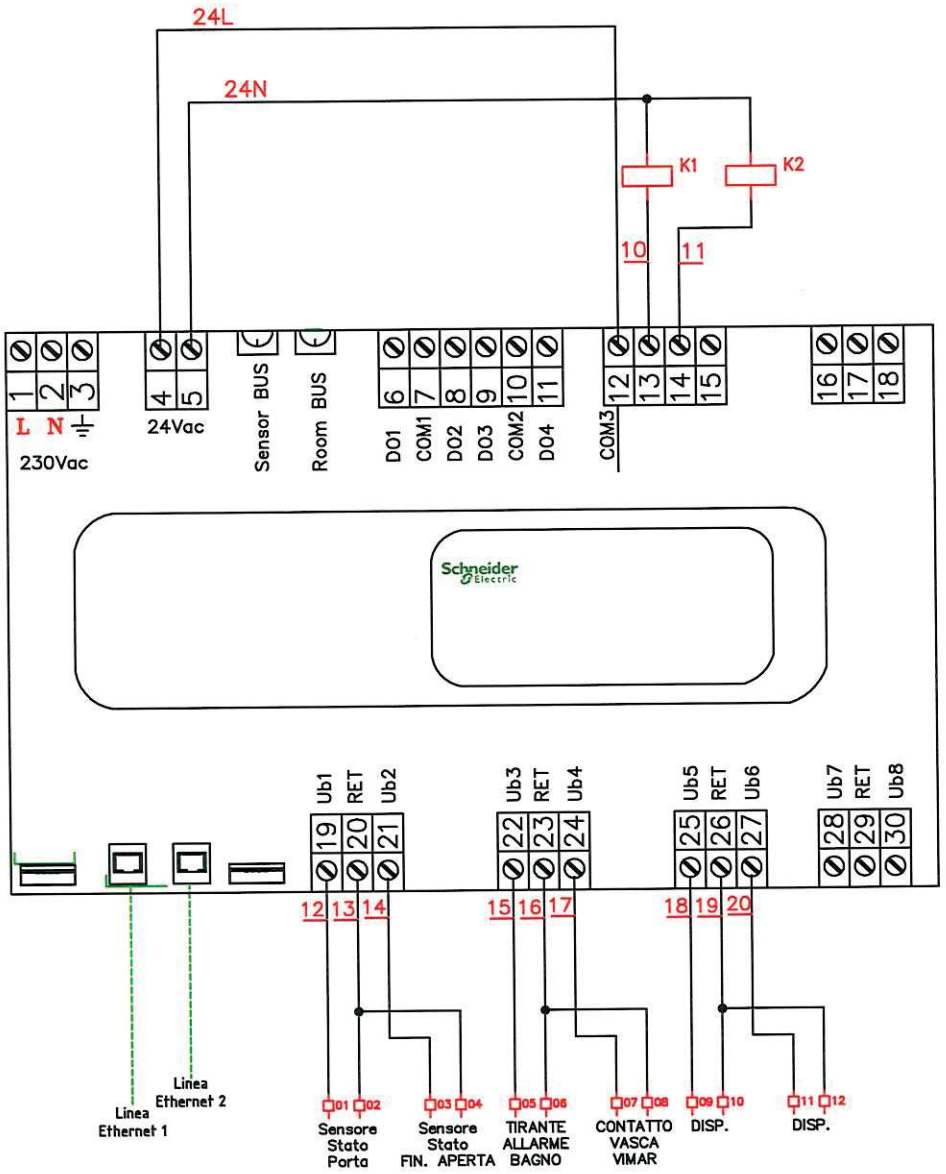

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 03/07/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO Note :	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA AUSILIARE	Matricola 346 A 379/26 Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI Nome File : QCC.DWG Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 6	Rev. 0

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA COMUNICAZIONE MODBUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI POTENZA
X2	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARE
X3	MORSETTIERA CENTRALINA GESTIONE CAMERA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 03/07/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
EX SEDE "IL MATTINO


Note :

Descrizione:
CENTRALINO CAMERA
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 346 A 379/26
Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI

Nome File : QCC.DWG
Percorso File : QCC.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 5
Rev. 0

MORSETTIERA X1

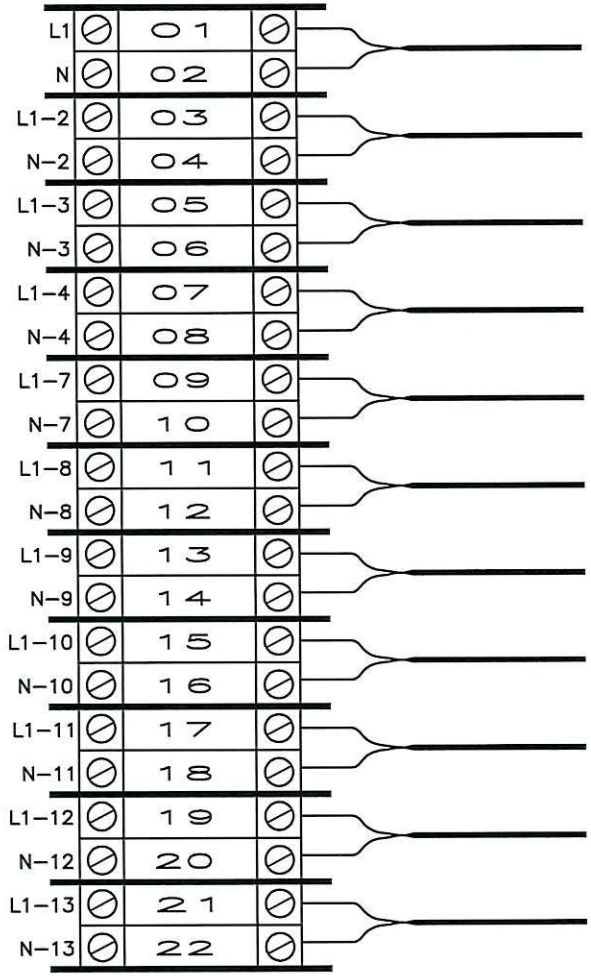

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO

Sigla: MACCHINA CAFFE' FRIGO BAR

Sigla: FAN-COIL

Sigla: CONTATTORE LUCE DI CORTESIA

Sigla: PRESE DI SERVIZIO STANZA

Sigla: PRESE WC

Sigla: GENERALE LUCI

Sigla: LUCI WC SCEN. B1 FARETTI BAGNO

Sigla: LUCI WC SCEN. B1 FARETTI BAGNO

Sigla: LUCI INGRESSO SCENARIO A


Sigla: LUCI STANZA SCENARIO C

MORSETTIERA X1

COMEC s.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 03/07/26	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 346 A 379/26				
Disegn. A. Z.			Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI				
Proget.	Note :		Nome File : QCC.DWG	Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 5	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1




MORSETTIERA X1

Sigla: LUCI COMODINO DX E SCENARIO E LUCI COMODINO

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 03/07/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO Note :	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 346 A 379/26 Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI Nome File : QCC.DWG Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 3 Nr. Fogli 5	Rev. 0

MORSETTIERA X2

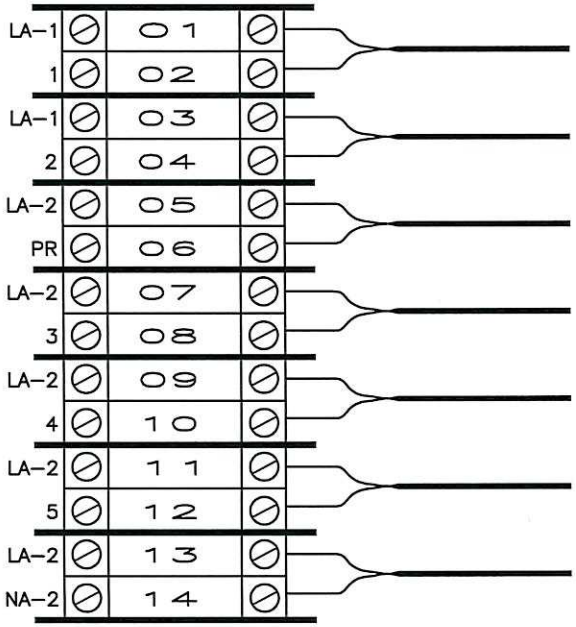

Sigla: COMANDO RPP1 – LUCI WC S. B1 FARETTI BAGNO

Sigla: COMANDO RPP2 – LUCI WC S. B2 LED SPECCHIO

Sigla: PULSANTE RESET CAMERA

Sigla: COMANDO RPP3 – LUCI WC S. B1 FARETTI BAGNO

Sigla: COMANDO RPP4 – LUCI WC S. B2 LED SPECCHIO

Sigla: COMANDO RPP5 – LUCI WC S. B1 FARETTI BAGNO


Sigla: PULSANTE CAMERA

MORSETTIERA X2

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	03/07/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	EX SEDE "IL MATTINO
Note :	
Descrizione:	CENTRALINO CAMERA SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	346 A 379/26
Cliente	RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI
Nome File :	QCC.DWG
Percorso File :	QCC.DWG
Nr. Foglio	4
Nr. Fogli	5
Rev.	0

MORSETTIERA X3

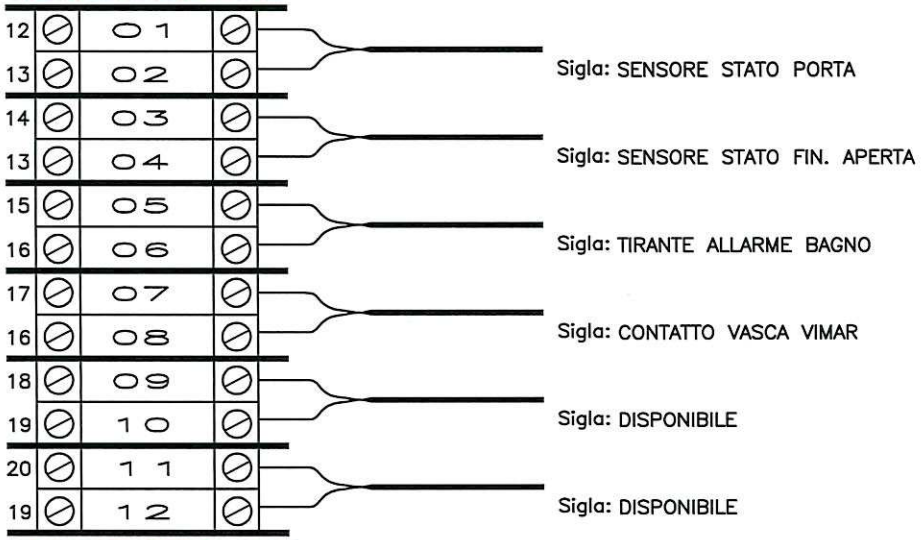

Sigla: SENSORE STATO PORTA

Sigla: SENSORE STATO FIN. APERTA

Sigla: TIRANTE ALLARME BAGNO

Sigla: CONTATTO VASCA VIMAR

Sigla: DISPONIBILE


Sigla: DISPONIBILE

MORSETTIERA X2

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 03/07/26	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 346 A 379/26				
Disegn. A. Z.			Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI				
Proget.	Note :		Nome File : QCC.DWG	Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 5	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X0



Sigla: MODBUS

MORSETTIERA X0

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 03/07/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : EX SEDE "IL MATTINO Note :	Descrizione: CENTRALINO CAMERA SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 346 A 379/26				
Cliente RIQUALIFICAZIONE DEL'EX SEDE "IL MATTINO" DI NAPOLI				
Nome File : QCC.DWG	Percorso File : QCC.DWG	Nr. Foglio 5/1	Nr. Fogli 5	Rev. 0
