COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO Q.E.P.S.



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DÌ CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DÌ CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DÌ TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DÌ POTENZA
8	SCHEMA ELETTRIOC – FUNZIONALE PER CIRCUITO AUSILIARI
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 16 / 11 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**Elettrocampania S.p.A.** **S.S. 87 km 21,200, 81025 - Marcianise (CE)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico Piano Secondo**
Locazione del quadro:	**Radisson Hotels**
Quadro:	**QE PS**
Identificazione del quadro:	**502 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	160 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	10KA

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	43
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	38
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	1745x2030x257 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	Schneider-electric S.p.A. Prisma Plus P
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9001
Note	

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.

Certificato ISO 9001:2015

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Schneider-electric S.p.A.** serie **PrismaSet P** in lamiera di acciaio trattamento di cataforesi + polvere epossi-poliestere polimerizzata a caldo;

- Trattamento elettroforesi + polveri epossidiche poliestere polimerizzata
- Colore bianco RAL9001
- Tenuta meccanica IK10
- Corrente di tenuta nominale di picco Ipk=220KA

Specifiche Tecniche

Green Premium

Questa offerta Green Premium vi aiuterà a ridurre i costi e le emissioni di gas serra grazie a un imballaggio più sostenibile realizzato interamente in cartone e senza l'uso di plastica. Eseguire la scansione del codice QR per accedere a tutti i fogli di istruzioni.

Prevenzione degli incendi elettrici

Per prevenire gli incendi di natura elettrica è necessario utilizzare prodotti in grado di comunicare tempestivamente, infatti è proprio la comunicazione la chiave per una prevenzione efficace. Scopri i prodotti Schneider Electric dedicati alla prevenzione verso gli incendi di natura elettrica.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QEP2			
Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	SCHNEIDER
LVS03220	Otturatore M9 L1000	3	SCHNEIDER
LVS04200	Collettore di terra 24M	2	SCHNEIDER
LVS04226	2 Guide modulari L1600mm	2	SCHNEIDER
LVS08245	Armadio L850 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS08265	Porta Trasp L850 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03020	Piastra NSXm/VIGI/SDx leva H L600	1	SCHNEIDER
LVS03332	Piastra front NSXm/VIGI/SDx L850 3M	1	SCHNEIDER
C124160LS	NSXm 160NA 4P EverLink_T	1	SCHNEIDER
LV426950	Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP-B	1	SCHNEIDER
LVS03851	Piastra frontale piena 1M L850	1	SCHNEIDER
LVS03854	Piastra frontale piena 4M L850	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
METSEPM3250	PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT	1	SCHNEIDER
METSECT5MA020	TA 200/5 D.27 - sbar 10x32 15x25mm	3	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9GSB750	Base portaf. SBI 3P+N 14x51 500Vca	1	SCHNEIDER
A9L40601	SPD iPRD40r 3P+N 15kA riport.estr.Tipo 2	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER

A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Q41225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Q41225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9F89425	iC60H 4P C 25A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9F89416	iC60H 4P C 16A 10000A	1	SCHNEIDER
A9Q51425	QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER

A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9A15222	iTR 63VA 12/24Vca	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
LVS03854	Piastra frontale piena 4M L850	1	SCHNEIDER
LVS08275	Canalina L300 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS08285	Porta canalina PrismaSeT G 36M	1	SCHNEIDER
LVS08841	Guarnizione porta PrismaSeT G IP43	1	SCHNEIDER
LVS04332	Schermo H canalina G	1	SCHNEIDER
LVS04220	Telaio per morsettiera in canalina G	2	SCHNEIDER
LVS08215	Estensione Armadio L600 36M G IP30	1	SCHNEIDER
LVS08235	Porta trasp. L600 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS08841	Guarnizione porta PrismaSeT G IP43	1	SCHNEIDER
LVS04331	Schermo orizzontale G	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
28901	INS40 4P manopola nera	1	SCHNEIDER
29450	Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV	1	SCHNEIDER
A9GSB750	Base portaf. SBI 3P+N 14x51 500Vca	1	SCHNEIDER
A9L40601	SPD iPRD40r 3P+N 15kA riport.estr.Tipo 2	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LGY412548	MORSETTIERA TETRAPOLARE 4x12 FORI	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER

ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
PAS600L	EPS Universal B-Pas 24VDC 2DI	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03804	Piastra frontale piena 4M	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
28901	INS40 4P manopola nera	1	SCHNEIDER
29450	Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV	1	SCHNEIDER
A9GSB750	Base portaf. SBI 3P+N 14x51 500Vca	1	SCHNEIDER
A9L40601	SPD iPRD40r 3P+N 15kA riport.estr.Tipo 2	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LGY412548	MORSETTIERA TETRAPOLARE 4x12 FORI	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LVS04052	Morsettiera di distribuzione 160A 4P	1	SCHNEIDER
OVA18508	MLT EXW-P-C	2	SCHNEIDER
A9XMSB11	Smartlink SI B - Modbus Slave RS485	6	SCHNEIDER
A9XMFA04	Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink	6	SCHNEIDER
VW3A8306DRC	TERMINALE RC MODBUS CON VITI	6	SCHNEIDER
A9A15303	iPC 2P+T 16A 250Vca italiana	1	SCHNEIDER
LGY4230	Piast supporto connet Rj45 Femmina	1	SCHNEIDER
ACTPC6ASFLS30WE	PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 3m Bia.	1	SCHNEIDER
A9XCAL06	Conf. 6 cavi 870mm Ti24 con 2 con. prec.	12	SCHNEIDER

	TRASFORMATORE 230/24Vac 160VA	1	
OVA18508	MLT EXW-P-C	2	

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

055/24 QG BFC

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**502**
Date of document: *Data del documento:*	**16/11/2026**

Customer/*Cliente*:	Elettrocampania S.p.A.		
Equipment / *Apparecchiatura*:	Prisma Plus P / Schneider-electric S.p.A.	**Date/*Del*:**	16/11/2026
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	096 / 26	**Matr./*Serial*:**	502/26
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	QE PS	**Q.ty/*Q.tà*:**	1

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	160	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	10	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	15	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	502/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	502/26 QEPS
Schematic dwg. *Schema funzionale*	502/26 QEPS
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	502/26 QEPS

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function**
  Prove di funzionamento elettrico — CEI EN 61439-2 par. 11.10 — Satisfactory / *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove — COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE: — Resp. Tecnico Sig. non presente

Technical Manager — COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it



DATI DI TARGA DEL QUADRO



DENOMINAZIONE	Q. E. PIANO SECONDO
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	160A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	10
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	43
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	1745x2030x257
MATRICOLA	502/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	

COMEC SRL
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
DATI DI TARGA

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

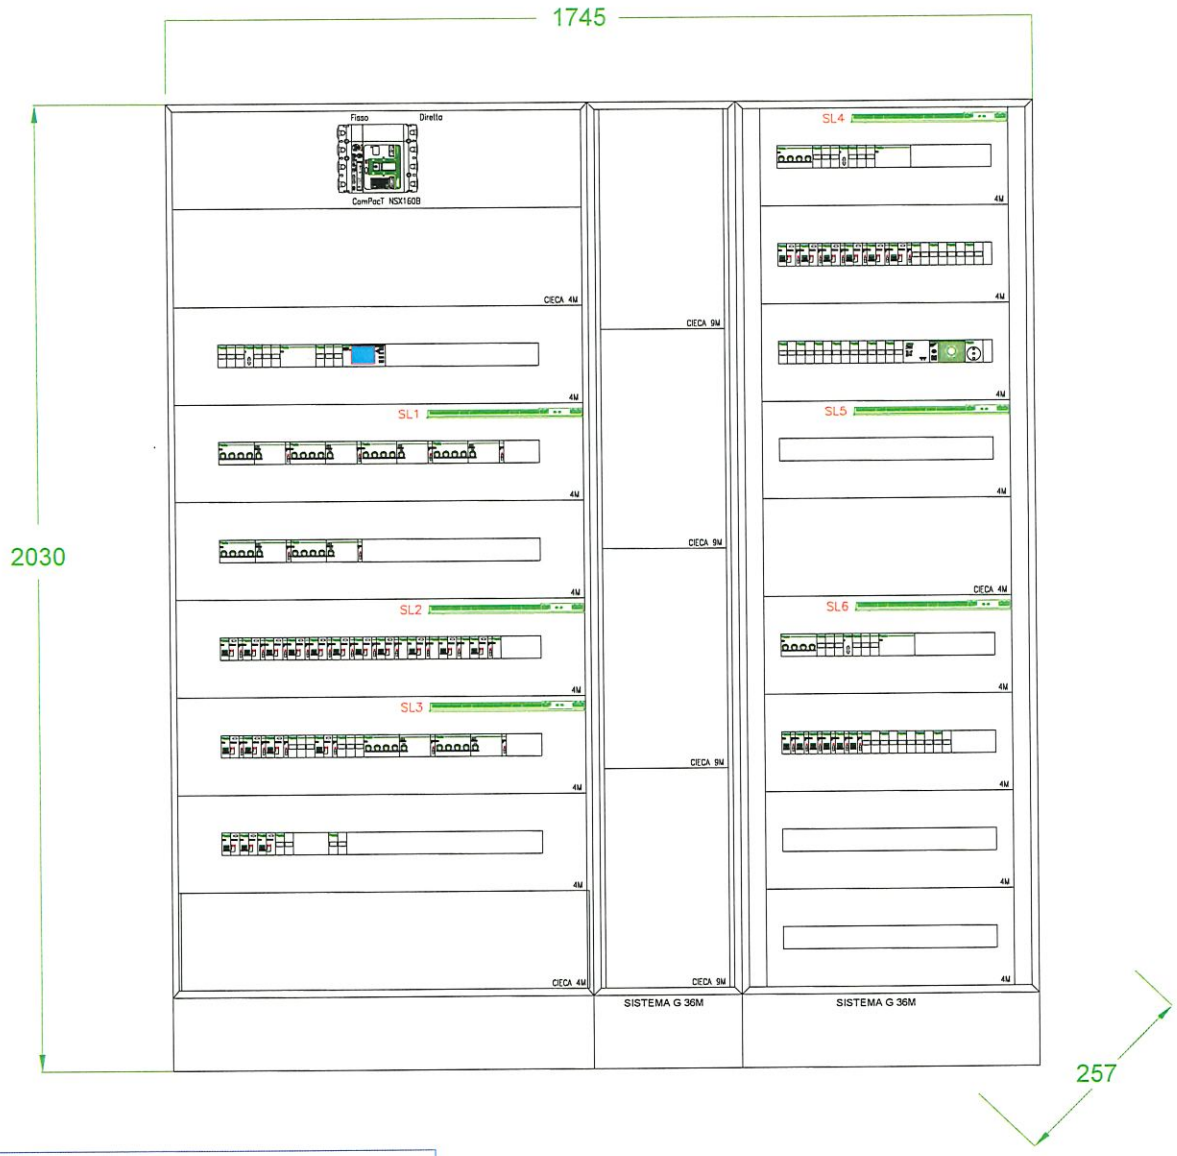

BRAND	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.
TIPO	PRISMA G
GRADO DI PROTEZIONE	IP43
DIMENSIONE BxHxP (mm)	1745x2030x257mm


COMEC SRL
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/07/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6
Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
FRONTE
QUADRO

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE—P2.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

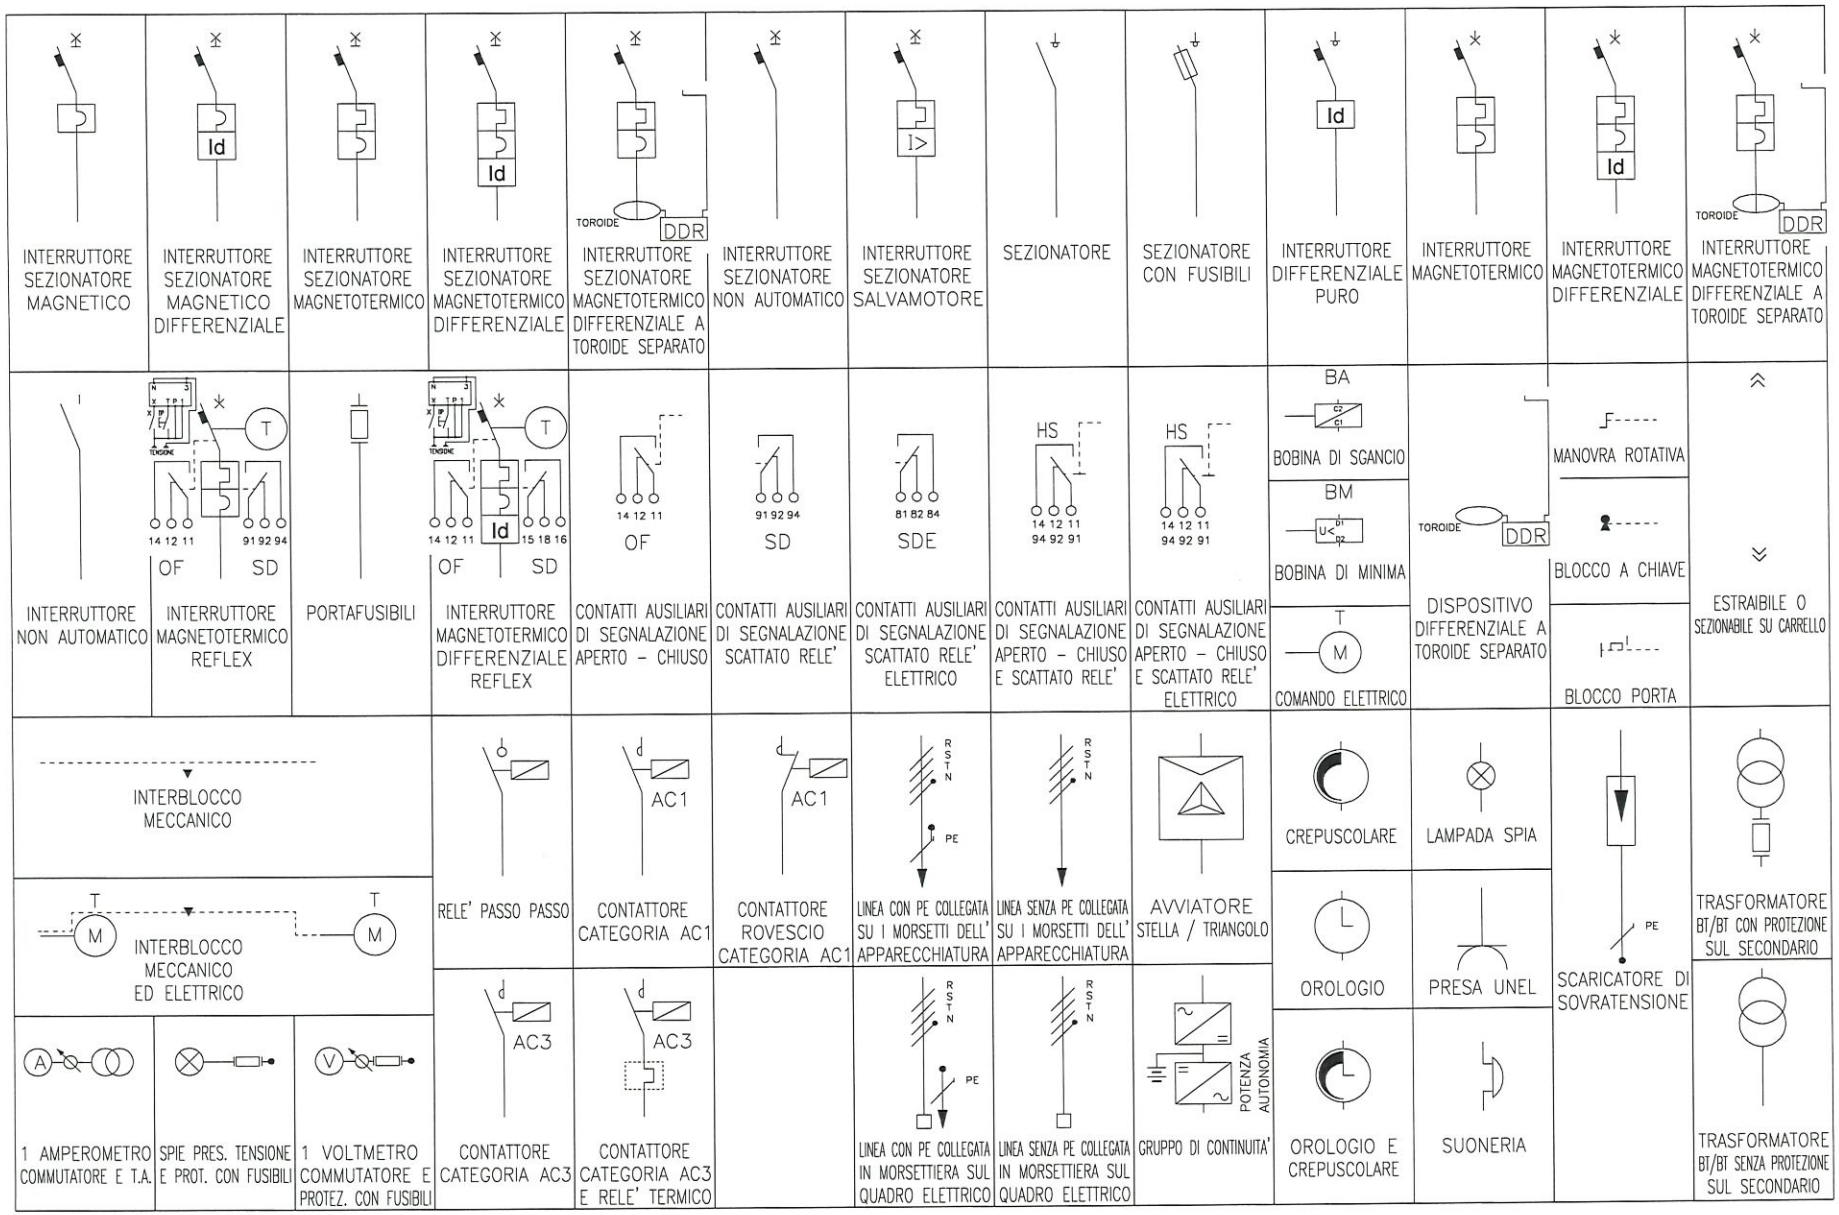

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :


Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO LEGENDA QUADRO

Matricola 502/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QE-P2.DWG	QE-P2.DWG	1	1	0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL−N	FP−N	QG		FM	FS−N	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

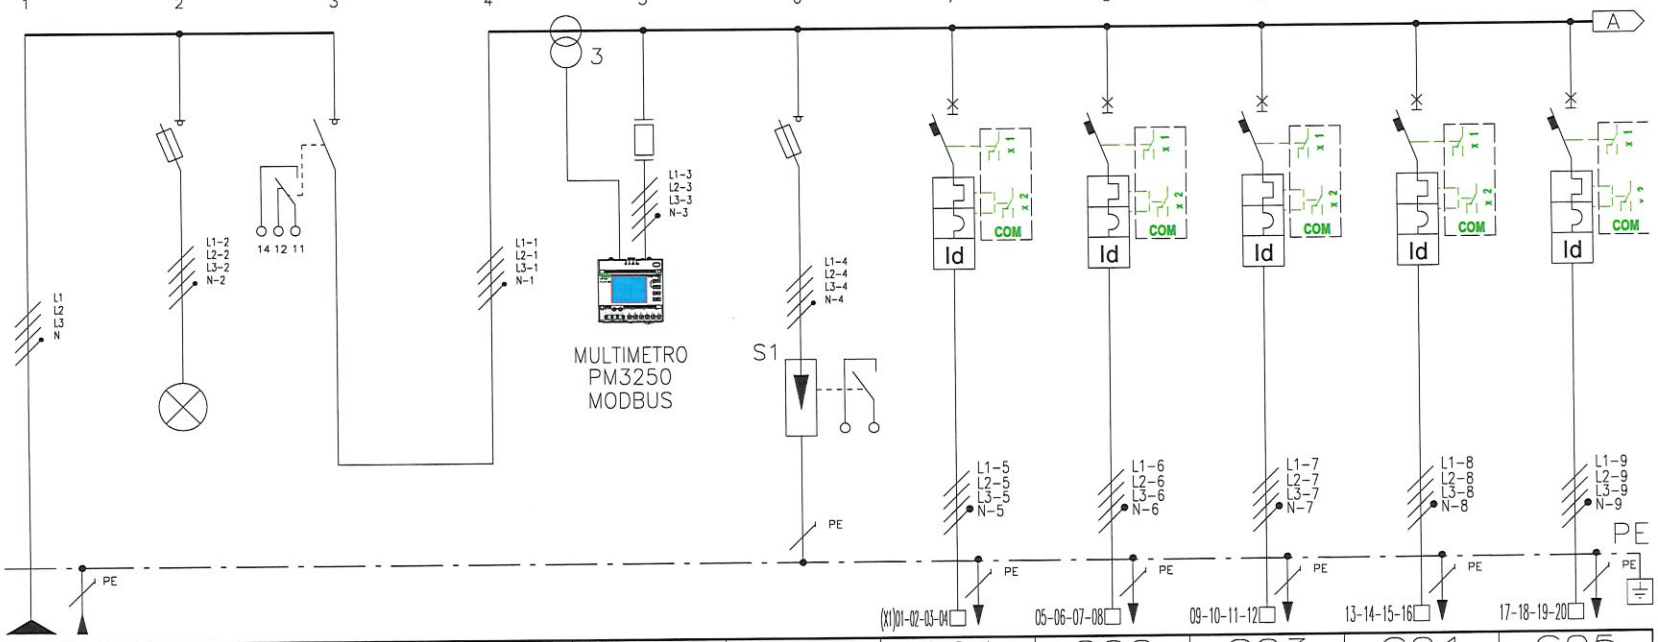

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN−S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947−2
INT. MODULARI	CEI EN 60947−2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439−1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE NORMALE		PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZIONE NORMALE	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE NORMALE		PROTEZIONE MULTIMETRO	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZ. NORMALE	C01 QEC.401−403−405 407−409−411	C02 QEC.415−419−421 423−425−427	C03 QEC.410−412 414−416−418	C04 QEC.420−422 424−426−428	C05 QEC.430−432 434−436−438
	INTERRUTTORE	TIPO			STI	NSXm			SBI	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi
		P.D.I. (kA)								10	10	10	10	10
		N. POLI x In (A)				4x160				4x40	4x40	4x40	4x40	4x40
		CURVA / SGANCIAT.								C	C	C	C	C
		SOGLIA Irth (A)								40	40	40	40	40
		SOGLIA Irm (A)								10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
	DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)								0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		RITARDO (ms)								SELETTIVO	SELETTIVO	SELETTIVO	SELETTIVO	SELETTIVO
		CLASSE								A	A	A	A	A
	CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)												
		N. POLI x In (A)												
	TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)												
	FUSIBILE	N. POLI x In (A)			3x2+N			3x2 + N	3x6+N					
	ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO						PM3250	iPRD40r 3P+N 15kA					
	CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16					FS17		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
		FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x95+PE					4x2,5		4x10+PE	4x10+PE	4x10+PE	4x10+PE	4x10+PE
	LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	70							60	30	40	60	65
		Ib (A) Iz (A)	95,6							19	19	16	16	16
		Un (V) Pn (kW)	400	58,09						400 12	400 12	400 10	400 10	400 10
		Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%												
	AUSILIARI ELETTRICI					CONTATTO AUSILIARE DI STATO			CONTATTO SCATTATO	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
	NOTE							T.A. − 200/5A						


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO − RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26	PAG. 1 DI 9	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QE−P2.DWG	

TAVOLA

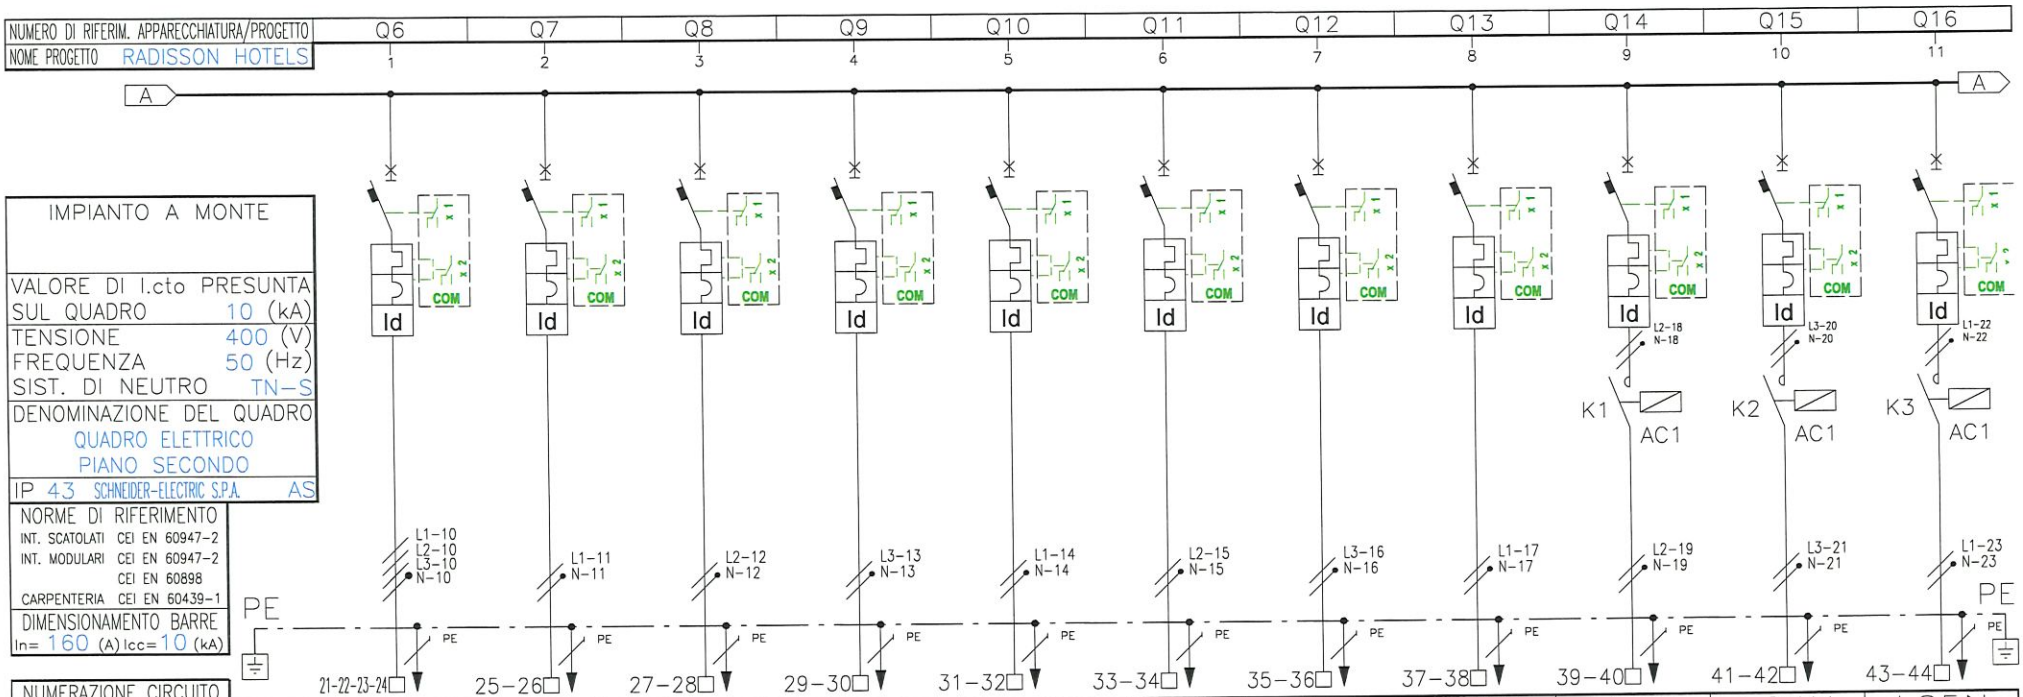

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		C06 QEC.404-406 408-413	FM01N PRESE DI SERVIZIO LOCALE QE	FM02N PRESE DI SERVIZIO SX CORRIDOIO	FM03N PRESE DI SERVIZIO DX CORRIDOIO	CDZ01 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 1	CDZ02 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 2	LO1N LUCI LOCALE QE TECNICO QE	LO2N LUCI OFFICE	LO3N LUCI PORTE CAMERE SX	LO4N LUCI PORTE CAMERE DX	LO5N LUCI SX A PARETE
INTERRUTTORE	TIPO	iC60H+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi
	P.D.I. (kA)	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)	4x40	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	40	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	AC	AC	AC	AC	AC
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)									iCT 24	iCT 24	iCT 24
	N. POLI x In (A)									2x16	2x16	2x16
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x10+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	40	10	70	65	45	75	10	70	70	70	70
	Ib (A) Iz (A)	12,8	9,6	9,6	9,6	3,8	2,9	0,2	0,2	0,6	0,5	0,5
	Un (V) Pn (kW)	400 8	230 2	230 2	230 2	230 0,8	230 0,6	230 0,05	230 0,05	230 0,13	230 0,1	230 0,11
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM CONTATTORE
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 2 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P2.DWG

TAVOLA

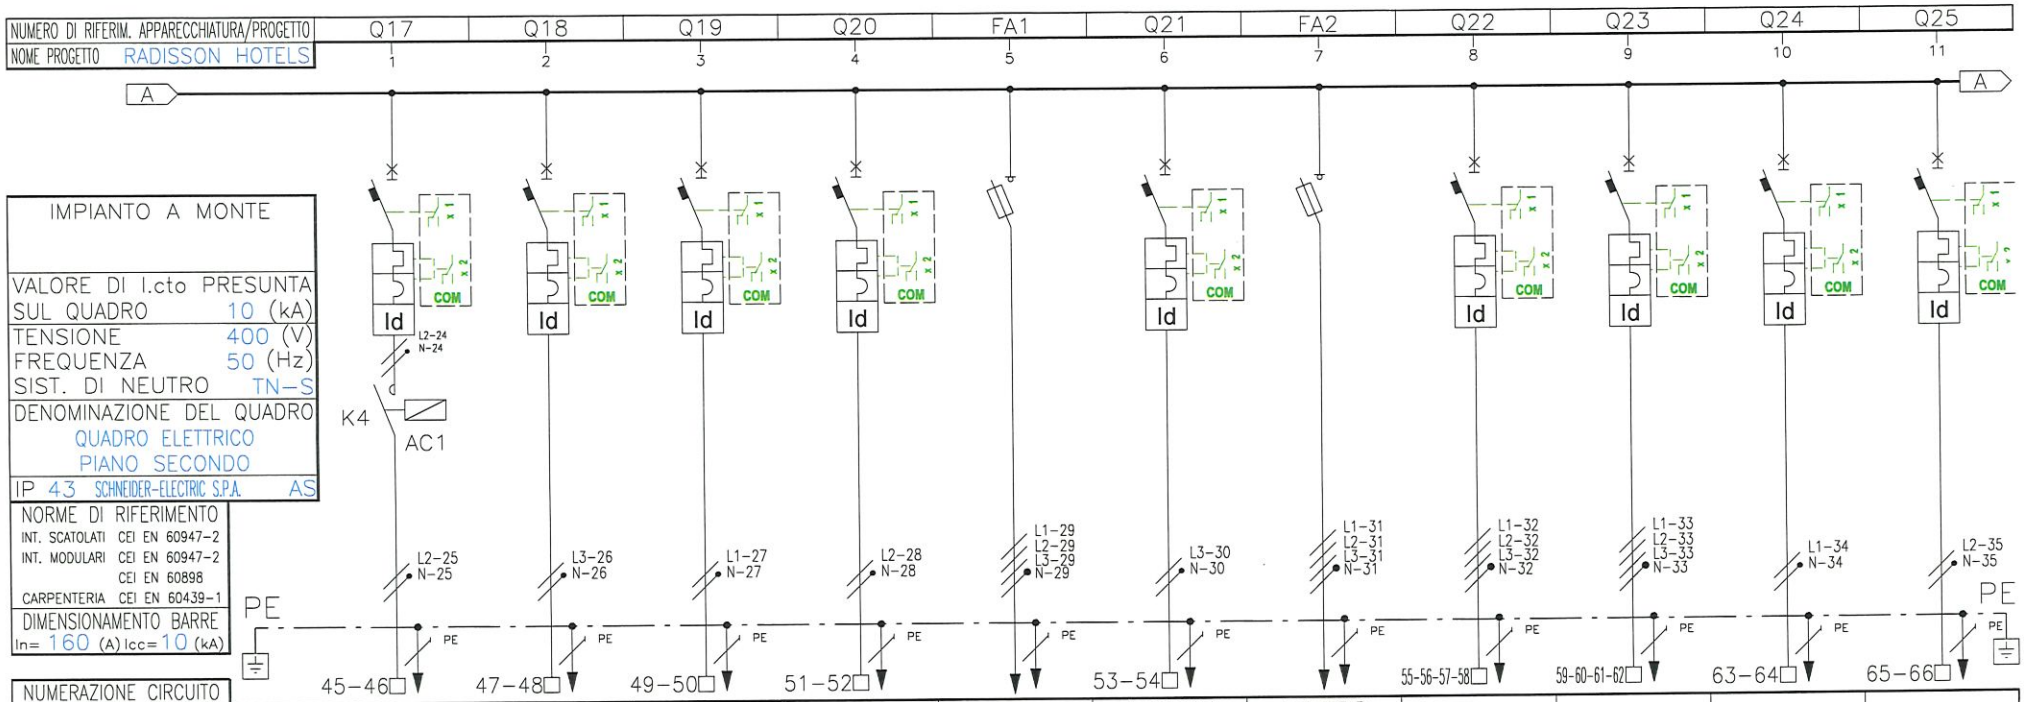

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LO6N LUCI DX A PARETE	LO8N STRIP LED LATO QUADRI SX	LO9N STRIP LED LATO QUADRI DX	LO3N LUCI PORTE FARETTI SX	RPT1 PRESENZA TENSIONE	LO3N LUCI PORTE FARETTI DX	RPT2 PRESENZA TENSIONE	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO	iC40N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC40N+Vigi	STI	iC40N+Vigi	STI	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi
	P.D.I. (kA)	6	6	6	6		6		10	10	6	6
	N. POLI x In (A)	1x10+N	2x25	2x25	1x10+N		1x10+N		4x25	4x16	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.	C	D	D	C		C		C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	10	25	25	10		10		25	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth		10Irth		10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03		0,03		0,3	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO		ISTANTANEO		SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	AC	AC	AC	AC		AC		A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)	iCT 24										
	N. POLI x In (A)	2x16										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)					2x2		2x2				
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16				
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x2,5+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x2,5+PE		2x2,5+PE					
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	70	70	70	70		70					
	Ib (A) Iz (A)	0,5	5,8	5,8	0,6		0,6					
	Un (V) Pn (kW)	230 0,11	230 1,2	230 1,2	230 0,13	400	230 0,13	400	400	400	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM		CONTATTO COM		CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Parisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO – RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 3 DI 9 | Ed. 0
Disegnatore : A. Z. | File: QE-P2.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q26	FA3		FA4							
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

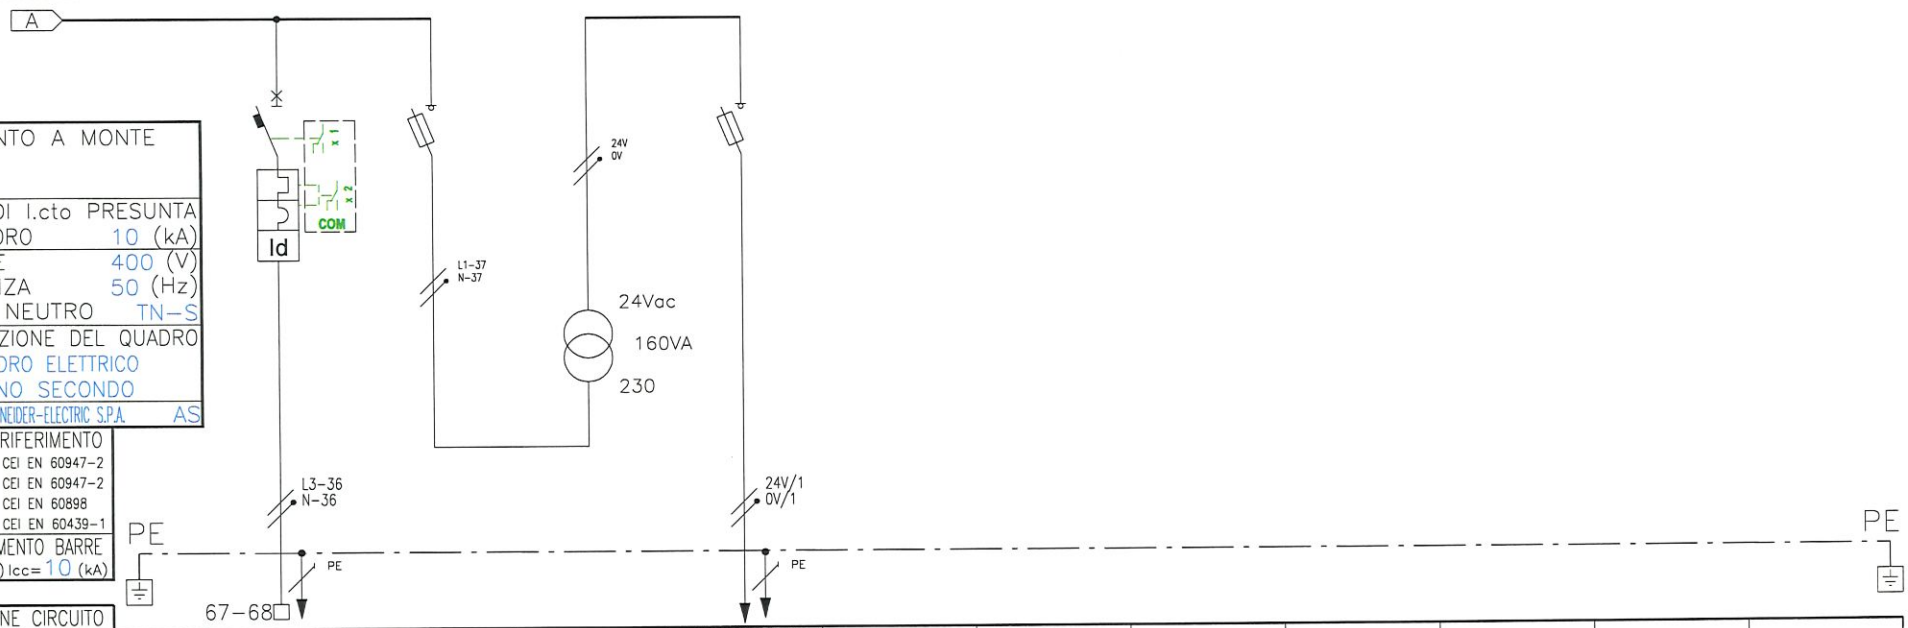

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 10 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	RISERVA	PROTEZIONE TRASFORMATORE		TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE BOBINA CONTATTORI							
INTERRUTTORE	TIPO	iC40N+Vigi	STI		STI							
	P.D.I. (kA)	6										
	N. POLI x In (A)	1x16+N										
	CURVA / SGANCIAT.	C										
	SOGLIA Irth (A)	16										
	SOGLIA Irm (A)	10Irth										
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03										
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO										
	CLASSE	A										
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		2x2		1x4+N							
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)				FG16OM16							
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230			230							
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM										
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 4 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P2.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL-E	FP-E	QG-E		FS-E	Q1-E	Q2-E	Q3-E	Q4-E	Q5-E	Q6-E
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

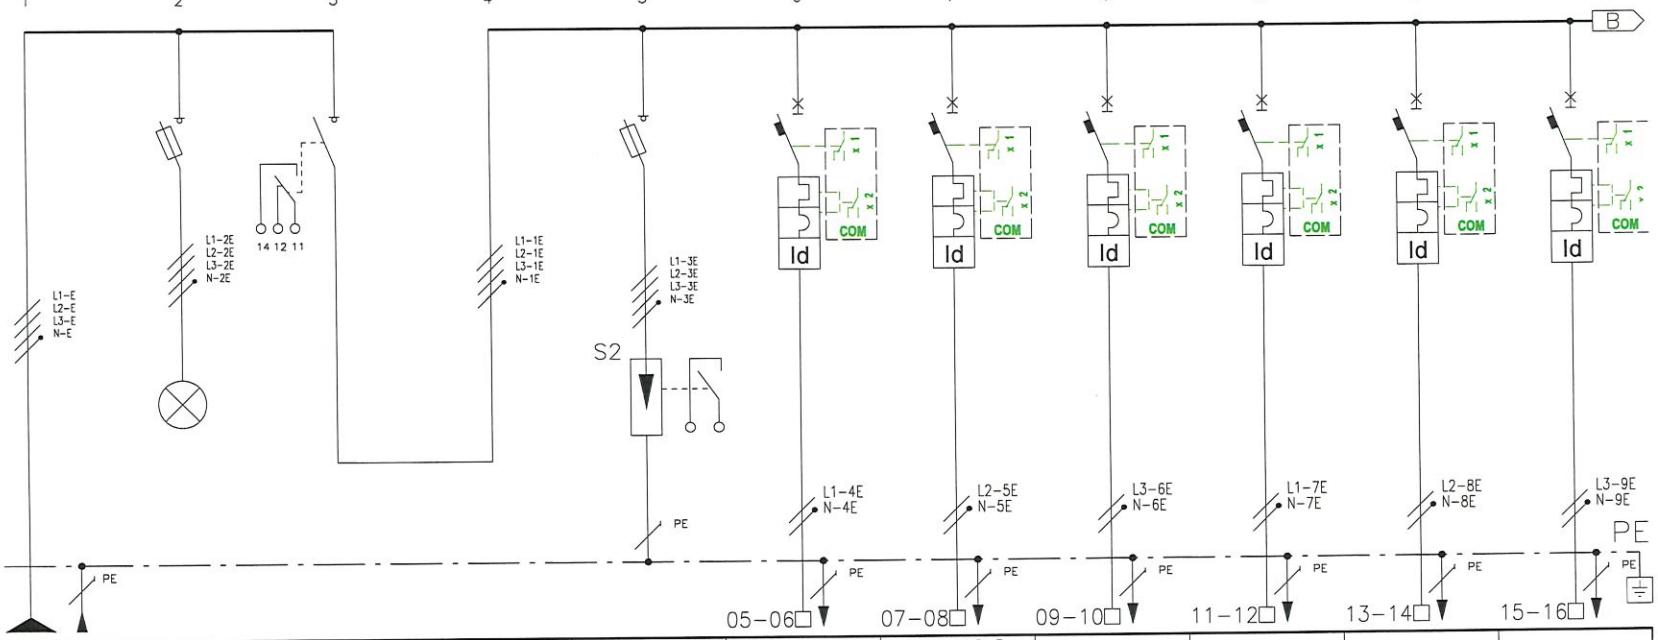

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE FM/CONTINUITA'	PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZ. FM/CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE FM/CONTINUITA'		PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZ. FM/CONTINUITA'	FM01C RACK DATI SECONDO PIANO	FM02C POSTAZIONE DI LAVORO OFFICE	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO												
INTERRUTTORE	TIPO		STI	INS		SBI	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi
	P.D.I. (kA)						6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)			4x40			1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.						C	C	B	B	B	B
	SOGLIA Irth (A)						16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)						ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE						A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		3x2+N			3x6+N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iPRD40r 3P+N 15kA						
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16					FG160M16	FG160M16				
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x10+PE					2x4+PE	2x4+PE				
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	85					10	70				
	Ib (A) Iz (A)	9,6					9,6	7,2				
	Un (V) Pn (kW)	400 3,5					230 2	230 2	230	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI				CONTATTO AUSILIARE DI STATO		CONTATTO SCATTATO	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE												


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO – RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26	PAG. 5 DI 9	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QE-P2.DWG	

TAVOLA

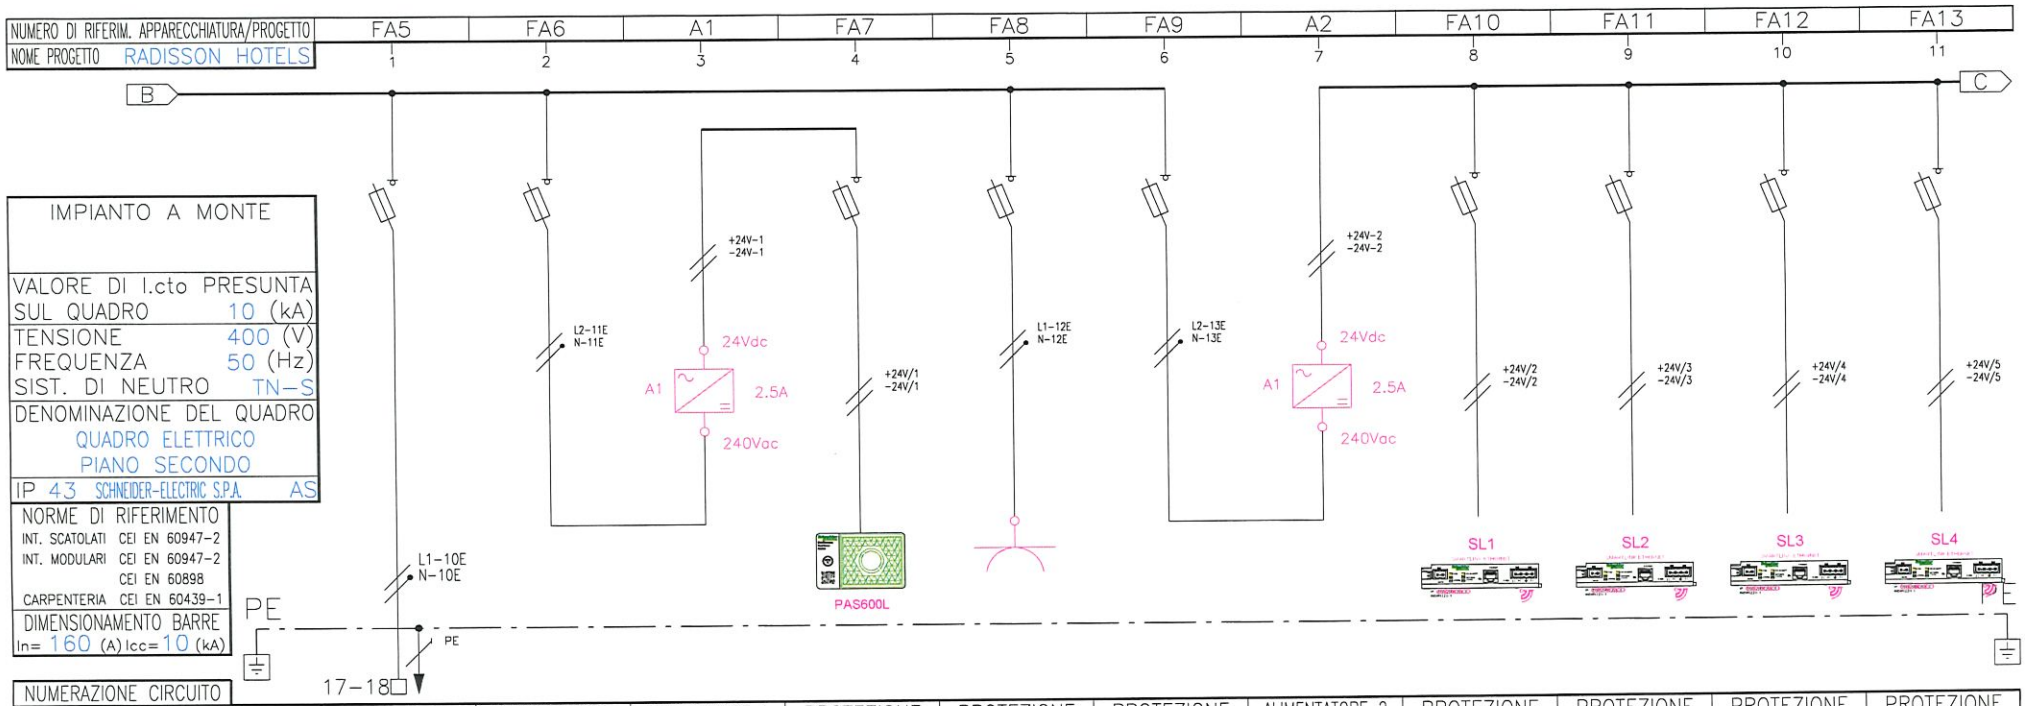

NUMERAZIONE CIRCUITO / DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		AUX RISERVA	PROTEZIONE ALIMENTATORE 1 P=60W 230/24Vcc	ALIMENTATORE 1 230/24Vcc	PROTEZIONE PANEL SERVER	PROTEZIONE PRESA	PROTEZIONE ALIMENTATORE 2 P=120W 230/24Vcc	ALIMENTATORE 2 230/24Vcc	PROTEZIONE SMART LINK 1	PROTEZIONE SMART LINK 2	PROTEZIONE SMART LINK 3	PROTEZIONE SMART LINK 4
INTERRUTTORE	TIPO	STI	STI		STI	STI	STI		STI	STI	STI	STI
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	1x4+N	1x2+N		2x2	2x4	1x2+N		2x1	2x1	2x1	2x1
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16										
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230										
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081 8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO – RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 6 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P2.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FA14	FA15									
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

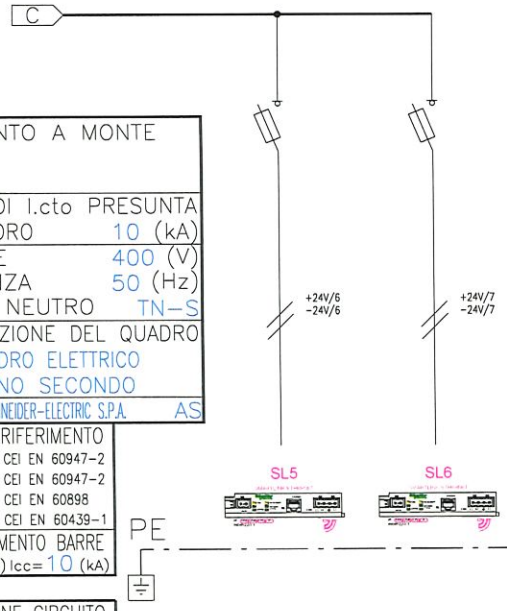

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE SMART LINK 5	PROTEZIONE SMART LINK 6								
INTERRUTTORE	TIPO	STI	STI								
	P.D.I. (kA)										
	N. POLI x In (A)										
	CURVA / SGANCIAT.										
	SOGLIA Irth (A)										
	SOGLIA Irm (A)										
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)										
	RITARDO (ms)										
	CLASSE										
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)										
	N. POLI x In (A)										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)										
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x1	2x1								
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO										
CONDUTTORE	TIPO										
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)										
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA										
	Ib (A) Iz (A)										
	Un (V) Pn (kW)										
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%										
AUSILIARI ELETTRICI											
NOTE											

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO – RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 7 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P2.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL–C	FP–C	QG–C		FS–C	Q1–C	Q2–C	Q3–C	Q4–C	Q5–C	Q6–C
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

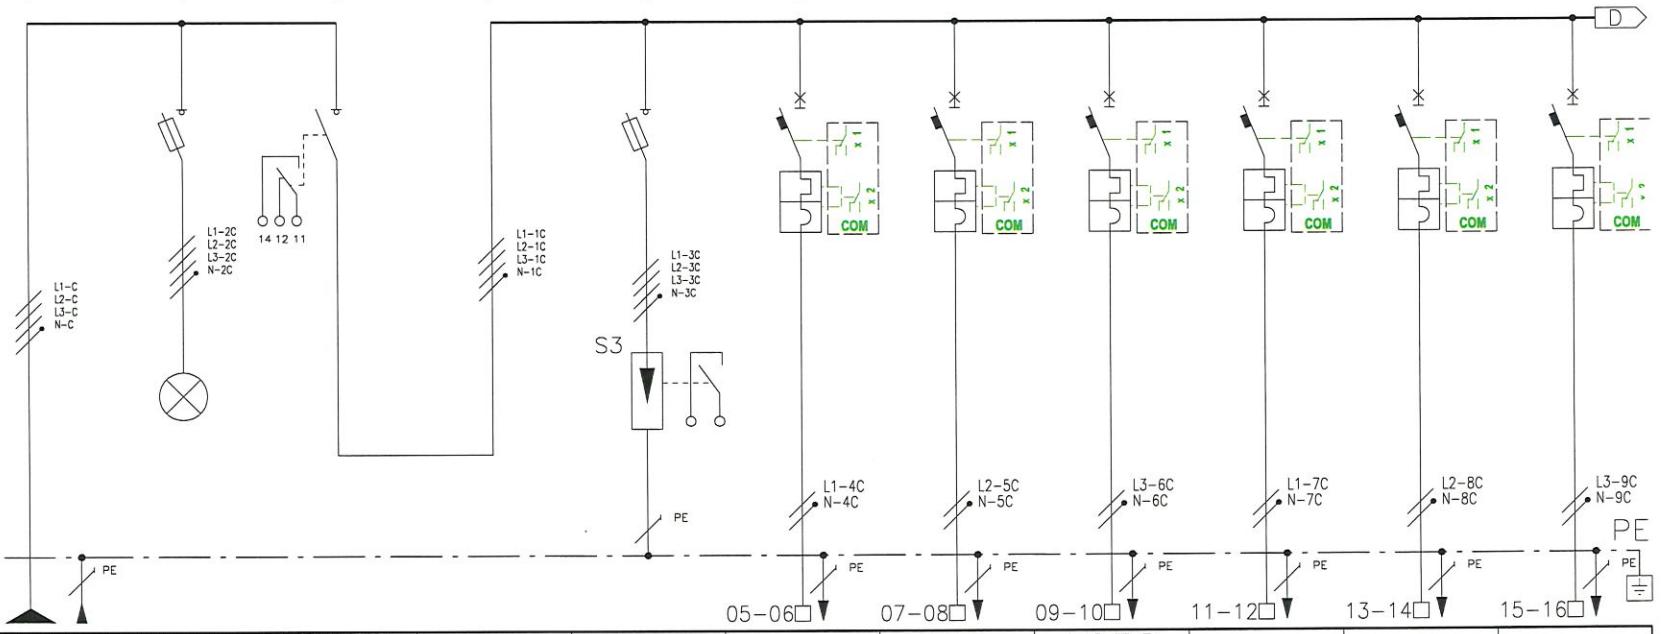

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE LUCE/CONTINUITA'	PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZIONE LUCE/CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE LUCE/CONTINUITA'		PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZ. LUCE/CONTINUITA'	LO1C STRIP LED LATO PORTE SX	LO2C STRIP LED LATO PORTE DX	LO3C LUCI PITTOGRAMMI	RISERVA	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO		STI	INS		SBI	iC60N	iC60N	iC40N	iC40N	iC40N	iC40N
	P.D.I. (kA)						6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)			4x40			2x25	2x25	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N
	CURVA / SGANCIAT.						D	D	B	B	B	B
	SOGLIA Irth (A)						25	25	10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		3x2+N			3x6+N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iPRD40r 3P+N 15kA						
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16					FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16			
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x6+PE					2x4+PE	2x4+PE	2x2,5+PE			
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	100					80	65	70			
	Ib (A) Iz (A)	7,7					5,8	7,7	1			
	Un (V) Pn (kW)	400 3					230 1,2	230 1,6	230 0,2	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI				CONTATTO AUSILIARE DI STATO		CONTATTO SCATTATO	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO – RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 8 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE–P2.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FA16	FA17	FA18	FA19	FA20						
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

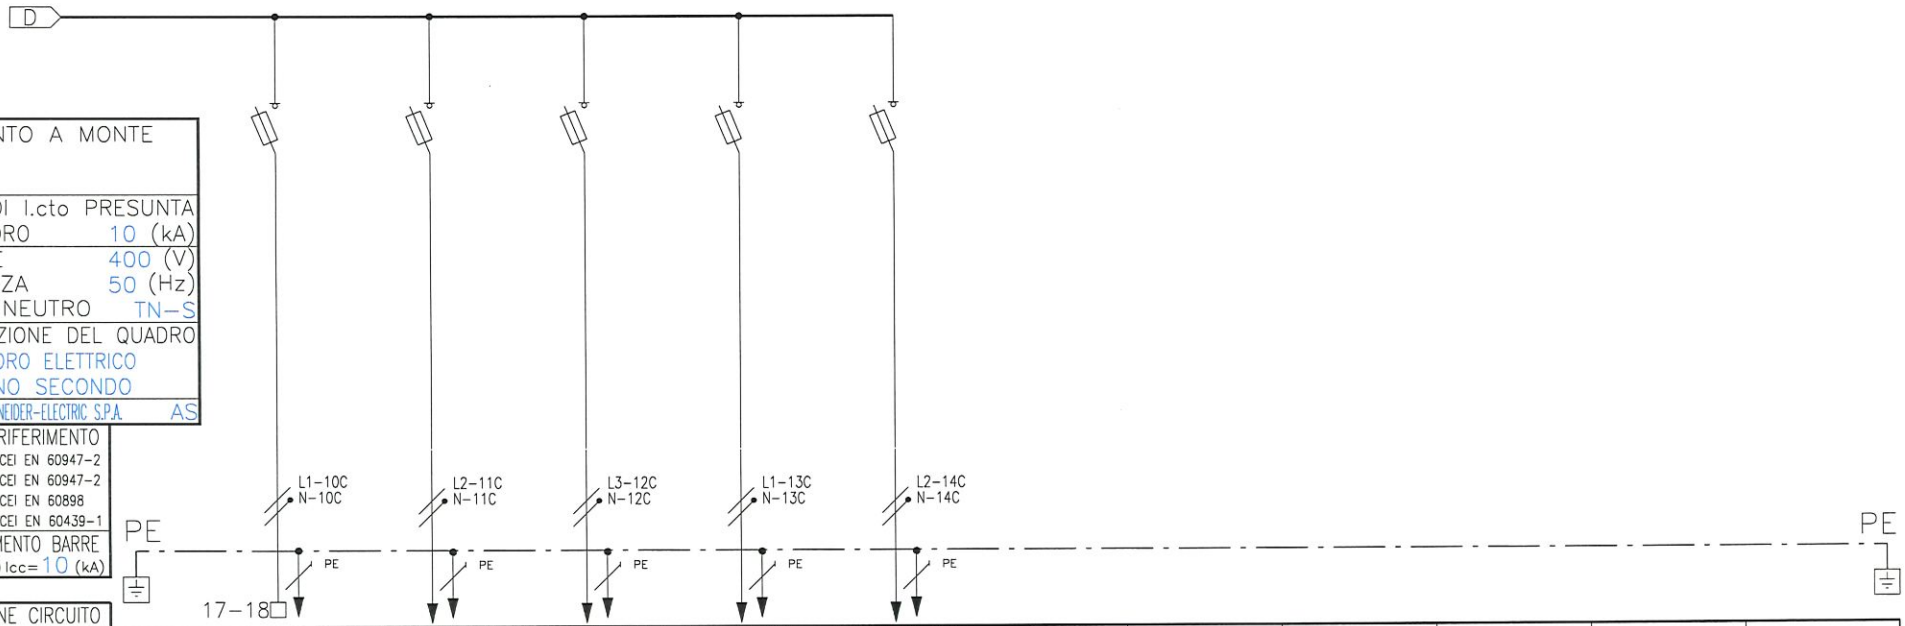

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 10 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		RISERVA	ALIMENTATORE KNX 1	GATEWAY KNX-DALI 1	ALIMENTATORE KNX 2	GATEWAY KNX-DALI 2						
INTERRUTTORE	TIPO	STI	STI	STI	STI	STI						
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	1x4+N	1x2+N	1x1+N	1x2+N	1x1+N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16						
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230						
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 9 DI 9 | Ed. 0


Disegnatore : A. Z. | File: QE-P2.DWG


TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	CONDENSATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6
Note :


Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 16
Rev. 0


DISTRIBUZIONE MODBUS

MULTIMETRO

PANEL SERVER

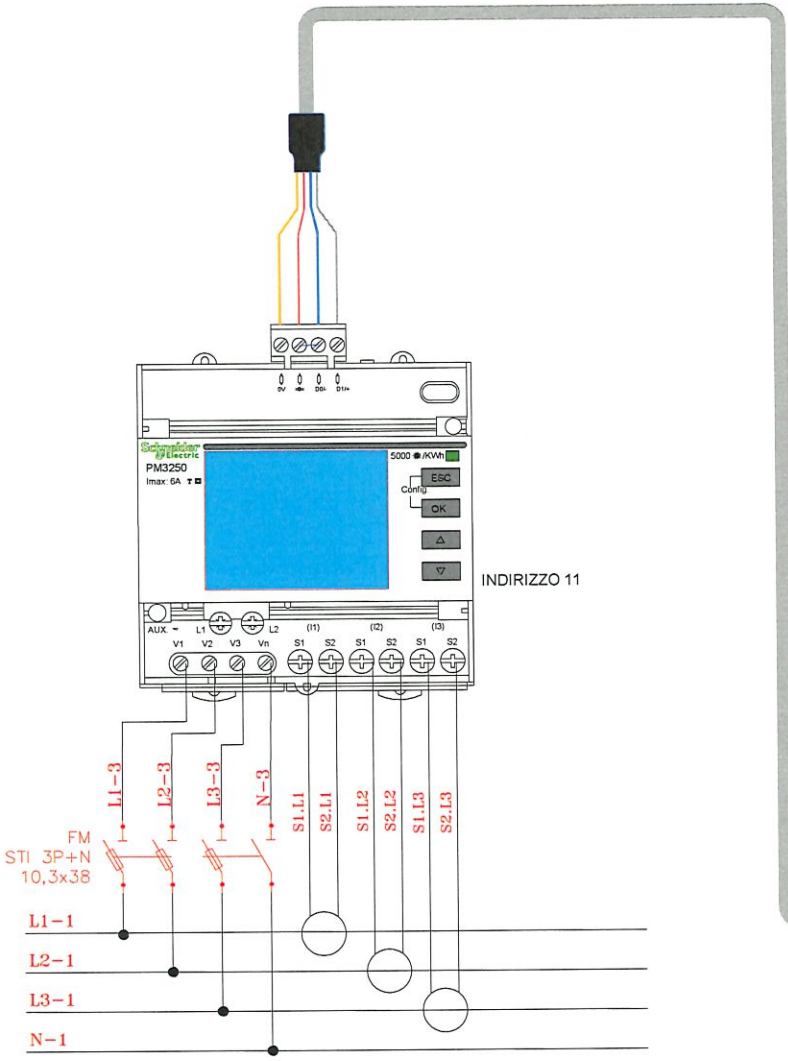


TSXCSA100 o BELDEN 9842 (***)

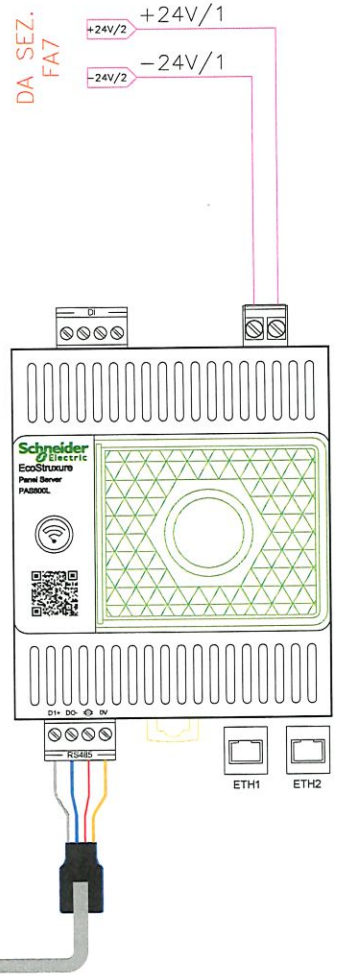

COMEC S.R.L.	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	502/26	
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19	Disegn. A. Z.	RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Q. E. PIANO SECONDO	Cliente	RADISSON HOTELS	
www.comeccab.it - 0818511774	Proget.	Note :	SCHEMA AUSILIARE	Nome File : QE-P2.DWG	Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 2 / Nr. Fogli 16 / Rev. 0
	visto					


CONTATTI AUSILIARI

MORSETTIERA XA1

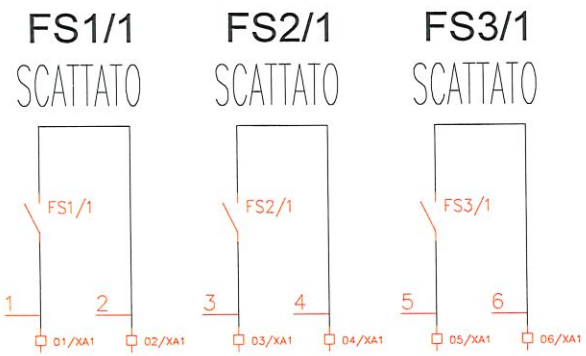

COMEC SRL 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Progel. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 3 Nr. Fogli 16	Rev. 0

ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK

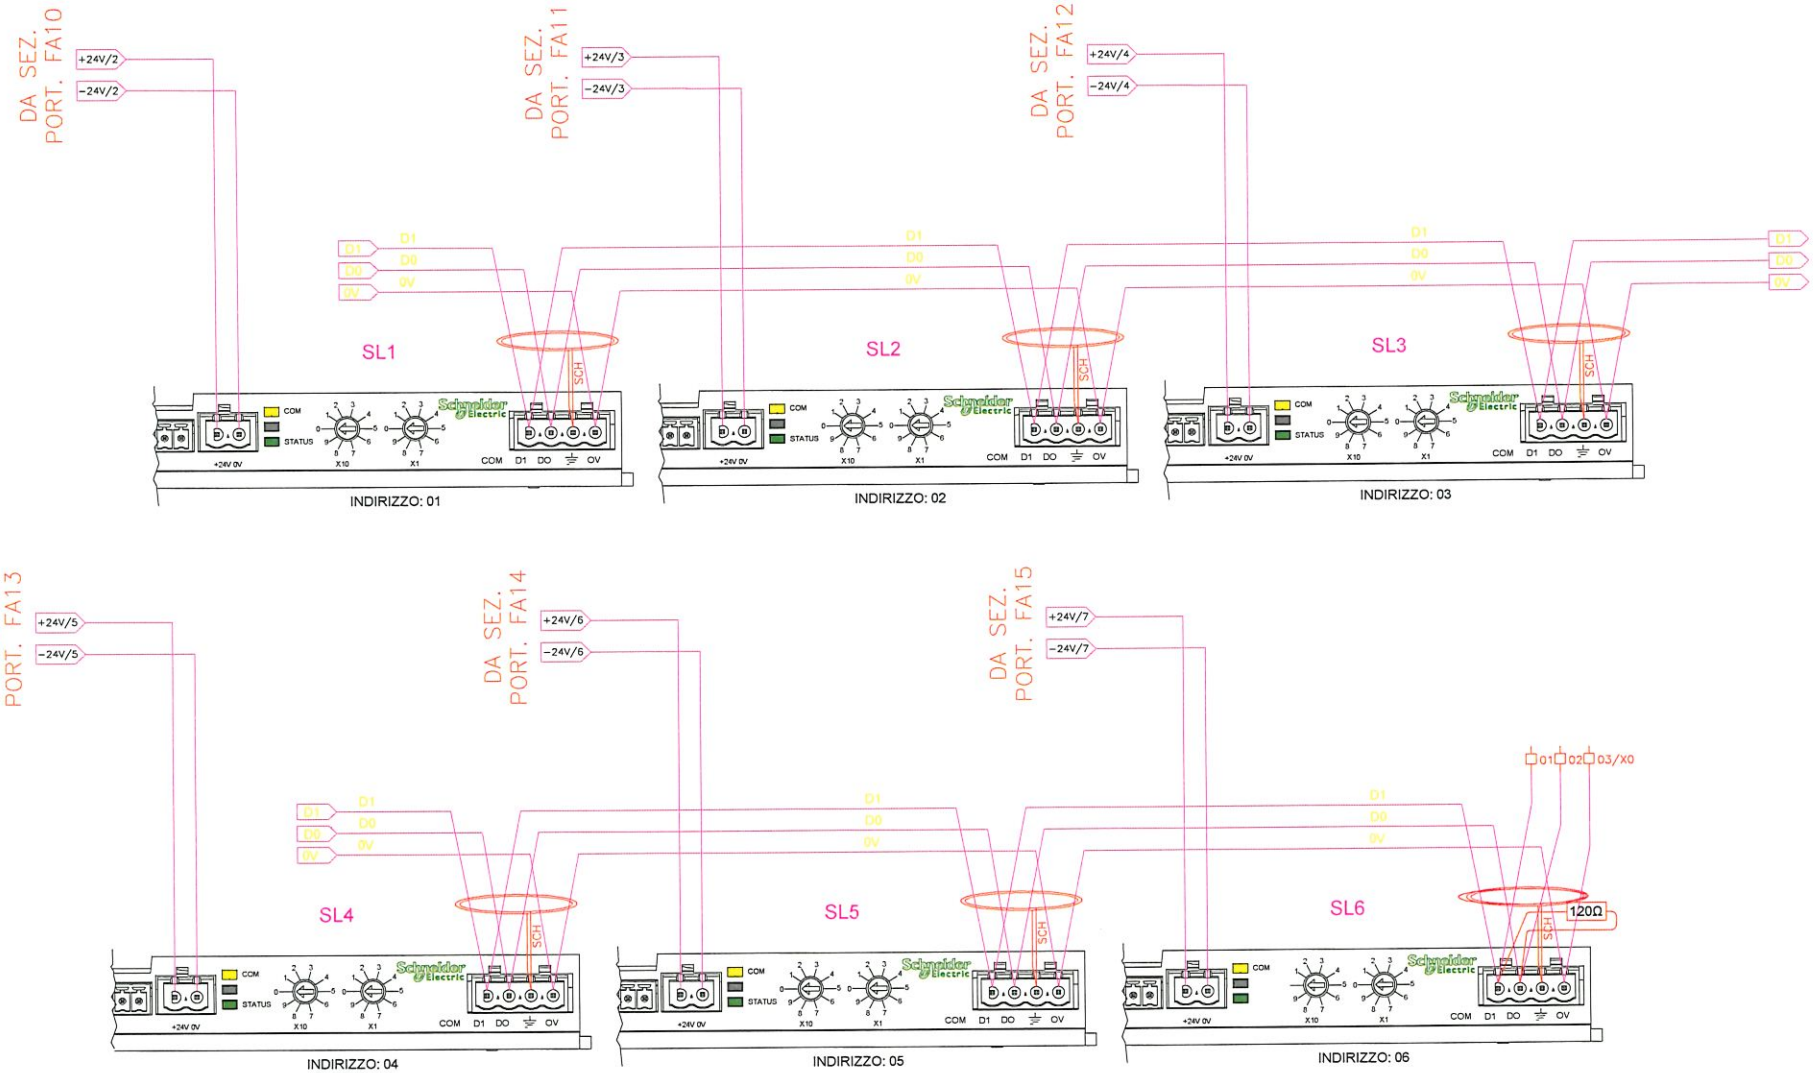


COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE–P2.DWG Percorso File : QE–P2.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 16	Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL1

CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE QG


SL1-PORTA 1



STATO "CHIUSO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1


SL1-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2

SL1-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3


SL1-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4


SL1-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5


SL1-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6


SL1-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE

Matricola 502/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P2.DWG

Percorso File : QE-P2.DWG

Nr. Foglio 5


Nr. Fogli 16

Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL2

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q7


SL2-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q8

SL2-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q9


SL2-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q10

SL2-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q11

SL2-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q12


SL2-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q13


SL2-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q14


SL2-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q15


SL2-PORTA 9



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q16


SL2-PORTA 10



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q17

SL2-PORTA 11



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

COMEC S.R.L.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :


Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE–P2.DWG
Percorso File : QE–P2.DWG
Nr. Foglio 6
Nr. Fogli 16
Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL3

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q18


SL3-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q19


SL3-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q20


SL3-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q21


SL3-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q22


SL3-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q23


SL3-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q24

SL3-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q25

SL3-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q26


SL3-PORTA 9



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6
Note :


Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 7
Nr. Fogli 16
Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL4

CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE QG-E


SL4-PORTA 1



STATO "CHIUSO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1-E


SL4-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2-E


SL4-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3-E


SL4-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4-E


SL4-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5-E


SL4-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6-E


SL4-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE

Matricola 502/26


Cliente RADISSON HOTELS

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QE-P2.DWG	QE-P2.DWG	8	16	0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL5


-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 1




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 2




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 3




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 4




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 5




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 6




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 7




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 11



COMEC SRL
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA
AUSILIARE


Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 9
Nr. Fogli 16
Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL6

CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE QG-C


SL5-PORTA 1



STATO "CHIUSO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1-C


SL5-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2-C


SL5-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3-C


SL5-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4-C


SL5-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5-C


SL5-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6-C


SL5-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE

Matricola 502/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P2.DWG

Percorso File : QE-P2.DWG

Nr. Foglio 10


Nr. Fogli 16

Rev. 0

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC 1

ALIMENTATORE KNX 1

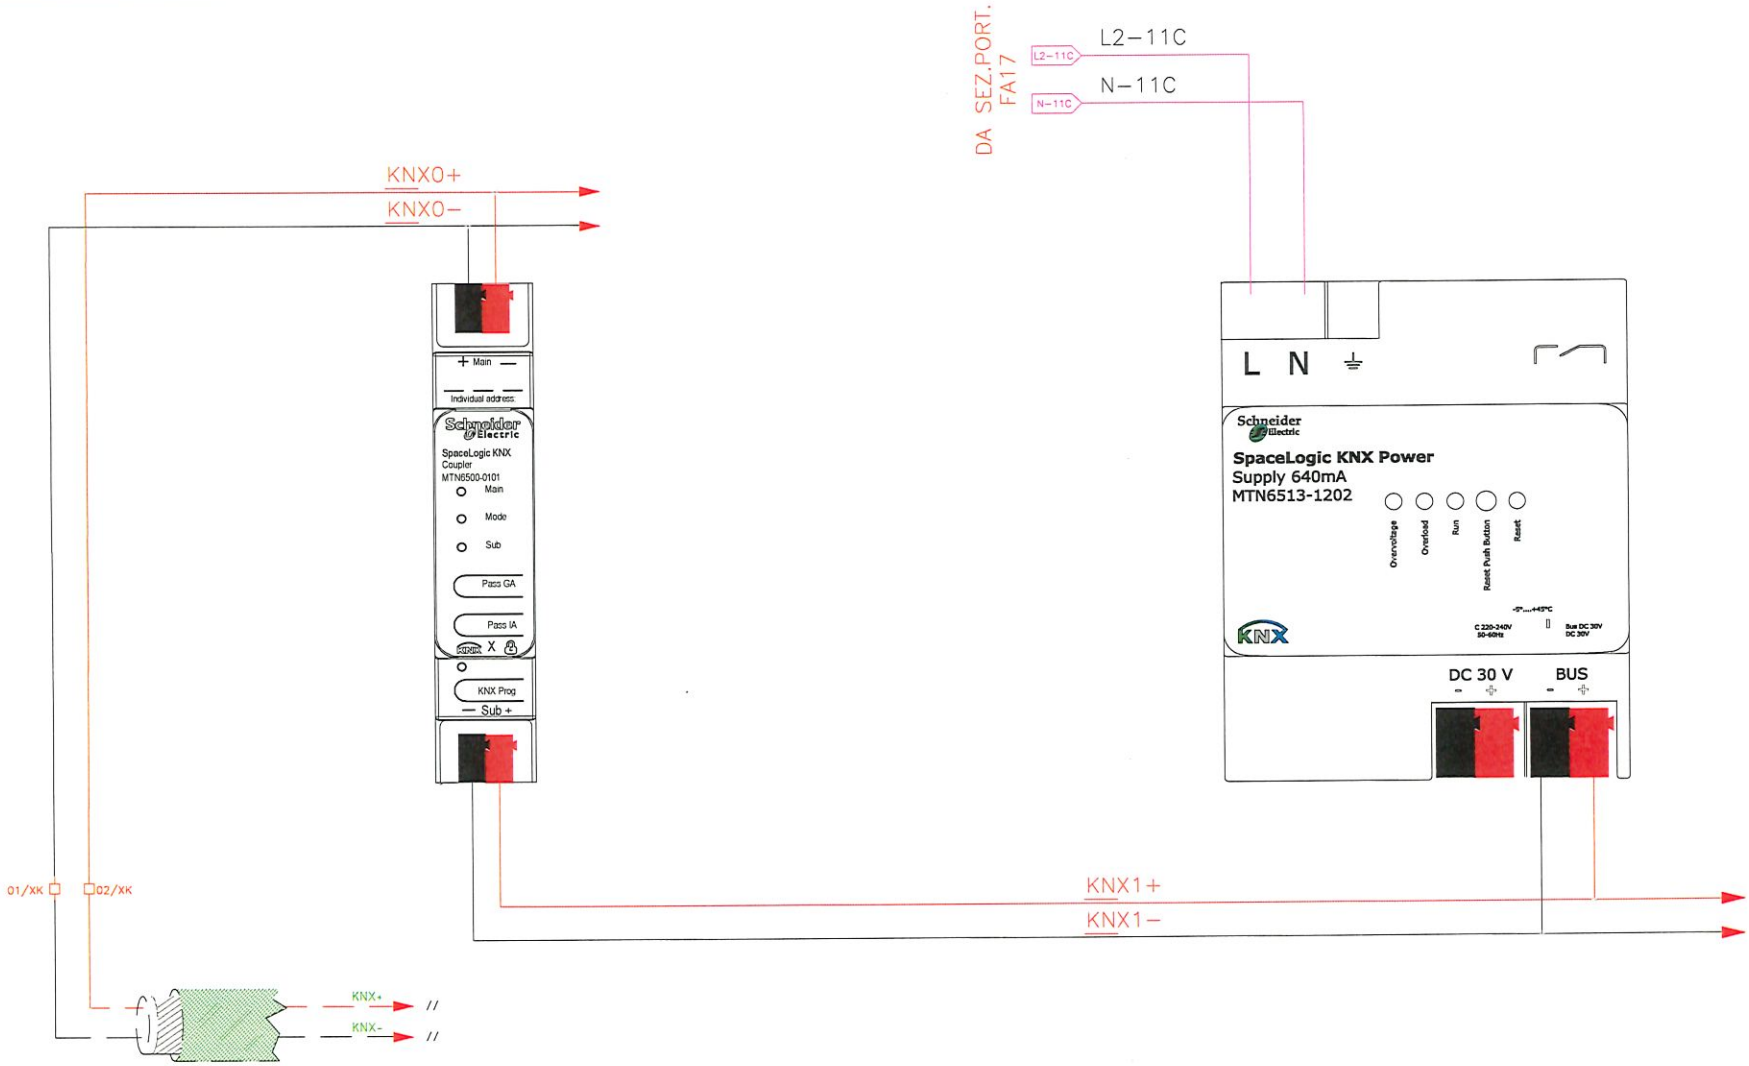


Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC SRL 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 11	Nr. Fogli 16	Rev. 0

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC GATAWAY DALI 1

RPT1

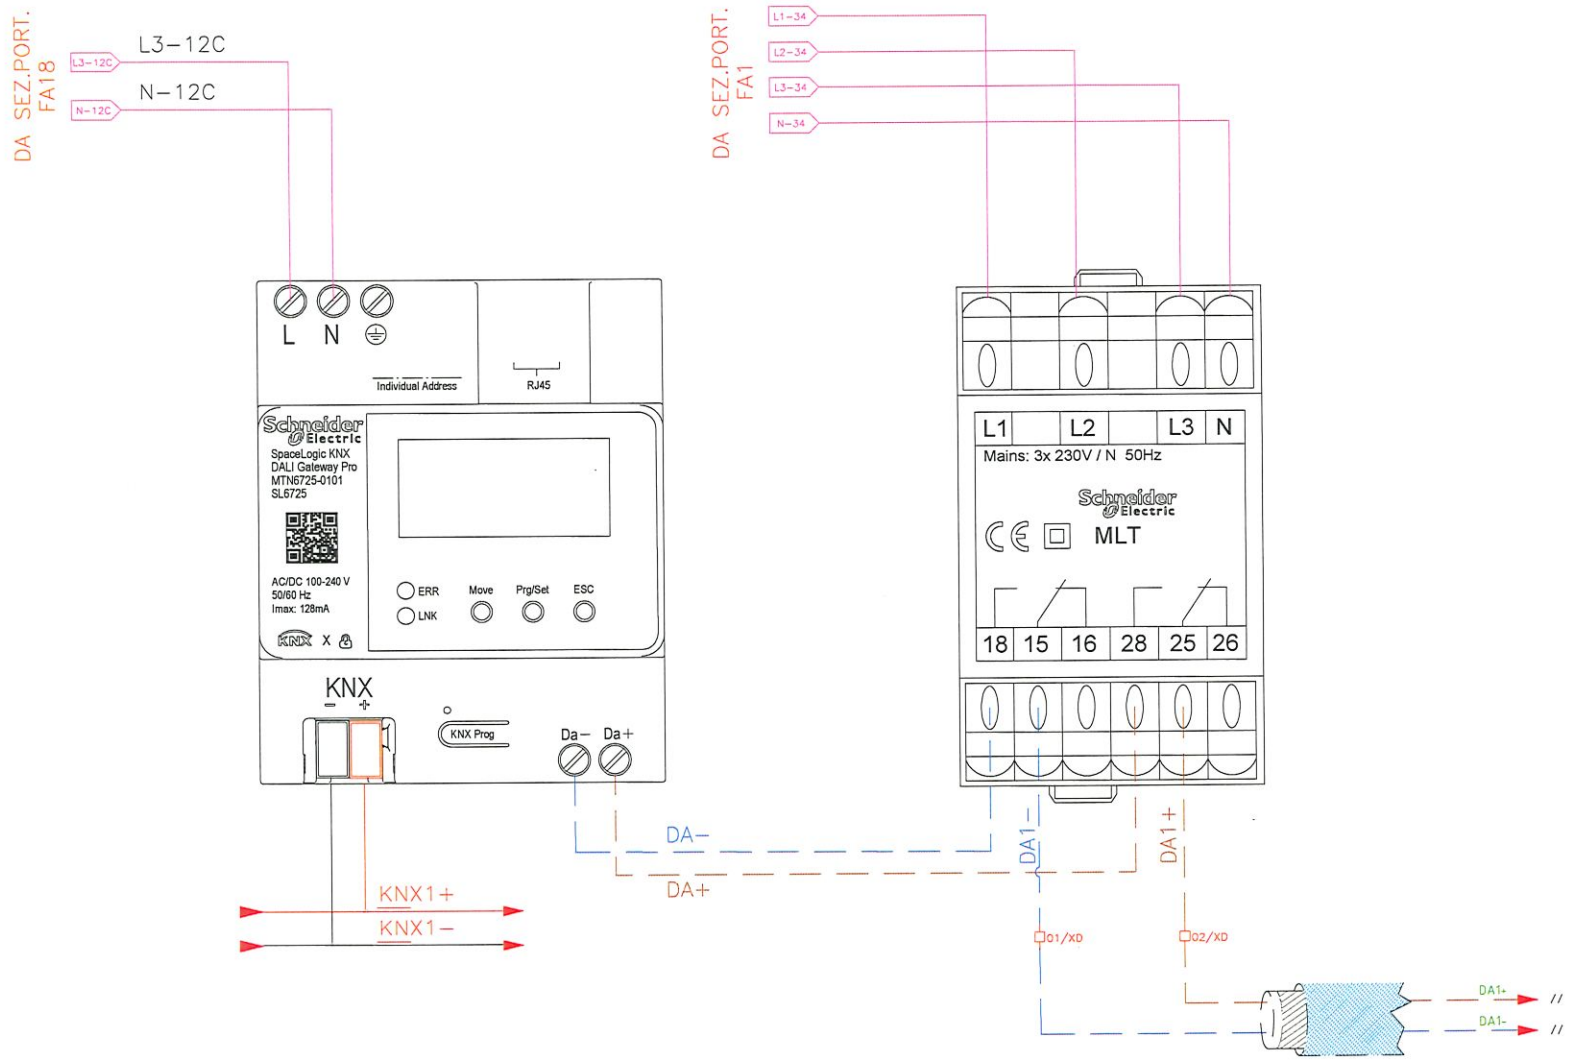


Comunicazione DALI 2x1.5mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 12	Nr. Fogli 16	Rev. 0

AUSILIARI KNX

ATTUATORE USCITE DIGITALI

APPARTAMENTO 1-P2	
CANALE	UTENZA CONTROLLATA
1	LUCI PORTE CAM SX
2	LUCI PORTE CAM DX
3	RISERVA
4	RISERVA

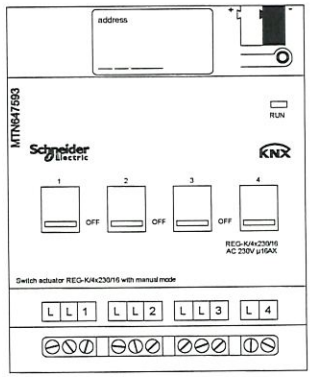


Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26			
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS			
	Proget.	Note :		Nome File : QE–P2.DWG	Percorso File : QE–P2.DWG	Nr. Foglio 13	Nr. Fogli 16	Rev. 0
	visto						

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC 2

ALIMENTATORE KNX 2

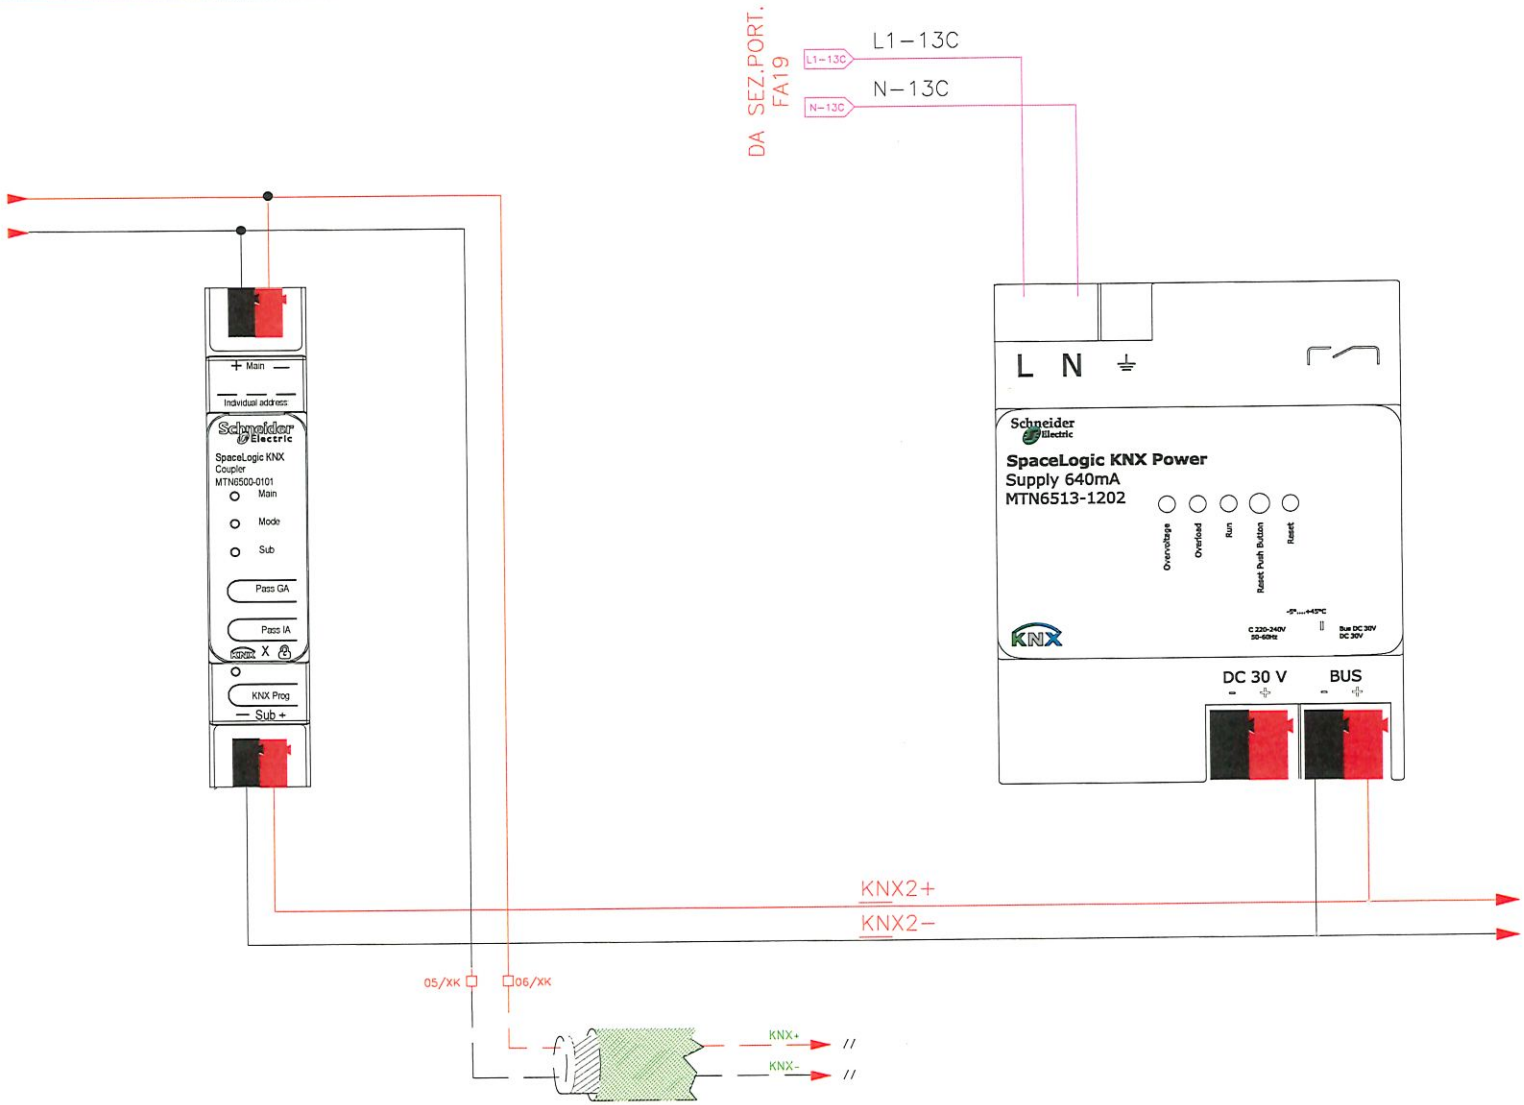


Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 14	Nr. Fogli 16	Rev. 0

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC GATAWAY DALI 2

RPT2

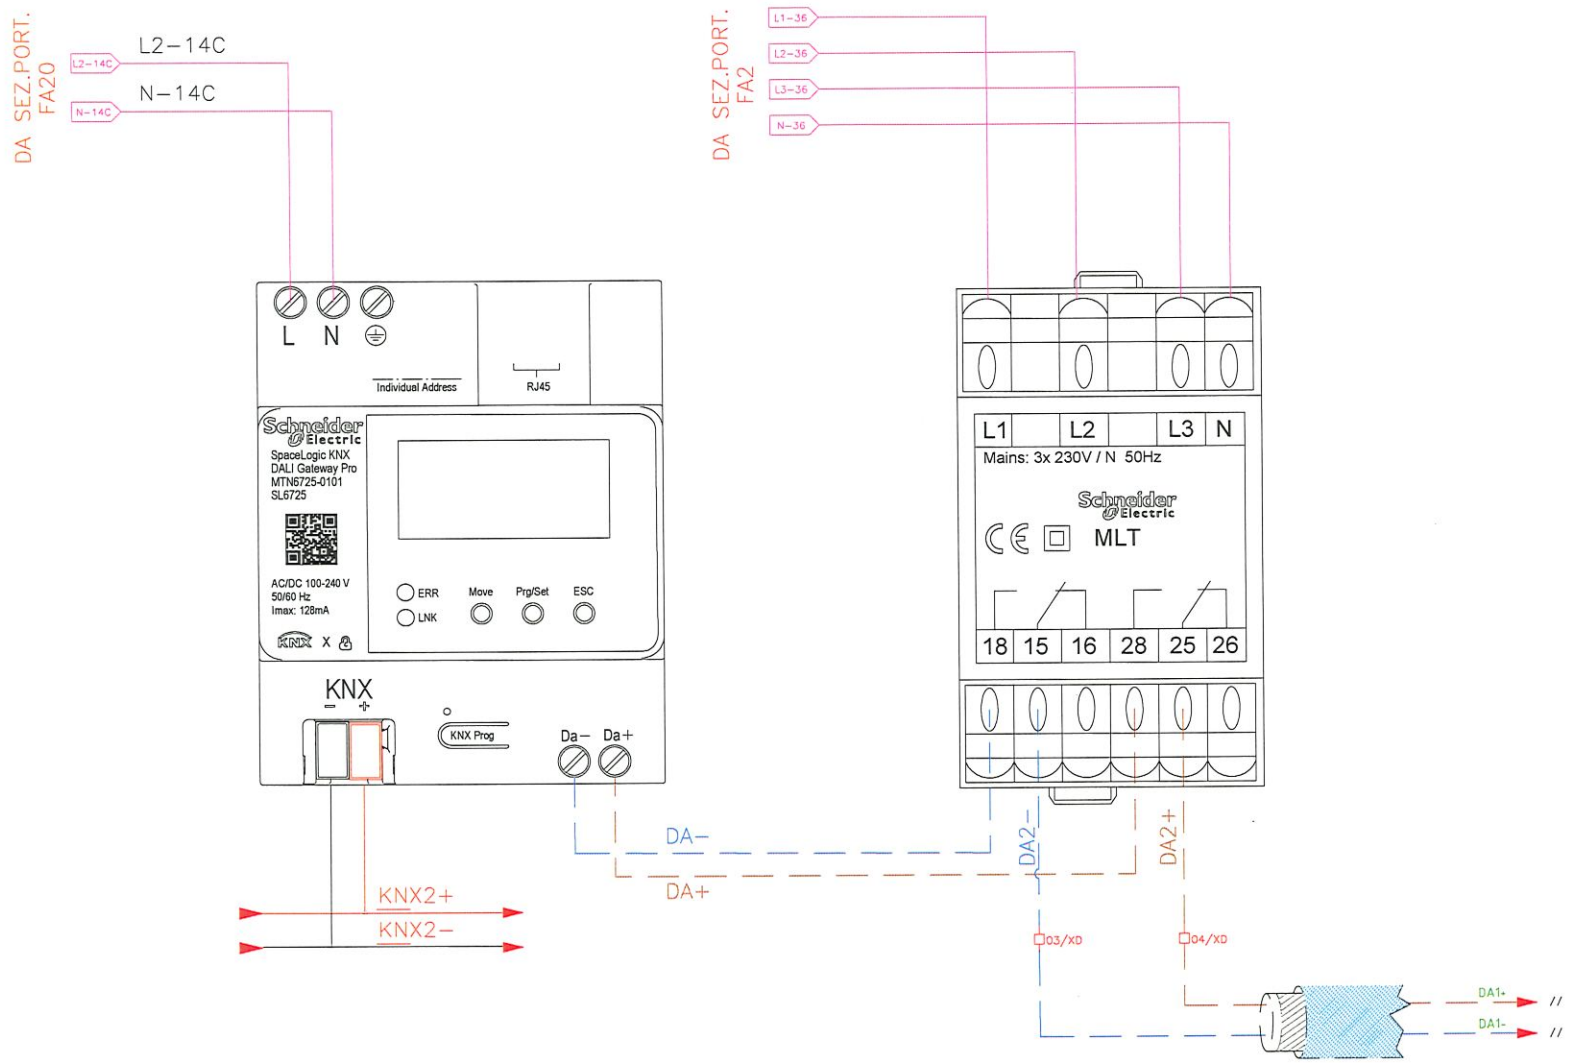


Comunicazione DALI 2x1.5mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26			
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS			
	Proget.	Note :		Nome File : QE-P2.DWG	Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 15	Nr. Fogli 16	Rev. 0
	visto						

AUSILIARI KNX

ATTUATORE USCITE DIGITALI

APPARTAMENTO 1-P2	
CANALE	UTENZA CONTROLLATA
1	LUCI PARETE SX
2	LUCI PARETE DX
3	RISERVA
4	RISERVA

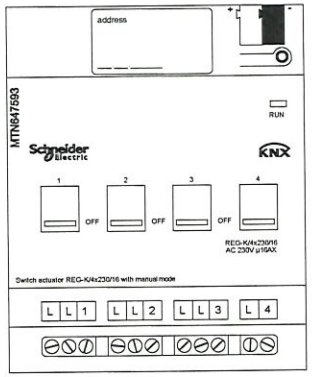

Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 502/26		
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS		
	Proget.	Note :		Nome File : QE-P2.DWG	Percorso File : QE—P2.DWG	Nr. Foglio 16 / Nr. Fogli 16 / Rev. 0
	visto					

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA BUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
X2	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE FM/CONTINUITA'
X3	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE LUCE/CONTINUITA'
XA1	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARI
XK	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARI - KNX
XD	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARI - DALI

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774


Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6
Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 11
Rev. 0

MORSETTIERA X1

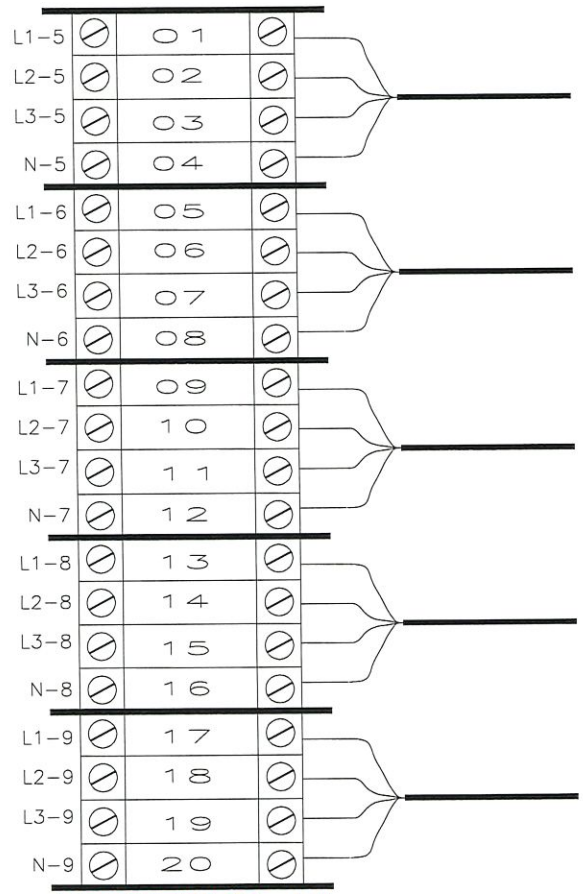

Sigla: C01 QEC.401-403-405 407-409-411

Sigla: C02 QEC.415-419-421 423-425-427

Sigla: C03 QEC.410-412 414-416-418

Sigla: C04 QEC.420-422 424-426-428

Sigla: C05 QEC.430-432 434-436-438

MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 502/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P2.DWG


Percorso File : QE-P2.DWG

Nr. Foglio 2

Nr. Fogli 11

Rev. 0

MORSETTIERA X1

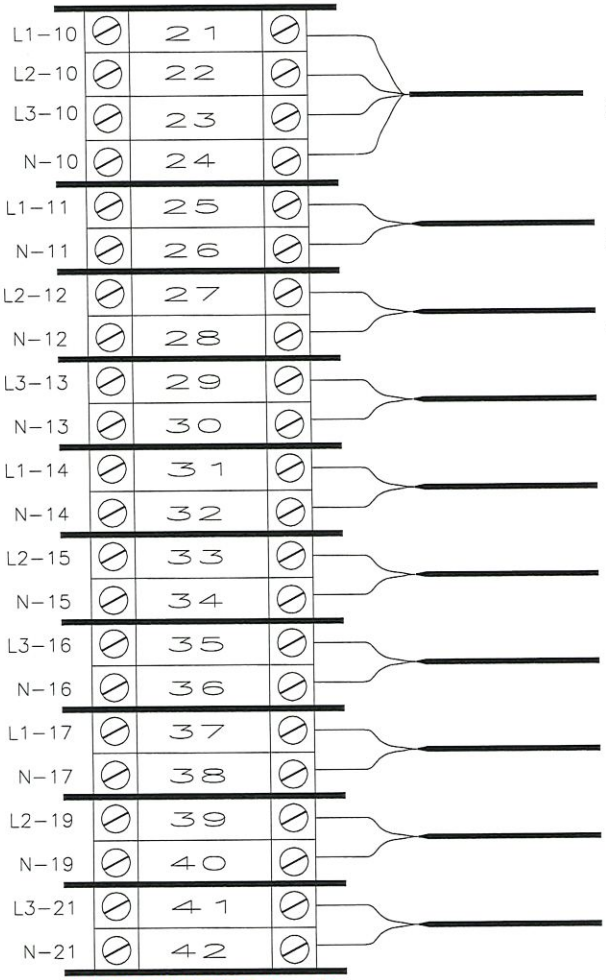

Sigla: C06 QEC.404-406 408-413

Sigla: FM01N PRESE DI SERVIZIO LOCALE QE

Sigla: FM02N PRESE DI SERVIZIO SX CORRIDOIO

Sigla: FM03N PRESE DI SERVIZIO DX CORRIDOIO

Sigla: CDZ01 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 1

Sigla: CDZ02 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 2

Sigla: L01N LUCI LOCALE QE TECNICO QE

Sigla: L02N LUCI OFFICE

Sigla: L03N LUCI PORTE CAMERE SX

Sigla: L04N LUCI PORTE CAMERE DX

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 502/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P2.DWG


Percorso File : QE-P2.DWG

Nr. Foglio 3

Nr. Fogli 11

Rev. 0

MORSETTIERA X1

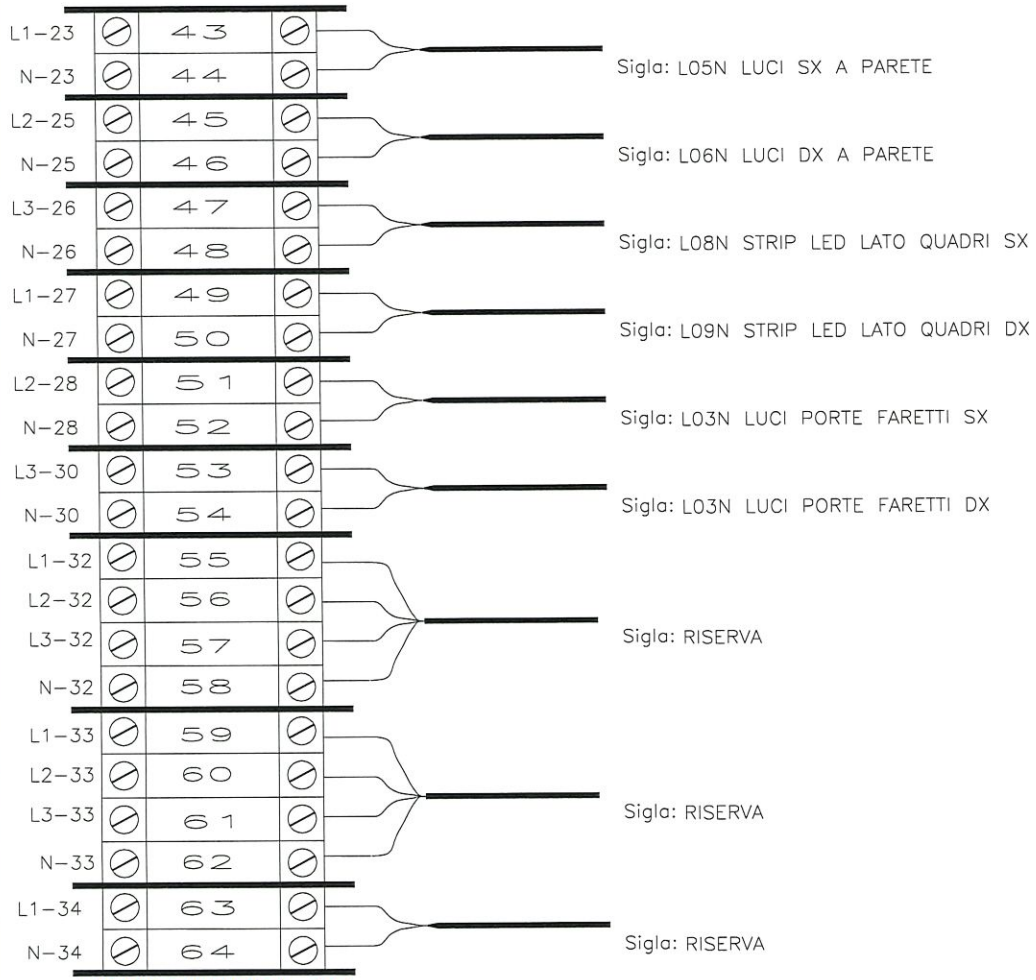

Sigla: L05N LUCI SX A PARETE

Sigla: L06N LUCI DX A PARETE

Sigla: L08N STRIP LED LATO QUADRI SX

Sigla: L09N STRIP LED LATO QUADRI DX

Sigla: L03N LUCI PORTE FARETTI SX

Sigla: L03N LUCI PORTE FARETTI DX

Sigla: RISERVA


Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	502/26	
Disegn. A. Z.	RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA	Cliente	RADISSON HOTELS	
Proget.	Note :		Nome File : QE-P2.DWG	Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 4 / Nr. Fogli 11 / Rev. 0
visto					


MORSETTIERA X1



MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG Nr. Foglio 5 Nr. Fogli 11 Rev. 0	

MORSETTIERA X2

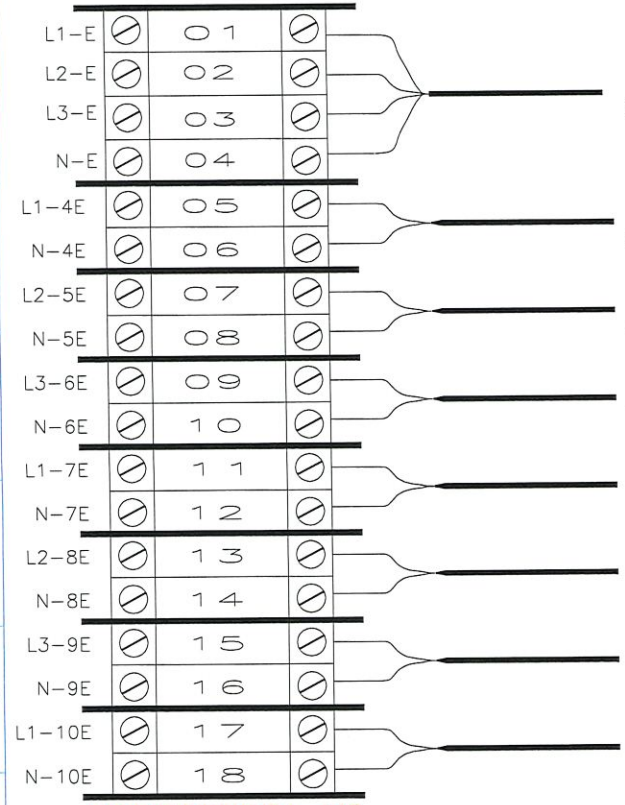

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE FM/CONTINUITA'

Sigla: FM01C RACK DATI SECONDO PIANO

Sigla: FM02C POSTAZIONE DI LAVORO OFFICE

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA


Sigla: AUX RISERVA

MORSETTIERA X2

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	502/26			
Disegn. A. Z.	RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA	Cliente	RADISSON HOTELS			
Proget.	Note :		Nome File : QE-P2.DWG	Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 11	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X3

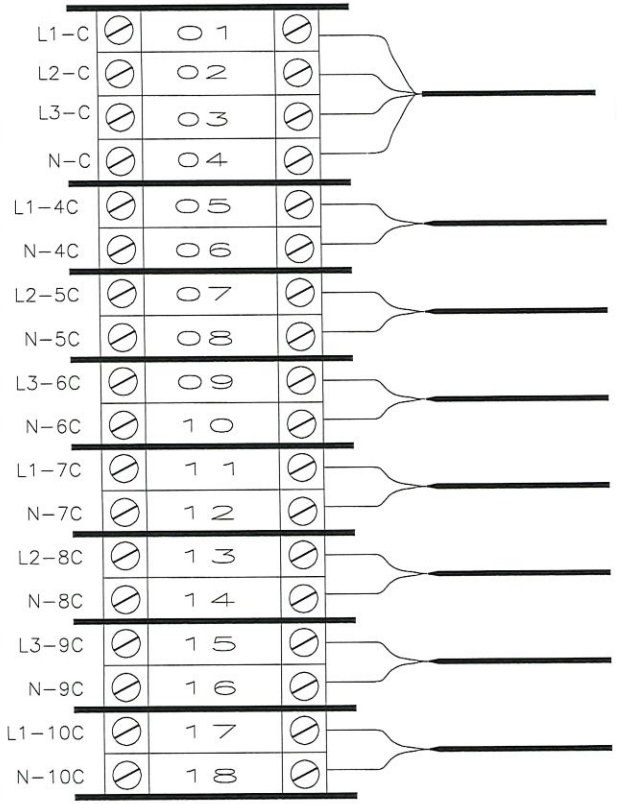

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE LUCE/CONTINUITA'

Sigla: L01C STRIP LED LATO PORTE SX

Sigla: L02C STRIP LED LATO PORTE DX

Sigla: L03C LUCI PITTOGRAMMI

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA


MORSETTIERA X3

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 502/26
Disegn. A. Z.	RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Q. E. PIANO SECONDO	Cliente RADISSON HOTELS
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QE-P2.DWG
visto			Percorso File : QE-P2.DWG

Nr. Foglio 7 | Nr. Fogli 11 | Rev. 0

MORSETTIERA XA1

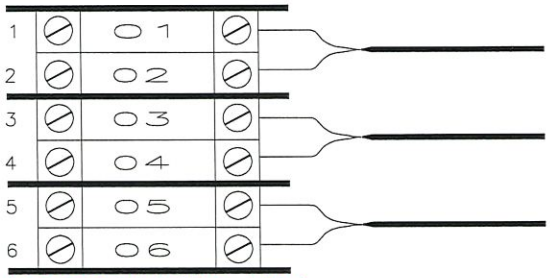

MORSETTIERA XA1

Sigla: CONTATTO SCATTATO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE – FS1

Sigla: CONTATTO SCATTATO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE – FS2

Sigla: CONTATTO SCATTATO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE – FS3

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6
Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 8
Nr. Fogli 11
Rev. 0


MORSETTIERA X0



MORSETTIERA X0

Sigla: BUS SMARTLINK

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 9 Nr. Fogli 11	Rev. 0

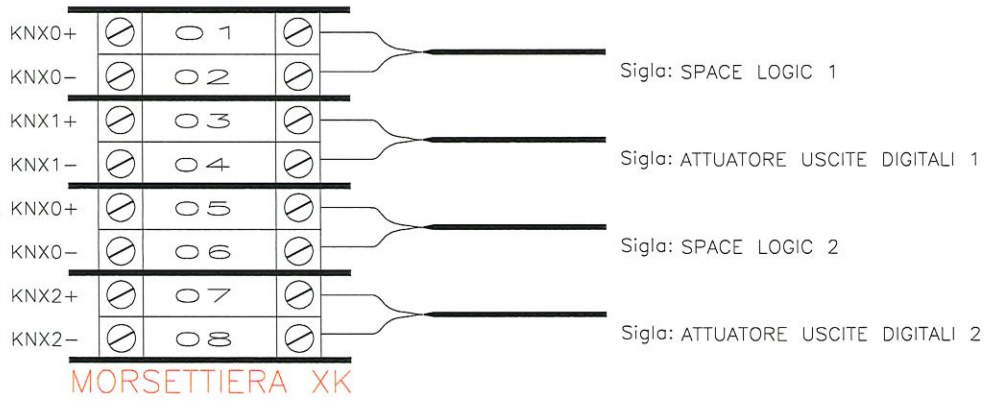

Sigla: SPACE LOGIC 1

Sigla: ATTUATORE USCITE DIGITALI 1

Sigla: SPACE LOGIC 2

Sigla: ATTUATORE USCITE DIGITALI 2

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774


Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO SECONDO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 502/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P2.DWG
Percorso File : QE-P2.DWG
Nr. Foglio 10
Nr. Fogli 11
Rev. 0

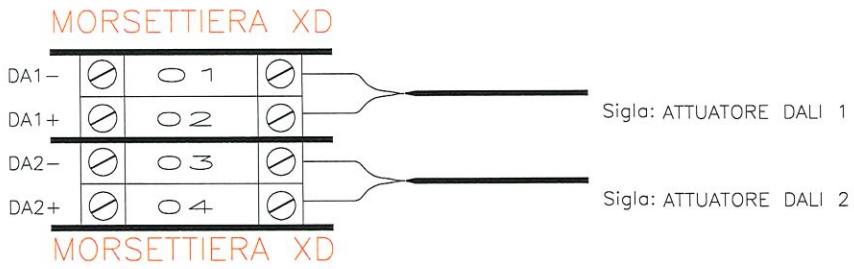

COMEC SRL PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Progel. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO SECONDO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 502/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P2.DWG Percorso File : QE-P2.DWG	Nr. Foglio 11 Nr. Fogli 11 Rev. 0
